

INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2024

Diciembre 2024


Área de Seguimiento y Control

Cuota de Fomento
Hortifrutícola
Su recaudo bien invertido



FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA





SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

El presente informe contextualiza las actividades desarrolladas por el área de Seguimiento y Control (SYC) durante los meses de enero a diciembre del año 2024. El área realizó además del proceso de planeación; un acompañamiento integral a Asohofrucol en la puesta en marcha de propuestas cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) en los componentes técnicos, pre supuestales, financieros y legales que permitió el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la ejecución de los recursos financieros en los tiempos establecidos.

Durante este periodo, se realizó la planificación de las fases a desarrollar y la estructura de desglose de trabajo para el Seguimiento y Control de (20) proyectos en total, de los cuales (5) proyectos se encuentran en ejecución, (15) proyectos terminados y en etapa de cierre. Toda esta información se detalla a continuación.

Con respecto al acompañamiento integral por parte del Área de Seguimiento y Control (SYC) Asohofrucol - FNFH durante los meses de enero a diciembre del año 2024, se tiene la siguiente relación:

- 1. Proyectos de vigencias anteriores:** Con respecto a los siete (7) proyectos de vigencias anteriores, se realizó el seguimiento, control, acompañamiento y cierre: un (1) proyecto en ejecución, y seis (6) proyectos terminados en proceso de cierre en la vigencia 2024, de la siguiente manera:

1.1 Programa de Desarrollo Tecnológico - (6) proyectos.

1.1.1 Proyectos de Investigación - Uno (1):


- DT-IV-0003, “Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá” que se encuentra en ejecución.

1.1.2 Transferencia de tecnología - Uno (1):

- DT-TR-0003, “Establecimiento de nuevas áreas de granadilla y mejoramiento de capacidades de productores hortifrutícolas a través del modelo Agroecológico de Agricultura Tropical en el municipio de Labateca, Norte de Santander”, proyecto terminado en el mes de mayo 2024.

1.1.3 Asistencia técnica - Cuatro (4): Son los siguientes proyectos ejecutados por Asohofrucol:

- DT-AT-0009, Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de (Jardín, Jericó, Andes, Támesis, Pueblo rico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos, proyecto terminado en el mes de enero 2024.
- DT-AT-0011, denominado “Fortalecimiento de los procesos técnico- productivos de productores priorizados de aguacate Hass y lima ácida Tahití a través de la sensibilización, transferencia de tecnología y asistencia técnica bajo lineamientos de buenas prácticas agrícolas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca”, proyecto terminado en el mes de agosto 2024.



- DT-AT-0013: Aporte al mejoramiento del estatus fitosanitario en departamentos y frutas priorizadas mediante estrategias de monitoreo, control, mitigación y comunicación de moscas de la fruta, HLB y su vector, *Fusarium oxysporum* f.sp. cubense R4T y Moko, proyecto terminado en el mes de marzo 2024.
- DT-AT-0014 denominado “Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de Urrao, Betulia, Montebello, Betania y Salgar en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos”, proyecto terminado en el mes de noviembre 2024.

1.2 Programa de Mercadeo y Comercialización - (1) proyecto:

1.2.1 Proyecto Mercadeo (1)

- MC-CAD-0001, denominado “Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Fase 3 - 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)”, proyecto terminado en el mes de diciembre.

2. Proyectos vigencia 2024: para esta vigencia, se está llevando a cabo la planificación, seguimiento, control y acompañamiento a cuatro (4) proyectos aprobados en ejecución y nueve (9) proyectos terminados:

2.1 Programa de Desarrollo Tecnológico - (8) proyectos.

2.1.2 Transferencia de tecnología - seis (6): proyectos ejecutados por Asohofrucol con código interno:


- DT-TR-0010 denominado “Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, año 2024 – PNFH”, proyecto terminado.
- DT-TR-0009, denominado “Fortalecimiento de capacidades productivas y organizacionales de productores hortofrutícolas en el Valle del Cauca”, proyecto terminado.
- DT-TR-0011, Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y Totoró- Cauca, proyecto en ejecución.
- DT-TR-0012, denominado “Misión internacional para el intercambio de experiencias de productores de cítricos en Brasil”, proyecto en terminado.
- DT-TR-0013, denominado “Gira para el fortalecimiento de las capacidades en el manejo técnico del cultivo de Limón Tahití de productores priorizados de Caquetá”, proyecto terminado.
- DT-TR-0016 Fortalecimiento productivo y comercial de sistemas hortofrutícolas localizados en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Norte de Santander, proyecto en ejecución.

2.1.3 Asistencia Técnica - dos (2): proyectos ejecutados por Asohofrucol con código interno:

- DT-AT-0015, denominado “Implementación de acciones para el mejoramiento fitosanitario en plagas, líneas productivas y departamentos priorizados”, proyecto terminado.
- DT-AT-0016 Fortalecimiento fitosanitario y productivo de los cultivos de mango y cítricos en municipios priorizados del departamento de Cundinamarca, proyecto en ejecución.

2.2 Programa de Área Económica y Difusión – cuatro (4) proyectos. Proyectos en ejecución ejecutados por Asohofrucol.

- AE-ADI-0009, denominado “Área de Seguimiento, Control y evaluación de proyectos de inversión del fondo nacional de fomento Hortifrutícola año 2024”, proyecto terminado.



- AE-ADI-0010, denominado "Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de los programas y proyectos del FNFH", proyecto en ejecución.
- AE-ADI-0011, denominado "Unidad Técnica de planes programas y proyectos - año 2024", proyecto terminado.
- AE-ADI-0012, denominado: Seminario: La agroecología y su impacto en la producción de frutas y hortalizas, proyecto terminado.

2.3 Programa de Mercadeo y Comercialización – un (1) proyecto. Proyectos en ejecución ejecutados por Asohfrucol.

- MC-AE-0003: Apoyo para realizar la visita técnica in situ de la General Administration of Customs China (GACC), dentro del proceso de admisibilidad fitosanitaria de frutos frescos de lima ácida Tahití colombiana con destino a la República Popular de China, proyecto terminado.

3. Proyectos sin iniciar: (2) proyectos: se cuenta con **dos (2)** proyectos aprobados que no han iniciado su ejecución:

3.1 Programa Mercadeo y Comercialización – un (1) proyecto, que pertenece a Apoyo a Exportaciones y se relaciona a continuación:


- MC-AE-0002, Promoción de la uchuva y la gulupa colombiana en el mercado alemán. Proyecto aprobado en la Junta del 13/12/2023 Acta N°173. Se ha llevado un proceso de múltiples reuniones con Procolombia para el ajuste de la minuta del convenio. Procolombia no ha cumplido con los tiempos establecidos para revisión y firma de la minuta y envío de los documentos legales lo cual hace que el proceso se retrase. Se estima o pretende iniciar la ejecución del proyecto en el mes de octubre de 2024.

3.2 Programa Área Económica – un (1) proyecto, que pertenece a Acopio y Difusión de Información que se relaciona a continuación:

- AE-ADI-0008, Contribución a la implementación del plan de fortalecimiento del registro administrativo" diagnóstico de productores atendidos en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola - PNFH. Proyecto aprobado por Junta celebrada el 13/12/2023 acta N°173. Se está a la espera de la respuesta para la firma del convenio con el DANE, ya que la entidad ha tenido cambios de personal lo cual ha retrasado el proceso de inicio.


La descripción y justificación de cada uno de los proyectos que a la fecha no han iniciado se encuentran en el punto 1.7 descripción de los avances evidenciados de los proyectos en ejecución financiados con recursos del FNFH año 2024 por el área de seguimiento y control.

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto DT-TR0010 – Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase 2024, al tener un cubrimiento en 22 departamentos del país, cuenta con (23) oficinas regionales (Antioquia 2 oficinas) y personal por cada zona y metas específicas de cumplimiento; el área de SyC realizó los planes de seguimiento, las matrices de verificación por cada departamento. Con relación al proyecto MC-CAD0001 - Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas fase 3 - 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, se planteó ejecutar un total de 36 alianzas, de las cuales a la fecha se ejecutaron 35 alianzas con sus respectivas actas de inicio y metodologías de seguimiento y control.



Gráfica 1- Avance técnico de proyectos con las verificaciones del Área de Seguimiento y Control corte a diciembre 2024

Estado del avance técnico de proyectos financiados con recursos del FNFH corte a 31 de diciembre de 2024

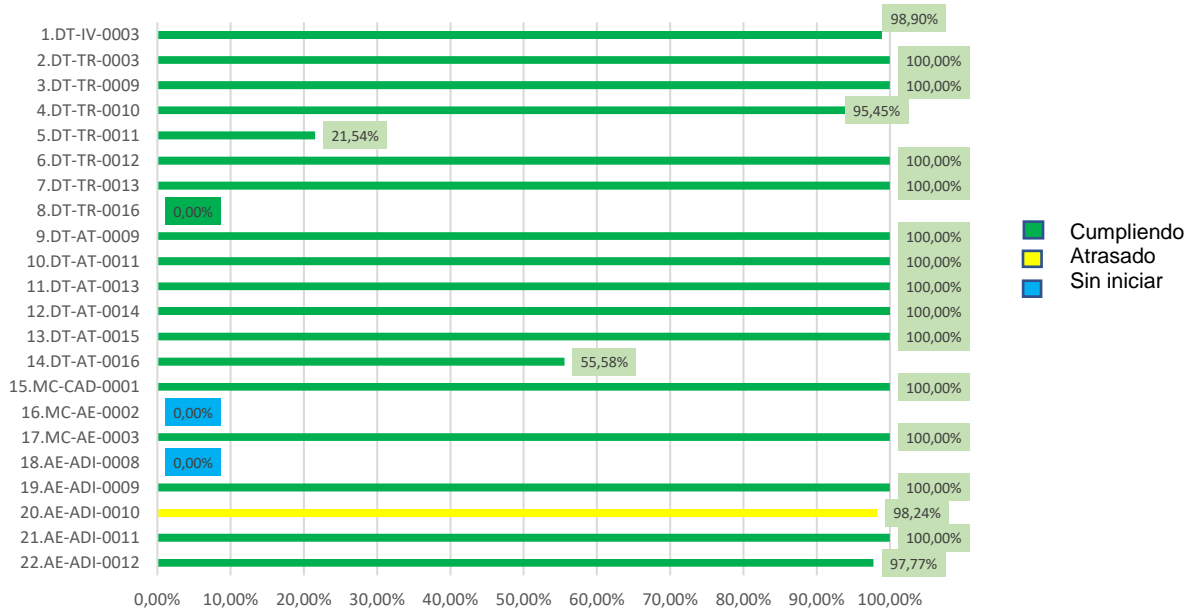


Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

ESTRUCTURA OPERATIVA

El Área de Seguimiento y Control para el año de 2024, presenta el siguiente esquema operativo, que permite dar cubrimiento a los requerimientos de los proyectos cofinanciados con recursos del FNFH en los componentes técnicos, financieros y legales.



Gráfica 2- Estructura operativa área de seguimiento y control

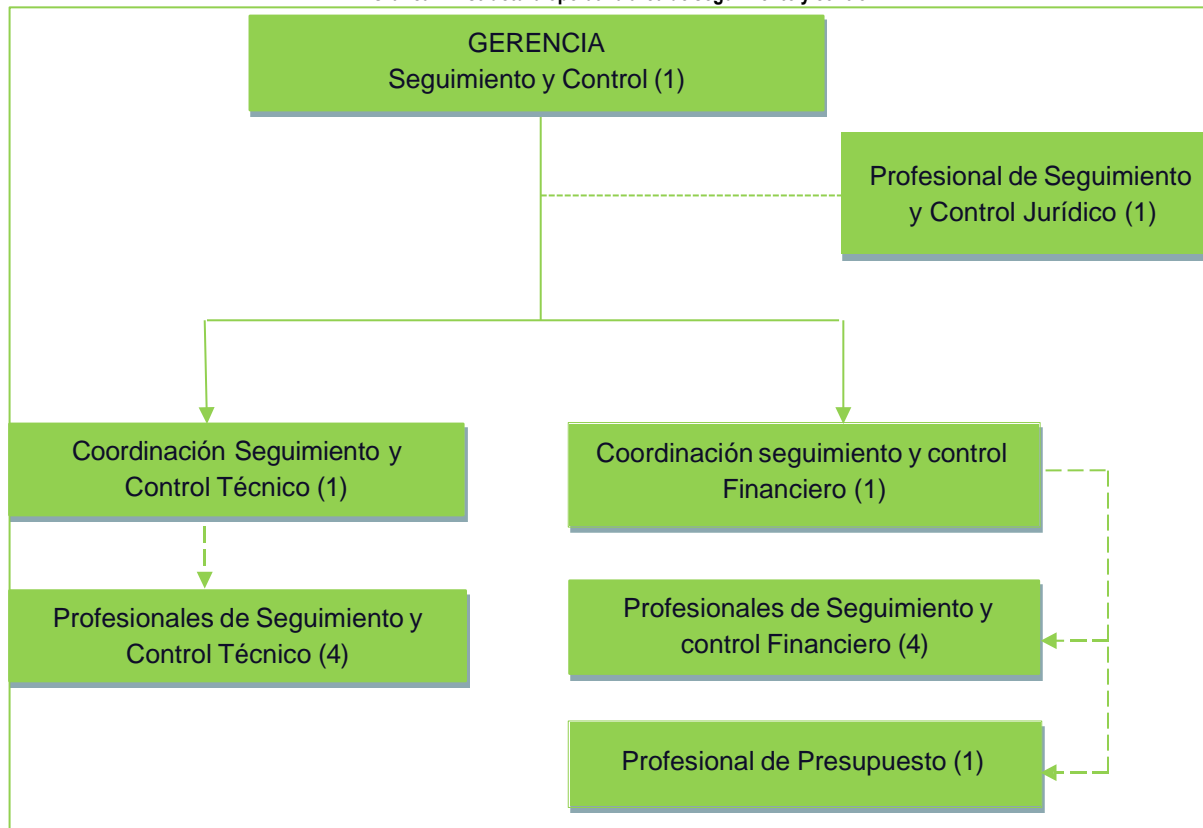

Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

Por otra parte, el equipo del área de S&C está integrado por una (1) Gerencia, un (1) Profesional de Seguimiento y Control Jurídico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Técnico, cuatro (4) profesionales de Seguimiento y Control Técnico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero, cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control financiero y un (1) Profesional de Presupuesto.

Cabe mencionar que el personal asignado realizó las verificaciones técnicas y financieras respectivas de acuerdo con los planes de seguimiento estructurados por el área de seguimiento y control, la programación de visitas documentales y de campo que contribuyeron a la ejecución de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el horizonte de tiempo establecido y con los recursos económicos asignados.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS AÑO 2024

Del periodo enero - diciembre del año 2024, se planificó y ejecutó el plan de seguimiento y control establecido para cada uno de los proyectos en ejecución para la vigencia; el cual se determinó como meta de gestión, realizar reuniones iniciales a los proyectos aprobados y en fase de inicio, verificaciones documentales mensuales, verificaciones de cierre de proyectos de vigencias anteriores y visitas de campo, según el ejecutor del proyecto. En este periodo se programaron 143 visitas y 188 verificaciones de campo de Seguimiento y Control técnico a los proyectos, considerando 4 Profesionales de Seguimiento y Control técnico, y el Coordinador de SyC Técnico del



Área de SyC, ejecutándose 143 visitas de campo a 1191 productores y generándose un porcentaje de cumplimiento del 100%. La programación de las visitas de campo se realizó de manera mensual en coordinación con el ejecutor y la programación establecida por el proyecto en los meses de enero a diciembre de 2024.

Las visitas de campo realizadas para validación de actividades de los proyectos en el año 2024 fueron las siguientes:

Tabla No 1. Visitas de campo componente técnico año 2024

PROYECTO	MES	FECHAS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	# DE VISITAS	# DE VERIFICACIONES	ALCANCE DE LA VERIFICACION	# DE PRODUCTORES	LÍNEAS PRODUCTIVAS
DT-AT-0011	Febrero	26/02/2024	Caldas	Anserma	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-AT-0011	Febrero	26/02/2024	Caldas	Risaralda	1	1	Implementación BPA	1	Lima ácida tahití
DT-AT-0011	Febrero	27/02/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Capacitación Primeros Auxilios, manejo de extintores y BPA	31	Aguacate hass y Lima ácida tahití
DT-IV-0003	Febrero	23/02/2024	Meta	Granada	1	1	Gira técnica	22	Maracuyá
DT-IV-0003	Febrero	24/02/2024	Meta	Lejanías y Fuente de oro	1	1	Gira técnica	17	Maracuyá
DT-AT-0009	Febrero	22 Y 23-02-2024	Antioquia	Urrao	1	1	Visitas de socialización, monitoreo y asistencia técnica	3	Aguacate
DT-AT-0013	Febrero	21 al 24-02-2024	Santander	Guadalupe, Suaíta	1	5	Visitas de monitoreo HLB	5	Cítricos
DT-TR-0003	Marzo	18 al 19-03-2024	Norte de Santander	Labateca	1	3	Establecimiento de Parcela, biofábrica y AT. Visita documental	5	Granadilla
DT-TR-0010	Abril	2/01/2024	Boyacá	Tibasosa	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	2/02/2024	Boyacá	Zetaquirá	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	23	Línea Aguacate hass
DT-TR-0010	Abril	4/02/2024	Risaralda	Apia	1	1	Asistencia técnica	2	Aguacate, plátano
DT-TR-0010	Abril	4/02/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/04/2024	Casanare	Yopal	1	1	Monitoreo en parcela	1	Piña
DT-TR-0010	Abril	4/04/2024	Casanare	Yopal	1	1	Asistencia técnica	1	patilla
DT-TR-0010	Abril	5/04/2024	Casanare	Yopal	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/08/2024	Nariño	Pasto	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/09/2024	Nariño	Leiva	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	24	Cítricos
DT-TR-0010	Abril	4/09/2024	Quindío	Armenia	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/10/2024	Quindío	Génova	1	1	Asistencia técnica	6	Cítricos
DT-TR-0010	Abril	4/10/2024	Putumayo	Simundoy	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/11/2024	Putumayo	Simundoy	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	22	Lulo
DT-TR-0010	Abril	4/11/2024	Valle del cauca	Cartago	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/12/2024	Valle del cauca	Cartago	1	1	Congreso de fruticultura	262	Cítricos, mora, aguacate, melón
DT-TR-0010	Abril	4/01/2024	Tolima	Ibagué	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/02/2024	Tolima	Espinal y Guamo	1	3	Asistencia técnica	3	Mango y cítricos
DT-TR-0010	Abril	4/08/2024	Meta	granada	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/09/2024	Meta	guamo	1	1	Asistencia técnica y visita de implementación	3	Mangostino
DT-TR-0010	Abril	11/04/2024	Norte de Santander	Silos	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	22	cebolla Junca
DT-TR-0010	Abril	4/12/2024	Norte de Santander	Cúcuta	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	15/04/2024	La Guajira	Riohacha	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	16/04/2024	La Guajira	Riohacha	1	3	Asistencia técnica	3	mango
DT-TR-0010	Abril	15-04-2024	Córdoba	Montería	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	16-04-2024	Córdoba	Moñitos	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	19	Plátano
DT-TR-0010	Abril	17/04/2024	Santander	Girón	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	18/04/2024	Santander	Girón	1	1	Evento CENFER		N/A



DT-TR-0010	Abril	17-04-2024	Sucre	Tolú viejo	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	18-04-2024	Sucre	Corozal	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	19	Plátano
DT-TR-0010	Abril	15/04/2024	Antioquia	Envigado	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	16/04/2024	Antioquia	Granada	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	24	Mora
DT-TR-0010	Abril	18/04/2024	Urabá	Apartado	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	19/04/2024	Urabá	Necocli	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	18	Maracuyá
DT-TR-0010	Abril	24-04-2024	Cundinamarca	Silvania-Fusagasuga	1	2	Asistencia técnica	2	Aguacate-cítricos
DT-TR-0010	Abril	26-04-2024	Cundinamarca	Oficina central	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Marzo	20-21/03/2024	Quindío	Armenia	1	1	Seminario Internacional de Aguacate	N/A	N/A
DT-AT-0011	Abril	4/01/2024	Antioquia	El Retiro	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-AT-0011	Abril	4/01/2024	Antioquia	El Peñol	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-AT-0011	Abril	4/02/2024	Antioquia	Sonsón	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-TR-0010	Abril	4/04/2024	Bolívar	Cartagena	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/05/2024	Bolívar	Carmen de Bolívar	1	2	Asistencia técnica	2	Aguacate
DT-TR-0010	Abril	4/06/2024	Bolívar	Clemenacia	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	25	Mango
DT-TR-0010	Abril	4/08/2024	Magdalena	Santa Marta	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	4/09/2024	Magdalena	Ciénaga	1	1	Asistencia técnica	1	Mango
DT-TR-0010	Abril	4/09/2024	Magdalena	Ciénaga	1	1	Asistencia técnica	1	Mango
DT-TR-0010	Abril	18/04/2024	Caldas	Supía	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	32	Plátano
DT-TR-0010	Abril	19/04/2024	Caldas	Manizales	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0004	Abril	22/04/2024	Huila	El Agrado	1	1	Construcción Biofábrica	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	22/04/2024	Huila	El Pital	1	2	Asistencia técnica	2	Lima ácida tahití
DT-TR-0010	Abril	23/04/2024	Huila	Pitalito	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	25/04/2024	Cauca	Popayán	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Abril	26/04/2024	Cauca	Morales	1	1	Asistencia técnica	1	Aguacate hass
DT-TR-0010	Abril	26/04/2024	Cauca	Totoró	1	1	Asistencia técnica	1	Aguacate hass
DT-TR-0010	Abril	29/04/2024	Cesar	Patillal -Valledupar	1	1	Asistencia técnica, visita Biofábrica y Planta	1	Mango
DT-TR-0010	Abril	30/04/2024	Cesar	Valledupar	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0013	Mayo	15-16/05/2024	Quindío	Calarcá	1	2	Taller teórico-practico Agricultura tropical	40	Lima Acida Tahití
DT-AT-0011	Mayo	21/05/2024	Cundinamarca	Silvania-Fusagasuga	1	1	Implementación BPA	1	Aguacate hass
MC-CAD-0001	Mayo	5/11/2024	Boyacá	Combita	1	1	Entrega de insumos AL158	24	Mora
DT-IV-0003	Mayo	29/05/2024	Boyacá	Tinjacá	1	1	Verificación de Biofábrica y parcela AT	1	Tomate
DT-AT-0014	Mayo	18-05-2024	Antioquia	Betulia	1	1	Capacitación Agrobiológicos	54	aguacate
DT-TR-0009	Junio	17-06-2024	Valle del Cauca	Versalles	1	1	Socialización de productores	56	Mora
DT-AT-0015	Junio	20/06/2024	Cundinamarca	La Mesa	1	3	Vistas monitoreo Mosca	3	Mango
DT-IV-0003	Junio	25/06/2024	Tolima	Fresno	1	1	Verificación de Biofábrica y parcela AT	1	Aguacate
DT-AT-0011	Junio	18/06/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Capacitación Socioempresarial	20	Aguacate hass y Lima ácida tahití
DT-AT-0011	Junio	19/06/2024	Caldas	Villa María	1	1	Implementación BPA	1	Aguacate Hass
DT-TR-0010	Julio	7/08/2024	Antioquia	Envigado	1	2	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	7/09/2024	Antioquia	Barbosa	1	3	Asistencia técnica	3	Cítricos
DT-TR-0010	Julio	17/07/2024	Cesar	Curumani	1	2	Asistencia técnica	2	mango
DT-TR-0010	Julio	18/07/2024	Cesar	Valledupar	1	2	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	julio	7/08/2024	Tolima	Ibagué	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A



DT-TR-0010	julio	7/09/2024	Tolima	Fresno	1	1	Taller, ECO y socioempresarial	23	Guanábana
DT-TR-0010	julio	15-07-2024	Sucre	San Juan de Since	1	3	AT Y Fortalecimiento socioempresarial	12	ahuyama pastelito
DT-TR-0010	julio	16-07-2024	Sucre	Corozal	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	julio	17-07-2024	Córdoba	Montería	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	julio	18-04-2024	Córdoba	Chinú	1	1	AT y visitas de implementación	3	Marañón
DT-TR-0010	julio	19-07-2024	Cundinamarca	Chocontá	1	1	ECO	15	Hortalizas
DT-TR-0010	julio	26-04-2024	Cundinamarca	Oficina central	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	julio	4/08/2024	Meta	Granada	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	agosto	4/09/2024	Meta	Guamo	1	1	ECO	32	Mangostino
DT-TR-0010	Julio	15/07/2024	Huila	Pitalito	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	16/07/2024	Huila	San Agustín	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	2	Aguacate Hass
DT-TR-0010	Julio	18/07/2024	Cauca	Popayán	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	19/07/2024	Cauca	Timbio	1	1	AT y Fortalecimiento Socioempresarial	8	Aguacate Hass
DT-TR-0010	Julio	22/07/2024	Bolívar	Carmen de Bolívar	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	7	Aguacate criollo
DT-TR-0010	Julio	22/07/2024	Bolívar	Carmen de Bolívar	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	4	Ahuyama
DT-TR-0010	Julio	23/07/2024	Bolívar	Cartagena	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	25/07/2024	Magdalena	Santa Marta	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	4	Mango de azúcar
DT-TR-0010	Julio	26/07/2024	Magdalena	Santa Marta	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	29/07/2024	Caldas	Palestina	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	7	Plátano
DT-TR-0010	Julio	30/07/2024	Caldas	Manizales	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	7/08/2024	Boyacá	Tibasosa	1	1	Verificación documental	n/a	n/a
DT-TR-0010	Julio	7/09/2024	Boyacá	Ventaquemada	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	1	Zanahoria
DT-TR-0010	Julio	7/09/2024	Boyacá	Ventaquemada	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	1	Uchuva
DT-TR-0010	Julio	7/10/2024	Casanare	Yopal	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	7/11/2024	Casanare	Nunchía	1	1	Fortalecimiento Socioempresarial	3	Piña
DT-TR-0010	Julio	7/11/2024	Casanare	Aguazul	1	2	Instalación Biofábrica	3	Piña
DT-TR-0010	Julio	16/07/2024	Santander	Sabana de Torres	1	2	Asistencia técnica - Asistencia Socioempresarial	5	Limón Común
DT-TR-0010	Julio	16/07/2024	Santander	Barrancabermeja	1	1	Asistencia técnica	1	Limón Común
DT-TR-0010	Julio	17/07/2024	Santander	Lebrija	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	18/07/2024	Guajira	Riohacha	1	1	Tallere ECO técnico y Socioempresarial - Instalación de biofábrica	17	Plátano
DT-TR-0010	Julio	19/07/2024	Guajira	Riohacha	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	23/07/2024	Quindío	Armenia	1	1	Monitoreo de plagas	1	Lima Ácida tahití
DT-TR-0010	Julio	23/07/2024	Quindío	Quimbaya	1	1	Monitoreo de plagas	1	lima ácida Tahiti
DT-TR-0011	Julio	24/07/2024	Quindío	Armenia	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	25/07/2024	Valle del Cauca	Cartago	1	1	Verificación documental	N/A	N/A
DT-TR-0010	Julio	26/07/2024	Valle del Cauca	El Águila	1	1	Asistencia técnica	2	Aguacate
DT-TR-0011	Julio	26/07/2025	Valle del Cauca	El Águila	1	1	Taller socioempresarial	6	Aguacate - Mora
DT TR 0009	Agosto	25/08/2024	Valle del Cauca	Roldanillo	1	2	Biofabrica-taller	15	Guayaba-limón Tahití
DT-AT-0010	Septiembre	13/09/2024	Antioquia	Fredonia	1	3	Visita Monitoreo HLB	3	Cítricos
DT IV 0003	Septiembre	26/09/2024	Meta	Fuente de Oro	1	1	Taller Socialización de resultados con productores de Maracuyá	18	Maracuyá
DT-TR-0010	Octubre	21/10/2024	Bolívar	María La Baja	1	2	Reunión Junta Directiva y Asistencia Técnica	9	Plátano
DT-TR-0010	Octubre	21/10/2024	Bolívar	María La Baja	1	2	Reunión Junta Directiva y Asistencia Técnica	7	Pomelo
DT-TR-0010	Octubre	22/10/2024	Bolívar	Mompox	1	3	Reunión Junta Directiva y Asistencia Técnica	8	Naranja Valencia



DT-TR-0010	Octubre	23/10/2024	Magdalena	Guamal	1	2	Reunión Junta Directiva y Asistencia Técnica	6	Naranja Valencia
DT-TR-0010	Octubre	25/10/2024	Magdalena	Ciénaga	1	2	Reunión Junta Directiva y Asistencia Técnica	4	Plátano
DT-TR-0010	Octubre	16-10-2024	Cundinamarca	Subachoque	1	3	Reunión Junta Directiva, Asistencia Técnica Y visita de implementación	6	Hortalizas
DT-TR-0010	Octubre	18-10-2024	Cundinamarca	Viotá	1	1	Reunión Junta Directiva y capacitación ADR	13	aguacate
DT-TR-0010	Octubre	21-10-2024	Córdoba	Montería	1	3	Reunión Junta Directiva, y verificación instalación Biofabrica y AT	14	Plátano
DT-TR-0010	Octubre	22-10-2024	Córdoba	Moñitos	1	2	Reunión Junta Directiva y verificación instalación Biofabrica	15	plátano
DT-TR-0010	Octubre	29/10/2024	Nariño	Belén	1	2	Visitas asistencia Técnica	2	Gulupa
DT-TR-0010	Octubre	30/10/2024		Córdoba	1	1	gira técnica a productores	18	Mora
DT-TR-0010	Octubre	22/10/2024	Boyacá	Covarachía	1	1	visita de implementación de BPA	1	Maracuyá
DT-TR-0010	Octubre	22/10/2024		Covarachía	1	1	Reunión con junta directiva	4	Cítricos, Aguacate, Maracuyá
DT-TR-0010	Octubre	22/10/2024		Covarachía	1	1	Visita de Asistencia técnica	1	Lima Ácida Tahiti y Aguacate
DT-TR-0010	Octubre	23/10/2024		San Mateo	1	1	Reunión con junta directiva y verificación instalación Biofabrica	4	Lima ácida Tahiti
DT-TR-0010	Noviembre	11/06/2024	ANTIOQUIA	Amaga	1	1	Socialización con Organización	1	Plátano
DT-TR-0010	Noviembre	11/07/2024		Retiro	1	3	Visitas asistencia Técnica	3	Aguacate
DT-AT0015	Noviembre	28/11/2024	RISARALDA	Belén de Umbria	1	3	Socialización ejecución Proyecto	2	Plátano
DT-TR-0010	Noviembre	28/11/2024	Santander	Puente Nacional	1	2	Visitas asistencia Técnica	2	Guayaba
DT-TR-0010	Noviembre	28/11/2024		Puente Nacional	1	1	Reunión con junta directiva y verificación acompañamiento socioempresarial	6	Guayaba
DT-TR-0010	Noviembre	29/11/2024		Vélez	1	1	Cierre de ECO	15	Guayaba
DT-TR-0010	Noviembre	29/11/2024		Vélez	1	1	Instalación y funcionamiento de la Biofabrica	1	Guayaba
DT TR 0009	Noviembre	14-11-2024	Valle del Cauca	Sevilla	1	1	Biofabrica	1	Plátano
DT TR 0009					1	1	asistencia técnica	1	Plátano
DT TR 0009	Noviembre	15-11-2024	Valle del Cauca	Bolívar	1	1	gira técnica	39	Aguacate

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH


Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT- 015 Informe de visita de campo.

En el componente técnico se desarrollaron las siguientes actividades de gestión de SYC del periodo enero a diciembre de 2024 así:

Tabla No 2. Actividades de gestión componente técnico corte a diciembre año 2024.

Seguimiento y Control Técnico	
Planes De Seguimiento	11
Metodologías De Seguimiento	11
Visitas de Cierre, Inicial, Documentales y de Campo	548
Revisión Documental/Plataforma	391
Reportes Matrices	391
Informes	118
Comités Interno SyC	126
Reunión Equipo Central	12
Reuniones Con Todo El Equipo	12
TOTAL	2073

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH



ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Del periodo de enero a diciembre de la vigencia 2024, se planificó y ejecutó el seguimiento y control financiero a través de las herramientas existentes (Sevenet, Software panda, facere, sigeca y carpeta compartida de OneDrive por contratación y compras), para los 20 proyectos aprobados y en ejecución. Durante la vigencia se programaron verificaciones de Seguimiento y Control Financiero a los proyectos y de revisión documental y/o plataformas, considerando cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control Financiero y un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero; como resultado se llevaron a cabo un total de 407 verificaciones de las cuales 8 fueron de campo a 192 productores con enfoque al seguimiento de actividades de entregas y enfoque socioempresarial, contable y tributario las cuales se describen a continuación:

Tabla No 3. Visitas de campo componente financiero enero a septiembre año 2024

PROYECTO	# DE VERIFICACIONES	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	# DE PRODUCTORES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	# VISITAS
MC-CAD-0001 AL 152	1	Entregas de elementos de Cosecha y postcosecha	40	Antioquia	La Unión	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	5	Meta	Lejanías	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	4	Caldas	Manzanares	1
MC-CAD-0001 AL168	1	Entregas de elementos de Cosecha y postcosecha	22	Huila	Guadalupe	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	4	La plata	Huila	1
MC-CAD-0001 AL181	1	Selección proveedor para la compra de ASOPLASA con recursos del FNFH	37	Risaralda	Santa Rosa de cabal	1
MC-CAD-0001 AL160	1	Entregas de elementos de Cosecha y postcosecha	40	Caldas	Risaralda	1
MC-CAD-0001 AL181	1	Entrega de elementos de cosecha y postcosecha	40	Risaralda	Santa Rosa de cabal	1

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.

Las otras 399 visitas y/o verificaciones ejecutadas por el componente, fueron netamente financieras, realizadas de manera virtual y presencial con los ejecutores que para este caso fueron ASOHOFrucOL, ANALDEX, ACIA y a las 35 alianzas formalizadas del contrato macro MC-CAD-0001. Estas verificaciones tuvieron el siguiente enfoque: avance en la ejecución de gastos FNFH 2024, revisión documental de contratos y soportes de pagos, acreditación de aporte de contrapartida cuando aplica, avance en la ejecución global del proyecto aprobado, validación de la causación de los gastos en la contabilidad, resultados financieros globales y específicos del FNFH por el periodo revisado. Así como alertas tempranas, retroalimentación de las fortalezas y se establecen compromisos para las observaciones o temas pendientes de validar o soportar. Todas las visitas fueron documentadas en el formato PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control, y sus resultados fueron consignados en los formatos PP-FT-051 reporte mensual de seguimiento y control financiero, en el formato PP-FT-053 Informe de seguimiento y control financiero en el formato PP-FT-013 Informe de resultados Financiero final, debidamente soportados.

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades de gestión financiera del periodo de enero a diciembre de 2024:




Tabla No 4. Actividades de gestión componente financiero de enero a diciembre del año 2024.

Seguimiento y Control Financiero	
Planes De Seguimiento	12
Metodologías De Seguimiento	12
Visitas (Iniciales. financieras y de campo). Revisión Documental / Plataformas	399
Reportes y/o informes Revisión De Gastos	125
Comités internos de SyC y/o reuniones	125
Trámites de desembolso	76
Legalización De Recursos	80
Comités Equipo Financiero	12
Reunión Equipo Central	12
Reuniones todo el Equipo	12
Informes finales	53
TOTAL	918

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

PROYECTOS VIGENCIA 2024

A 30 de diciembre del año 2024, se tienen veinte (20) proyectos enmarcados en los Programa de Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica, Investigación), Mercado y comercialización (comercialización, Apoyo a exportaciones) y Área Económica (Sistemas de Información), proyectos iniciados en vigencias anteriores y vigencia 2024, cofinanciados con recursos del FNFH a los cuales se les realizó el Seguimiento y Control en los componentes técnicos, financieros y jurídicos. A continuación, se relacionan el total de proyectos aprobados y ejecutados en la vigencia 2024 con Seguimiento y Control.

Tabla No 5. Relación de proyectos año 2024 – FNFH

VIGENCIAS	PROGRAMA	CODIGO	PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR FNFH	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR JD PARA EL AÑO 2024	RECURSOS GESTIONADOS CONTRAPARTIDA
VIGENCIAS ANTERIORES	Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	DT-IV-0003	Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá	AGROSAVIA – ASOHOFRUCOL	\$ 3.091.745.098	\$ 1.710.076.797	\$ 585.183.668	\$ 1.381.668.301
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0009	Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de (Jardín, Jericó, Andes, Támesis, Pueblorrico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos	ASOHOFRUCOL	\$ 955.838.091	\$ 721.390.091	\$ 33.200.000	\$ 234.448.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0003	Establecimiento de nuevas áreas de granadilla y mejoramiento de capacidades de productores hortifrutícolas a través del modelo Agroecológico de Agricultura Tropical en el municipio de Labateca, Norte de Santander	ASOHOFRUCOL	\$ 504.576.387	\$ 157.880.793	\$ 0	\$ 346.695.594
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0011	Fortalecimiento de los procesos técnico – productivos de productores priorizados de aguacate Hass y lima acida Tahití a través de la sensibilización, transferencia de tecnología y asistencia técnica bajo lineamientos de Buenas Prácticas Agrícolas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.	ANALDEX	\$ 1.714.287.000	\$ 1.200.000.000	\$ 360.000.000	\$ 514.287.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0013	Generación de acciones para el mejoramiento del estado fitosanitario en departamentos y líneas productivas priorizadas mediante estrategias de prevención, monitoreo, control y comunicación del riesgo fitosanitario del complejo HLB de los cítricos/Diaphorina citri, Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T en plátano y moscas de la fruta en mango y durazno	ASOHOFRUCOL	\$ 6.831.971.573	\$ 6.831.971.573	\$ 1.640.019.866	\$ -
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0014	Apoyo a productores de aguacate en la implementación acciones de monitoreo y control de plagas cuarentenarias, en municipios priorizados del suroeste antioqueño, para aportar al cumplimiento de requisitos de acceso al mercado de Estados Unidos	ASOHOFRUCOL	\$ 1.018.099.991	\$ 882.799.991	\$ 683.323.495	\$ 135.300.000
	Programa Mercadeo Y Comercialización - Canal De Acopio Y Distribución	MC-CAD-0001	Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas fase 3-2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR	ASOHOFRUCOL	\$ 1.295.750.000	\$ 1.295.750.000	\$ 933.873.515	\$ -
VIGENCIA 2024	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0009	Fortalecimiento de capacidades productivas y organizacionales de productores hortofrutícolas en el Valle del Cauca	ASOHOFRUCOL	\$ 499.178.950	\$ 216.750.000	\$ 216.750.000	\$ 282.428.950
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0010	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, AÑO 2024	ASOHOFRUCOL	\$ 32.628.753.821	\$ 32.285.557.183	\$ 32.285.557.183	\$ 343.196.638
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0011	Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y Totoró- Cauca	ASOHOFRUCOL	\$ 239.107.262	\$ 63.622.370	\$ 63.622.370	\$ 175.484.892
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0012	Misión internacional para el intercambio de experiencias de productores de cítricos en Brasil	ASOHOFRUCOL	\$ 187.261.200	\$ 167.261.200	\$ 167.261.200	\$ 20.000.000

PROGRAMA	CODIGO	PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR FNFH	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR JD PARA EL AÑO 2024	RECURSOS GESTIONADOS CONTRAPARTIDA
Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0013	Gira para el fortalecimiento de las capacidades en el manejo técnico del cultivo de Limón Tahití de productores priorizados de Caquetá	ASOHOFrucOL	\$ 85.380.000	\$ 76.780.000	\$ 76.780.000	\$ 8.600.000
Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0016	Fortalecimiento productivo y comercial de sistemas hortofrutícolas localizados en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Norte de Santander.	ASOHOFrucOL	\$ 1.961.451.025	\$ 710.709.807	\$ 237.565.280	\$ 1.250.741.218
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0015	Implementación de acciones para el mejoramiento fitosanitario en plagas, líneas productivas y departamentos priorizados	ASOHOFrucOL	\$ 4.889.820.520	\$ 4.889.820.520	\$ 4.889.820.520	\$ 0
Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0016	Fortalecimiento fitosanitario y productivo de los cultivos de mango y cítricos en municipios priorizados del departamento de Cundinamarca.	ASOHOFrucOL	\$ 752.413.876	\$ 302.374.767	\$ 137.682.383	\$ 450.039.109
Programa Mercadeo Y Comercialización - Canal De Acopio Y Distribución	MC-AE-0003	Apoyo para realizar la visita técnica in situ de la General Administration of Customs China (GACC), dentro del proceso de admisibilidad fitosanitaria de frutos frescos de lima ácida Tahití colombiana con destino a la República Popular de China.	ASOHOFrucOL	\$ 50.773.521	\$ 50.773.521	\$ 50.773.521	\$ 0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0009	Área de seguimiento, control y evaluación de proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortofrutícola año 2024	ASOHOFrucOL	\$ 1.228.482.537	\$ 1.228.482.537	\$ 1.228.482.537	\$ 0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0010	Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de los programas y proyectos del FNFH	PLANUPSOFT	\$ 1.080.000.000	\$ 1.080.000.000	\$ 1.080.000.000	\$ 0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0011	Unidad Técnica de Planes Programas y Proyectos - año 2024	ASOHOFrucOL	\$ 2.875.627.778	\$ 2.875.627.778	\$ 2.875.627.778	\$ 0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0012	Seminario: La agroecología y su impacto en la producción de frutas y hortalizas	Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos "ACIA"	\$ 88.578.043	\$ 67.078.043	\$ 67.078.043	\$ 21.500.000
TOTAL INVERSION				\$ 61.979.096.673	\$ 56.814.706.971	\$ 47.612.601.359	\$ 5.164.389.702
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECAUDO				\$ 7.158.281.516	\$ 7.158.281.516	\$ 7.158.281.516	\$ 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO				\$ 4.117.647.383	\$ 4.117.647.383	\$ 4.117.647.383	\$ 0
TOTALES				\$ 73.255.025.572	\$ 68.090.635.870	\$ 58.888.530.258	\$ 5.164.389.702

Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

En el Anexo No 1. Matriz Información General de Proyectos de inversión y gastos de funcionamiento (M.I.G.P.) se relaciona la información complementaria a los proyectos en ejecución y los pendientes por iniciar.



AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ENERO A DICIEMBRE) AÑO 2024.

La siguiente tabla nos presenta la información del avance presupuestal de enero a diciembre del año 2024, de los 20 proyectos aprobados y apropiados por programa incluyendo los terminados y los gastos de funcionamiento.

Tabla No 6 -Ejecución presupuestal por programa por trimestre Año de 2024.

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2024	Valor FNFH Ejecutado I Trimestre 2024	Valor FNFH Ejecutado II Trimestre 2024	Valor FNFH Ejecutado III Trimestre 2024	Valor FNFH Ejecutado IV Trimestre 2024	Porcentaje de Cumplimiento Año 2024
14	Desarrollo Tecnológico	\$ 41.376.765.965	\$ 10.534.533.200	\$ 11.344.771.335	\$ 10.425.879.212	\$ 8.725.760.074	99%
1	Investigación	\$ 585.183.668	\$ 168.017.062	\$ 194.515.198	\$ 222.651.408	\$ 0	100%
13	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 40.791.582.297	\$ 10.366.516.138	\$ 11.150.256.137	\$ 10.203.227.804	\$ 8.725.760.074	99%
2	Mercadeo y Comercialización	\$ 984.647.036	\$ 218.809.184	\$ 359.382.809	\$ 233.192.137	\$ 172.993.425	100%
2	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 984.647.036	\$ 218.809.184	\$ 359.382.809	\$ 233.192.137	\$ 172.993.425	100%
4	Área Económica	\$ 5.251.188.358	\$ 1.198.396.945	\$ 1.314.959.770	\$ 1.212.762.550	\$ 1.341.849.035	97%
4	Sistemas de Información	\$ 5.251.188.358	\$ 1.198.396.945	\$ 1.314.959.770	\$ 1.212.762.550	\$ 1.341.849.035	97%
20	SUBTOTAL INVERSIÓN FNFH	\$ 47.612.601.359	\$ 11.951.739.329	\$ 13.019.113.914	\$ 11.871.833.899	\$ 10.240.602.534	99%
N/A	Gastos Administrativos y de Funcionamiento	\$ 7.158.281.516	\$ 1.807.685.583	\$ 1.705.863.359	\$ 1.752.276.046	\$ 1.934.496.271	101%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 4.117.647.383	\$ 861.649.870	\$ 828.170.827	\$ 906.463.705	\$ 1.163.762.355	91%
N/A	TOTAL	\$ 58.888.530.258	\$ 14.621.074.782	\$ 15.553.148.100	\$ 14.530.573.650	\$ 13.338.861.160	99%

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH


Con respecto a los \$58.888.530.258=, financiados con recursos del FNFH para los 20 proyectos y los gastos de funcionamiento (Recaudo y Administrativos) programados para el año 2024; fueron ejecutados presupuestalmente para el primer semestre de 2024 (incluyendo cambios presupuestales el valor de \$14.621.074.782=, para el segundo trimestre de 2024 fueron ejecutados presupuestalmente (incluyendo cambios presupuestados el valor de \$15.553.148.100=, para el tercer trimestre de 2024 fueron ejecutados presupuestalmente (incluyendo cambios presupuestados el valor de \$14.530.573.650; para el cuarto trimestre de 2024 fueron ejecutados presupuestalmente (incluyendo cambios presupuestados el valor de \$13.338.861.160=, alcanzando una ejecución total con corte al 31 de diciembre del 2024 del 99% del valor aprobado para el año.

De requerir cualquier información detallada y justificada del presupuesto por proyecto, dirigirse al Anexo 8 de la resolución 000532 de 2023 del MADR, elaborado por el proceso de presupuesto de ASOHOFRUCOL.



Gráfica 3- Relación de Recursos Desembolsados en el I, II, III y IV Trimestre del año 2024, proyectos de inversión FNFH.

EJECUCIÓN ENERO A DICIEMBRE AÑO 2024 PROYECTOS DE INVERSIÓN

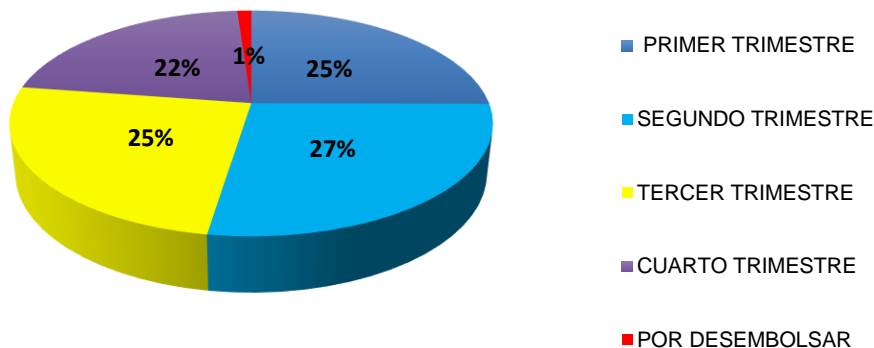

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2024. (M.E.P.).

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2024

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada del FNFH durante la vigencia 2024:

Tabla No 7 -Ejecución presupuestal por programa Año 2024.

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2024	Valor FNFH Ejecutado a diciembre 2024	Porcentaje de Cumplimiento Año 2024
12	Desarrollo Tecnológico	\$ 41.376.765.965	\$ 41.030.943.821	99%
1	Investigación	\$ 585.183.668	\$ 585.183.668	100%
11	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 40.791.582.297	\$ 40.445.760.153	99%
3	Mercadeo y Comercialización	\$ 984.647.036	\$ 984.377.555	100%
3	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 984.647.036	\$ 984.377.555	100%
5	Área Económica	\$ 5.251.188.358	\$ 5.067.968.300	97%
5	Sistemas de Información	\$ 5.251.188.358	\$ 5.067.968.300	97%
20	SUBTOTAL INVERSIÓN FNFH	\$ 47.612.601.359	\$ 47.083.289.676	99%
N/A	Gastos Administrativos y de Funcionamiento	\$ 7.158.281.516	\$ 7.200.321.259	101%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 4.117.647.383	\$ 3.760.046.757	91%
N/A	TOTAL	\$ 58.888.530.258	\$ 58.043.657.692	99%

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH






Con respecto a los \$58.888.530.258= financiados con recursos del FNFH para los 20 proyectos aprobados y los gastos de funcionamiento; se alcanzó una ejecución real a 31 de diciembre equivalente a \$58.043.657.692=, alcanzando un avance del 99% del 100% que se tiene como meta para la vigencia 2024.

Gráfico 4- Relación de Recursos proyecto de inversión FNFH Ejecutados a 31 de diciembre de 2024

EJECUCIÓN AÑO 2024 PROYECTOS DE INVERSIÓN

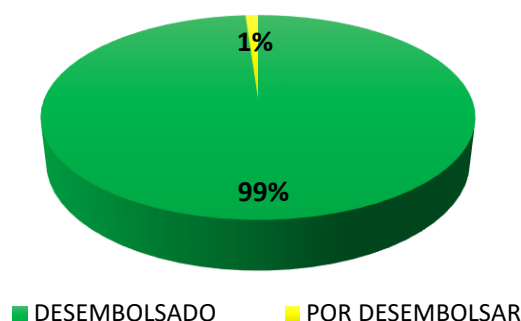


Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIADOS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2024 POR EL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

A continuación, se muestra la información de cumplimiento técnico y financiero evidenciado por el Área de Seguimiento y control con la realización de las verificaciones documentales y de campo, tanto técnico como financiero con corte al mes de diciembre de 2024.

Se relacionan los proyectos en ejecución durante el año 2024 con la información general del proyecto, su inversión, los respectivos porcentajes de avance a 31 de diciembre de 2024, resultados de cumplimiento obtenidos según las metas establecidas de las actividades cofinanciadas con recursos del FNFH.



PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DT-IV-0003. APOORTE DE LAS PRÁCTICAS CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE AGUACATE EN TOLIMA Y HUILA, PASIFLORAS EN BOYACÁ Y META, TOMATE EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ.

Fecha de inicio: 15 de noviembre 2022

Fecha de terminación: 15/02/2025

Entidad Ejecutora: ASOHOFRUCOL – AGROSAVIA

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 168 del 09/12/2022:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 2.307.968.264
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 1.428.101.757
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 879.866.507

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 172 del 27/03/2023:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 3.091.745.098
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 1.710.076.797 Vigencia
2022: \$ 578.450.703
Vigencia 2023: \$ 546.442.426
Vigencia 2024: \$ 585.183.668
- ✓ Recursos contrapartida: \$ 1.381.668.301

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.


El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por \$1.710.076.797=Mcte., correspondientes al 100%, de acuerdo con la siguiente distribución:

- INVERSION PRESUPUESTAL (año 2022) \$578.450.703=Mcte., correspondiente al 33,8%.
- INVERSION PRESUPUESTAL (año 2023) \$546.442.426=Mcte. correspondiente al 32%.
- INVERSION PRESUPUESTAL (año 2024) \$585.183.668=Mcte. correspondiente al 34,2%.

Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios y en gastos generales: materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje y otros servicios.

Nota: Se aclara, que dichos recursos fueron trasladados a las cuentas especiales del convenio, tanto a la cuenta de ASOHOFRUCOL destinada para la ejecución de las actividades planteadas según la ficha del proyecto, como a la cuenta de AGROSAVIA, de las actividades que realizan con recursos del FNFH de acuerdo con el convenio.

El ejecutor con corte a diciembre, presenta una ejecución financiera global por valor de \$3.047.352.378=Mcte., correspondientes al



98,6% distribuidos de la siguiente manera: una ejecución financiera del FNFH por valor de \$1.687.431.955=Mcte., correspondientes al 98,7% y presenta una ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de \$1.359.920.423=Mcte., correspondientes al 98,4%.

Con corte a diciembre el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH por valor de \$1.608.111.767=Mcte., correspondientes al 94% (Cumpliendo) y una validación financiera global por valor de \$2.968.032.190=Mcte., correspondientes 96% (Cumpliendo).

Zonas de Intervención: Departamentos: Boyacá, Cundinamarca Huila, Meta y Tolima.

Líneas Productivas: aguacate, Gulupa, Maracuyá, Tomate.

No de beneficiarios: 489 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 98.54%


Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 98.90%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto en la ejecución técnica global presenta un avance del 98,52% aprobado de un 98,06% esperado.

Resultados relevantes:

- Cuatro (4) (matrices de variables seleccionadas colaborativamente y consolidadas (Una matriz por línea productiva) de cuatro (4) programadas.
- Cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 96 entrevistas semiestructuradas (8 entrevistas semiestructuradas a actores de la cadena en dos municipios seleccionados del área de influencia del proyecto por departamento) de cuatro (4) programadas.
- Cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 360 entrevistas estructuradas (30 por municipio) de cuatro (4) programadas.
- Cuatro (4) documentos de caracterización de productores y medios de vida con y sin AT, uno por línea productiva que incluye la información secundaria, y primaria colectada a través de entrevistas; así como la validación realizada en los grupos focales (12 grupos focales al menos 1 por línea productiva por municipio). de cuatro (4) programadas.
- Las observaciones puntuales de avances para el periodo se relacionan en la matriz de metas adjunta a la visita de seguimiento.
- Versión final. Documento con el análisis de los procesos que ocasionan el mayor impacto ambiental de la producción de tomate bajo cubierta y estrategias de reaprovechamiento de residuos.
- Cuatro (4) matrices con indicadores multidimensionales identificados a partir de fuentes secundarias. de cuatro (4) programadas.
- Cuatro (4) baterías de indicadores seleccionados en trabajo colaborativo con actores de la cadena y el territorio. de cuatro (4) programadas.
- Cuatro (4) documentos con resultados y análisis de la medición de indicadores multidimensionales para cada sistema productivo, en las seis regiones establecidas, de 4 programados.
- Una (1) matriz de selección de alternativas, a partir del trabajo colaborativo con actores focales de una (1) programada.
- Cuatro (4) bases de datos con resultados de la medición de indicadores seleccionados (Libros de campo). Información de los veinticuatro (24) productores inscritos (parcelas) Evidencia de seis (6) Biofábricas apoyadas para el establecimiento.
- Versión final. Documento con resultados de la medición para alternativas desarrolladas por Agrosavia en el cultivo de tomate.



- Establecimiento de un (1) ensayo a nivel de centro de investigación para la evaluación de alternativas de AT.
- Un (1) documento de caracterización del biopreparados con mayor uso. Una (1) infografía con recomendaciones orientadas a las Buenas Prácticas de Manufactura para la obtención de biopreparados. Un video animado de buenas y malas prácticas de manufactura de biopreparados.
- Realización de (3) videos con experiencias en la implementación de Agricultura Tropical -AT. y La marchitez o amarillamiento del aguacate Hass, un problema de raíz”.
- Realización de cuatro (4) Talleres de actualización para técnicos y productores de las líneas productivas y área de influencia del proyecto (1. Agrosavia Meta. 2, Palocabildo Tolima) y 3, Miraflores en Boyacá. 4. Granada Meta. (Ejecución del taller “Modernización de la fruticultura para el Ariari. Cadena de valor del maracuyá: transformación y agregación de valor”).
- Ejecución de los ocho (8) módulos de capacitación del Curso con énfasis en los ejes fundamentales de la AT, orientado a Técnicos. 8 subtemas ejecutados.
- Realización de una jornada de doce programadas para la divulgación de resultados del proyecto en la feria de EXPOFRUTAS y publicación de resultados en la Revista Frutas & Hortalizas de Asohofrucol.
- Realización seis (6) giras técnicas de seis (6) programadas así:
 1. 24 de febrero Granada y Lejanías Meta: 16 participantes
 2. 04-05- de marzo Eje Cafetero 31 participantes
 3. 23/04/2024 San Agustín Huila. 34 participantes
 4. 25-26 de abril Boyacá tomate a Ci Tibaitatá 24 participantes
 5. 26-26 de abril Boyacá Gulupa a Granada Cund. 31 participantes
 6. 03/05/2024 Cundinamarca tomate a Ci Tibaitatá 27 participantesEn total, se contó con 163 participantes de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% fueron mujeres.

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA

DT-TR-0003. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS DE GRANADILLA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTÍCOLAS A TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE SANTANDER.

Fecha de inicio: 20/02/2023

Fecha de terminación: 20/05/2024


Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL y FNFH

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$504.576.387
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$157.880.793





- ✓ Vigencia 2023: \$157.880.793
- ✓ Recursos Contrapartida: \$346.695.594

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

Proyecto terminado, cierra con una ejecución presupuestal final de \$157.880.793=Mcte. correspondiente al 100%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Honorarios, materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje, capacitación y otros servicios, se aclara, que la ejecución presupuestal corresponde, a los traslados de recursos a la cuenta especial del proyecto a ASOHOFrucOL, los cuales se realizaron en la vigencia 2023. Sobre el cual deseo informar que los recursos no ejecutados por valor de \$4.631.592, fueron reintegrados a las cuentas del FNFH afectando la cuenta de recuperaciones, puesto que el proyecto no tenía apropiado presupuesto para la vigencia 2024, porque todo el recurso aprobado por el FNFH fue desembolsado año 2023 de acuerdo al anexo II que aplicaba en ese año.

El ejecutor presenta una ejecución financiera total final por valor de \$499.944.793=Mcte., correspondiente al 99.1%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$153.249.201=Mcte., que corresponden al 97.1%, y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$346.695.592=Mcte., correspondientes al 100%.

La validación financiera final por parte del área de seguimiento y control, de los recursos del FNFH es por valor \$153.249.201=Mcte., que corresponden al 97.1%, y una ejecución financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$499.944.793=Mcte., correspondiente al 99,1%.

Zonas de Intervención: Departamento de Norte de Santander, Municipios de Labateca

Líneas Productivas: Granadilla, otras frutas y hortalizas

No de beneficiarios: 50

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

El proyecto terminado, cumplió con lo programado ejecutando las siguientes actividades

- Se realizó 1 capacitación al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos del proyecto uniformando criterios de conocimiento del proyecto.
- Se logró realizar una socialización del proyecto dirigida a productores y actores del proyecto.
- Se tuvieron 50 productores inscritos.
- Se realizaron 7 talleres con la participación de 266 asistentes.
- Se realizaron 613 visitas de asistencia técnica.
- Se eligieron 14 predios para el establecimiento de parcelas.
- Se practicaron 14 análisis de suelos con el resultado de PH y análisis químico de suelos.
- Como resultado de los análisis se elaboraron 14 planes de fertilización.
- Se logró tener 7 biofábricas establecidas.
- 14 parcelas establecidas.



- Ejecutados 6 talleres socio empresariales con 191 asistentes.
- 50 kits de sostenimiento entregados.
- 36 visitas de asistencia técnica socio empresarial.
- Se logro tener 3 acercamientos con aliados comerciales.

Como resultados relevantes se tiene que: En la zona de intervención del proyecto fueron seleccionados 14 grupos de trabajo en donde se establecieron 14 parcelas, la entrega de insumos para el incremento de las áreas de siembra de granadilla, mejorando producción, calidad y rendimientos con el acompañamiento técnico aportado. Así mismo la selección de 7 productores en donde se establecieron biofabricas.

Se realizaron 613 visitas de asistencia, 14 tomas de muestras de análisis de suelos y planes de fertilización de estos y 6 talleres socio empresariales se fortalece las capacidades productivas y técnicas de los productores beneficiados.

DT-TR-0009. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS EN EL VALLE DEL CAUCA.

Fecha de inicio: 02/05/2024

Fecha de terminación: 31/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA, FNFH

Inversión:


Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 499.178.950
- Recursos Aporte FNFH: \$ 216.750.000
- ✓ Vigencia 2024: \$216.750.000
- Recursos contrapartida: \$282.428.950

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

El proyecto a 31 de diciembre, presenta un avance de ejecución presupuestal por valor de \$216.750.000=Mcte. correspondiente al 100%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, materiales, suministros y papelería, capacitación y viáticos y gastos de viaje, se aclara, que la ejecución presupuestal corresponde, al traslado de recursos a la cuenta especial del proyecto a ASOHOFRUCOL, los cuales se realizaron en la vigencia 2024.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera total final del proyecto por valor de \$493.884.893=Mcte., correspondiente al 98,94%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$216.448.077=Mcte., que corresponden al 99,86%, y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$277.436.816=Mcte., correspondientes al 98,23%.



El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera final de los recursos del FNFH por \$216.448.077=Mcte., que corresponden al 99,86%, de los recursos de contrapartida se presenta una validación financiera final por valor de \$277.436.816 correspondientes al 98,23%, para una ejecución financiera global final validada por el área de seguimiento y control de \$493.884.893=Mcte., correspondiente al 98,94%.

Zonas de Intervención: Valle del Cauca.

Líneas Productivas: Mora, guayaba, aguacate, cítricos, plátano y pimentón.

No de beneficiarios: 160 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

- 1 capacitación del equipo técnico.
- 6 socializaciones con 176 participantes entre representantes de los productores de las organizaciones, productores y representantes de las entidades territoriales del Valle del Cauca.
- 160 productores inscritos.
- 43 talleres desarrollados con la participación de 465 productores.
- 10 lugares seleccionados para el establecimiento de las biofábricas, criterios de cumplimiento para la selección de los predios y biofábricas establecidas con insumos, materiales y herramientas.
- 160 análisis de suelos.
- 160 planes de nutrición.
- 960 visitas de acompañamiento realizados.
- 5 capacitaciones realizadas 4 por parte de la fundación Saldarriaga y una Socioempresarial con 143 participantes
- 1 documento de Enfoque Diferencial para Productores Mayores en el Sector Hortofrutícola Colombiano.

Como resultados relevantes se tiene que:

Entrega de 10 biofabricas para la producción de insumos enmarcados en el modelo de Agricultura Tropical, con el fin de aumentar las capacidades de los 160 productores a través de capacitaciones y 936 asistencias técnicas en 1536 ha en las líneas de Aguacate, Cítricos, Guayaba, Mora, Pimentón y Plátano.


DT-TR0010 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2024

Fecha de inicio: 01/01/2024

Fecha de terminación: 31/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFrucOL





Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL y FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 32.624.006.701
- Recursos Aporte FNFH: \$ 32.280.810.063
- Recursos contrapartida: \$ 343.196.638

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 32.628.753.821
- Recursos Aporte FNFH: \$ 32.285.557.183
- Recursos contrapartida: \$ 343.196.638

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto con corte a diciembre alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor \$32.134.457.591=Mcte. correspondiente al 99,5% del presupuesto ajustado y apropiado para la vigencia 2024. Dichos recursos están representados en servicios de personal "Personal de planta y honorarios", equipos de cómputo y computación, muebles y equipos de oficina, impresos y publicaciones, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, arriendos, elementos de aseo y cafetería e investigación, entre otros.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a diciembre el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$32.477.654.229=Mcte., correspondiente al 99,54%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$32.134.457.591=Mcte., que corresponden al 99,5%, y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$280.764.622=Mcte., correspondientes al 81,81%.

Con corte a diciembre el proyecto alcanza una validación financiera global por parte del área de seguimiento y control de \$32.409.027.658=Mcte., correspondiente al 99,33% distribuida de la siguiente manera: por valor de \$32.065.831.020=Mcte., que corresponden al 99,32%, de los recursos FNFH y una ejecución financiera validada de los recursos de contrapartida por valor de \$343.196.638=Mcte., correspondientes al 100%.

Zonas de Intervención

- ✓ Departamentos: 22
- ✓ Municipios: 449

Líneas Productivas: alrededor de 63 entre frutas y hortalizas.

No de beneficiarios: 16.580


Porcentaje de ejecución técnica programado: 100,00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 95.45%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

Para el mes de diciembre de 2024, se presentan los siguientes logros hasta la fecha:





Al mes de diciembre se han inscrito 17.509 productores de una meta de 16.580 productores.

- Se conformaron 627 Escuelas de conocimiento en el País, de las cuales permanecieron activas hasta el final del proyecto 623, a las cuales se les realizó 3.743 talleres técnicos con énfasis en temáticas de agricultura tropical, para mejorar aspecto de nutrición, manejo de suelo y agua y control de plagas y enfermedades.
- Se practicaron 56.639 visitas de asistencia técnica, dirigida a 8.165 productores, apoyando el mejoramiento productivo.
- El proyecto está presentando servicio de asistencia técnica en 22 departamentos y la región de Urabá y 454 municipios del País. Asisten a 60 líneas productivas en lotes principales. El área intervenida en estos lotes principales en el segundo diagnóstico suma de 13.767 hectáreas de frutas y hortalizas. En área de importancia atendida se presentan: plátano 3.899 hectáreas; aguacate 3.601 hectáreas; cítricos 2.921 hectáreas; mango 1.395 hectáreas; mora 369 hectáreas; pasifloras 260 hectáreas.
- A través de las 8.335 visitas de implementación BPA, se logró certificar 1.56 predios en diferentes normas de calidad, siendo Predio Exportador la de mayor cantidad con 376 predios, seguida de registro BPA con 286 predios y GG V5.4-1 GFS 167 predios.
- Se establecieron y dotaron con insumos para la elaboración de biopreparados 46 biofábricas, incluida 1 en la parcela de investigación en el Urabá Antioqueño.
- Se realizaron 2.316 talleres de fortalecimiento socio empresarial y 2.708 visitas de asistencia técnica socio empresarial, dirigidos a 388 organizaciones de productores priorizadas, con el mejoramiento comercial, a través de la elaboración de 273 planes de comercialización,
- Realizados 9 eventos de difusión (Cuarto Seminario Internacional de Aguacate, Agroferia 2024, Seminario Internacional de Plátano, Seminario Internacional de Berries, II Seminario Internacional de Mango de Azúcar, III Seminario Internacional cítrica, Seminario Internacional Hortifrutícola, II Feria Hortifrutícola Agrobio Urabá y II Seminario Internacional de Passifloras.
- 12 parcelas de investigación con información de variables de gestión de suelo, agua, flora y fauna del suelo, monitoreo de plagas y enfermedades y nutrición vegetal al mes de diciembre de 2024 y 3 informes parciales sobre los resultados de las parcelas de investigación.

DT-TR-0011. FORTALECIMIENTO EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE FRESA PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, PÁEZ Y TOTORÓ- CAUCA

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2024.

Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2025.


Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, FUNDACIÓN PROMIGAS, FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:





- Monto del proyecto: \$ 239.107.262
- Recursos Aporte FNFH: \$ 63.622.370
- Recursos contrapartida: \$175.484.892

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto se encuentra cumpliendo, con corte a diciembre alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor \$63.622.370=Mcte., que corresponden al 100%, del presupuesto ajustado y apropiado para la vigencia 2024. Dichos recursos están representados en honorarios, materiales suministros y papelería, capacitación, viáticos y gastos de viaje, gastos de laboratorio.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a diciembre el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$48.031.695=Mcte., correspondiente al 20,1%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución de los recursos en efectivo de cofinanciación (FNFH) de \$16.156.800=Mcte., que corresponden al 25,4%, el ejecutor presenta informe de ejecución financiera de los recursos de contrapartida de \$31.874.895=Mcte., que corresponden al 18% del valor total de las contrapartidas.

Con corte a diciembre el proyecto alcanza una validación financiera global por parte del área de seguimiento y control de del FNFH fue de \$16.156.800=Mcte., que corresponden al 25,4%, y una validación financiera global de \$48.031.695=Mcte., correspondiente al 20,1%.

Zonas de Intervención: Cauca.

Líneas Productivas: fresa.

No de beneficiarios: 20 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 20.91%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 21.54%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto DT-TR-0011, ejecutado en el departamento de Cauca, alcanzó una ejecución superior a la esperada, para el mes de diciembre de 2024, toda vez que el ejecutor presentó el plan de trabajo sobre los 57 puntos de la resolución ICA BPA, para 10 de los 20 productores, pese a que se esperaba para diciembre de 2024 solamente se hicieran 5 planes de trabajo.

Aunque se ha terminado la actividad de capacitación al personal contratado, se sugiere capacitar al profesional Ingeniero Agroindustrial, una vez se contrate en el mes de febrero de 2025. Se completó la socialización e inscripción de productores, así como el diagnóstico productivo a los 20 productores.

Como resultados relevantes se tiene que:

- Se identificaron los 20 productores a intervenir en la implementación de la norma BPA.
- Se realizó una línea base productiva de fresa para los 20 productores beneficiarios directos, con información sobre área productiva y calidad de fresa, con lo cual se pretende conseguir los aliados comerciales para la organización.
- Se determinó el nivel de implementación de BPA para 10 de los 20 productores beneficiarios del proyecto y se realizó el respectivo plan de trabajo, con lo que se garantizará a futuro la implementación de la norma.



DT-TR-0012. MISIÓN INTERNACIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN BRASIL.

Fecha de inicio: 15/03/2024

Fecha de terminación: 15/08/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFrucOL

Entidades contrapartes: ASOHOFrucOL y FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 187.261.200
- Recursos Aporte FNFH: \$ 167.261.200
- Recursos contrapartida: \$ 20.000.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presentó un avance de ejecución presupuestal final por valor de \$167.261.200=Mcte. correspondiente al 100%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFrucOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera final total del proyecto por valor de \$187.261.200=Mcte., correspondiente al 100% (Cumpliendo), distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$167.261.200=Mcte., que corresponden al 100% (cumpliendo) y presenta una ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de \$20.000.000=Mcte., correspondientes al 100%.

Con corte a septiembre el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control por \$167.261.200=Mcte., que corresponden al 100%, y una validación financiera global de \$187.261.200=Mcte., correspondiente al 100%.

Zonas de Intervención: Nacional

Líneas Productivas: cítricos.

No de beneficiarios: 9 productores (directos) y 170 productores (indirectos).

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100,00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

- Se realizaron 9 visitas a organizaciones, entidades y empresas vinculadas al sector productivo y comercial de cítricos en Brasil.
- Participación en la feria Fruit Attraction Brasil 2024 con realización de mesas de trabajo para concertación de conocimientos y recolección de propuestas por parte de los participantes, con acercamientos comerciales, apropiación de conocimientos de



alta relevancia para el control de HLB en el cultivo de cítricos bajo la experiencia de ARCOS implementada en Brasil.

Como resultados relevantes se tiene que:

- Conocer la dinámica de exportación de los cítricos en fresco y transformado de Brasil.
- Evidenciar el potencial de la línea productiva naranja ante a latente disminución del área de Brasil por causa del HLB, esto permite generar una oportunidad para Colombia, en diversificar el área establecida y dejar de lado el incremento en establecimiento en lima Tahití para aprovecharlo en naranja y proveer el mercado transformado de zumos de frutas cítricas.
- Generar la sensibilización en los productores de la importancia de realizar monitoreo y control de HLB en los predios constantemente, para evitar que se continúe propagando la enfermedad a lo largo del país.
- Crear conciencia en los productores de la importancia de implementar modelos productivos sostenibles en los predios, dejando de lado los insumos químicos que contaminan los suelos, el ambiente y la humanidad, dado que como se evidencio en Brasil, a pesar de las constantes aplicaciones, no han logrado controlar la presencia de plagas y enfermedades.
- Sensibilizar a los empresarios del campo de la importancia de la asociatividad, pues es el camino para lograr dos objetivos primordiales producir y comercializar de manera correcta.
- Realizar réplicas de conocimiento con los productores miembros de las organizaciones de las experiencias vividas en la misión.
- Generar mesas de trabajo para la conformación de una federación de productores de cítricos con objetivos claros y medibles.
- Generar acercamientos comerciales con compradores en la Unión Europea para la comercialización de cítricos desde Colombia.

DT-TR-0013. GIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE LIMÓN TAHITÍ DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE CAQUETÁ.

Fecha de inicio: 15/04/2024

Fecha de terminación: 15/08/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL


Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$85.380.000





- Recursos Aporte FNFH: \$ 76.780.000
- Recursos contrapartida: \$8.600.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presentó un avance de ejecución presupuestal final por valor de \$76.545.275=Mcte. correspondiente al 99,7%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presentó una ejecución financiera final total del proyecto por valor de \$85.145.275=Mcte., correspondiente al 99,7%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$76.545.275=Mcte., que corresponden al 99,7%, el ejecutor presenta informe de ejecución financiera de contrapartida por valor de \$8.600.000 correspondientes al 100%.

La validación financiera final por parte del área de seguimiento y control con recursos del FNFH es por valor de \$76.545.275=Mcte., correspondiente al 99,7%, y una validación financiera global de \$85.145.275=Mcte., correspondientes al 99,7%.

Zonas de Intervención: Caquetá y Quindío.

Líneas Productivas: limón.

No de beneficiarios: 42 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%


Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

- Realización de gira técnica al departamento del Quindío, municipio de Calarcá, vereda el Cairo, predio el Limonar donde participaron 42 productores del departamento del Caquetá.
- Apropiación de conocimientos para los 42 productores asistentes en temas de certificación orgánica, global gap y predio exportador, Identificación y control de plagas y enfermedades de interés económico en limón Tahití, elaboración de biopreparados, Toma de muestra e interpretación de análisis de suelos, Elaboración de biofertilizantes.

Como resultados relevantes se tiene que:

- Definición de estrategias para la implementación de prácticas del modelo de agricultura tropical por parte de los productores.
- Mejora en el conocimiento de los productores participantes en relación con las prácticas de manejo agronómico del cultivo de limón Tahití.
- Socialización de la gestión e importancia del recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola.
- De los 40 productores asistentes a la gira en el departamento de Quindío los días 15-16 de mayo de 2024, 33 productores asistentes obtuvieron un puntaje por encima del 60% en la prueba de conocimiento al final.
- De los 40 productores asistentes a la gira técnica en el departamento de Quindío los días 15-16 de mayo de 2024, 35 productores están interesados en adoptar todas las practicas agronómicas que se les socializo e indico en la gira y tienen la disposición de implementar procesos de certificación y prácticas del modelo de agricultura tropical, información que se consolido en socialización de los resultados de la gira entre el Ing. Diego Vanegas de Asohofrucol y el representante legal de la asociación Asodalias Fabian Arturo Castro.



- 34 beneficiarios indirectos de la asociación Asodalias fueron impactados mediante la actividad de socialización de los resultados de la gira técnica, actividad que se realizó en el municipio de San Vicente del Caguán departamento del Caquetá el día 4 de julio de 2024 por el técnico de Asohfrucol Diego Vanegas.

DT-TR-0016. FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE SISTEMAS HORTOFRUTÍCOLAS LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE, ATLÁNTICO, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER.

Fecha de inicio: 19/12/2024

Fecha de terminación: 19/12/2025

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, FNFH

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No176 del 18 de octubre del 2024

- Monto del proyecto: \$ 1.961.451.025
- Recursos Aporte FNFH: \$ 710.709.807
- Vigencia 2024 FNFH: \$ 237.565.280
- Recursos contrapartida: \$ 1.250.741.218 Fundación Promigas (Efectivo)

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto se encuentra cumpliendo, con corte a diciembre alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor \$237.565.280=Mcte. correspondiente al 33,4% del presupuesto apropiado para la vigencia 2024. Dichos recursos están representados en honorarios, materiales suministros y papelería, capacitación, viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el Ejecutor no presenta ejecución financiera con corte al 31/12/2024, se aclara que el proyecto inicio el 19/12/2024 y se encontraba en etapa de planeación y contratación del personal.

Zonas de Intervención: Sucre, Atlántico, Santander y Norte de Santander.

Líneas Productivas: Plátano, berenjena, granadilla, durazno, tomate chonto.

No de beneficiarios: 375 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 0%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 0%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto fue aprobado en la Junta Directiva del FNFH No 176 del 18/10/2024 y la fecha de inicio de la ejecución fue el 19 de diciembre de 2024. El proyecto se encuentra en fase preoperativa, de contratación y capacitación.



PROYECTOS ASISTENCIA TECNICA

DT-AT-0009 APOYO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO DE LOS MUNICIPIOS DE (JARDÍN, JERICÓ, ANDES, TÁMESIS, PUEBLORRICO) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADMISIBILIDAD PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Fecha de inicio: 19/09/2022

Fecha de Terminación: 18/09/2023

Prorroga, adición en tiempo y recursos: nueva fecha de terminación **31/01/2024** aprobada en la Junta extraordinaria N°171 del 14/09/2023

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: aliados, Comfenalco

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 796.082.220
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 565.154.220
- ✓ Vigencia 2022: \$ 191.422.220
- ✓ Vigencia 2023: \$ 373.732.000
- ✓ Vigencia 2024: \$ 33.200.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 230.928.000

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 171 del 14/09/2023:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 955.838.091
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 721.390.091
- ✓ Vigencia 2022: \$ 191.422.220
- ✓ Vigencia 2023: \$ 496.767.871
- ✓ Vigencia 2024: \$ 33.200.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$ 234.448.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El ejecutor presentó una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$721.390.091=Mcte. correspondiente al 100%, discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2022 DE \$191.422.220=Mcte. correspondiente al 26,5%
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$496.767.871=Mcte. correspondiente al 68,9%
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$33.200.000=Mcte. correspondiente al 4,6%

Dichos recursos, están representados en servicios de personal: honorarios y en gastos generales: materiales, suministros y papelería y



capacitación.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el Ejecutor presentó una ejecución financiera global final del proyecto por valor de \$939.243.997=Mcte., correspondiente al 98,3%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución de los recursos en efectivo de cofinanciación (FNFH) de \$719.664.993=Mcte., que corresponden al 99,8% y una ejecución global de los recursos de contrapartida por valor de \$219.579.004=Mcte., correspondientes al 93,7%.

La validación financiera final del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH fue de \$719.664.993=Mcte., correspondiente al 99,8%, y una validación financiera global de \$939.243.997=Mcte., correspondientes al 98,3%.

Zonas de Intervención: departamento de Antioquia, municipios de Jardín, Jericó, Andes, Támesis y Pueblorrico.

Líneas Productivas: aguacate Hass y cualquier tipo de Aguacate.

No de beneficiarios: 1412 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%


Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presentó una ejecución técnica de un 100% de un 100% esperado, según las metas iniciales del proyecto. El estado de cumplimiento por actividad al mes de marzo de 2024 es el siguiente:

- Se realizaron 4 capacitaciones al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto uniformando criterios conocimiento del proyecto.
- Se logró realizar 15 socializaciones del proyecto en 5 municipios atendidos con beneficios del proyecto, las fuentes de cofinanciación y los resultados esperados al terminar el proyecto.
- Se impartió 1 capacitación en sistemas de información geográfica enfocado en localización sobre cartografía digital.
- 5 capacitaciones al equipo técnico, 1 en alturas, 1 herramientas ofimáticas, un diplomado de seguridad en el trabajo, BPA y primeros auxilios.
- Se consolidaron 16 capas catastrales caracterizadas (2 entregadas y caracterizadas por Corpohass).
- Se obtuvieron 834 registros en plataforma sisfito.
- Se elaboraron 834 encuestas en proceso de certificación de predios en lugares de producción libres de plagas cuarentenarias en el cultivo de aguacate.
- Se realizaron 7998 visitas de monitoreo.
- Se construyeron 52 planes de manejo a productores atendidos con el fin de mejorar el estatus fitosanitario en los predios priorizados.
- Se realizaron 370 visitas de asistencia técnica a 51 predios en 176 ha.
- Se imprimieron 4000 volantes impresos con información del FNFH Y ASOHOFRUCOL y 2000 stickers entregados a 965 beneficiarios.

Logros relevantes.





En la zona de intervención del proyecto ya se encuentran caracterizados 14 núcleos productivos que mantienen el estatus fitosanitario para para plagas de control en aguacate.

16 capas caracterizadas La Alejandría, San José Monte Hass, La Magdalena, Pirineos, Rancho Alegre, la Sofía y campo Alegre y monitoreadas con 834 caracterizaciones en 4 municipios identificando predios con aguacate con la implementación del sistema de vigilancia para el reconocimiento de zonas libres de plagas cuarentenarias.

Al corte del informe final se evidencian 7998 visitas de monitoreo en plataforma sigeca, a 1286 productores ubicados en 36 núcleos determinando la presencia o no de plagas cuarentenarias para así poder tener una zona buffer libre, en los predios se comparte con los productores información de identificación de las plagas de interés, afectación en el desarrollo del cultivo y manejo fitosanitario.

DT-AT-0011 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICO – PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE AGUACATE HASS Y LIMA ÁCIDA TAHITÍ A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y CUNDINAMARCA.

Fecha de inicio: 15/05/2023

Fecha de Terminación: 14/08/2024

Entidad ejecutora: Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX

Entidades contrapartes: otras fuentes, ANALDEX

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 1.714.287.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.200.000.000
- ✓ Vigencia 2023: \$840.000.000
- ✓ Vigencia 2024: \$360.000.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$514.287.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presentó una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$1.197.800.000=Mcte. correspondiente al 99.8% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$840.000.000=Mcte. correspondiente al 70%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$ 357.800.000=Mcte. correspondiente al 29,8%.

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos generales: kit de transferencia conocimientos BPA y GLOBAL GAP; viáticos y gastos de viaje, se aclara que dichos recursos fueron trasladados a la cuenta especial de ANALDEX. Sobre el cual deseo informar que los recursos no ejecutados por valor de \$2.200.000, fueron reintegrados a las cuentas del FNFH para la vigencia 2024.



El proyecto fue ejecutado por ANALDEX, el ejecutor presentó una ejecución financiera final global por valor de \$1.711.702.210 =Mcte., correspondiente al 99,8% (cumpliendo), distribuida de la siguiente manera: de los recursos del FNFH presenta una ejecución acumulada por valor de \$1.197.800.000 =Mcte., correspondientes al 99,8% y de los recursos de contrapartida presenta un valor de ejecución acumulada de \$513.902.210 =Mcte., correspondientes al 99,93%.

El área de seguimiento y control, valida una ejecución financiera final global por valor de \$ 1.711.702.210=Mcte., correspondiente al 99,8% distribuida de la siguiente manera: de los recursos del FNFH presenta una validación acumulada por valor de \$1.197.800.000=Mcte., correspondientes al 99,8% y de los recursos de contrapartida presenta un valor de ejecución validada por valor de \$513.902.210 =Mcte., correspondientes al 99,93%.

Zonas de Intervención: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Risaralda.

Líneas Productivas: aguacate - Lima ácida Tahití.

No de beneficiarios: 200 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Logros relevantes en el proyecto:

En el objetivo No. 1 relacionado con la identificación de productores y asociaciones, ANALDEX logró:

1. Difusión a través de canales como Mailyng y redes sociales. El equipo técnico se encargó de socializar el proyecto con las entidades territoriales, quienes jugaron un papel fundamental en la difusión y comunicación con los productores de la zona y se compartieron piezas publicitarias especialmente diseñadas para la convocatoria de las socializaciones. Esta convocatoria abierta logró generar la inscripción de 480 productores, de los cuales no cumplieron requisitos 169 y se caracterizaron 311.

2. ANALDEX, socializó el proyecto en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca, teniendo como resultado 308 participantes, de las cuales participaron en forma virtual 59 y presencial 249.


3. De los productores caracterizados, en los cinco departamentos, 276 fueron de la línea productiva aguacate y 35 de lima ácida Tahití.

4. De los 200 productores que finalmente participaron del proceso de apoyo a las certificaciones 150 correspondieron a BPA y 50 a Global GAP. Es necesario acotar que, durante el proceso de apoyo a la certificación, se presentaron 111 productores que desertaron, sin embargo, gracias a las estrategias del ejecutor se logró hacer el reemplazo en los tiempos requeridos.

En cuanto al objetivo No. 2 relacionado con acciones de acompañamiento en los procesos de certificación en BPA, se logró lo siguiente:

1. Se conformaron inicialmente 11 grupos de trabajo, distribuidos estratégicamente de acuerdo a su ubicación geográfica, para hacer el acompañamiento a través de talleres de formación en las certificaciones.

2. Tal como se estableció en la metodología, el ejecutor realizó 3 jornadas de capacitación relacionada con el cumplimiento de la norma BPA y una capacitación virtual dirigida a aquellos productores que no pudieron asistir en forma virtual o que querían reforzar conceptos. En promedio en cada capacitación participaron 150 productores.



3. ANALDEX, realizó 1421 visitas de acompañamiento a productores en la implementación de BPA, de un esperado de 1200, de las cuales 1317 fueron a predios beneficiarios y 104 a predios que desertaron en algún momento del proyecto.

4. Se entregaron 150 kits de BPA, que incluían análisis de suelo completo y análisis fisicoquímico de agua cruda.

5. El proyecto pretendía que 150 productores en BPA inscribieran documentación ante el ICA, actividad que se cumplió, sin embargo, el ejecutor logró acompañar en la certificación a 92 predios y hacer auditorías internas de 109 predios. Igualmente, se logró certificar a 7 predio en la resolución ICA de Predio Exportador.

En cuanto al Objetivo No. 3 relacionado con el acompañamiento técnico en la implementación y certificación de predios en Global GAP, se logró:

1. El ejecutor realizó 50 planes de trabajo a igual número de predios, con lo que se logró el apoyo en los procesos de certificación.

2. Se realizaron tres jornadas de capacitación en requisitos de la norma y una jornada virtual a productores que por alguna razón no pudieron asistir, con la participación promedio de 60 productores por taller.

3. Se realizaron 498 visitas de acompañamiento en la implementación de Global GAP, de un esperado de 400, de las cuales 450 se hicieron a predios que completaron el proceso y 48 visitas a predios que desertaron en algún momento del proyecto.

4. Se logró entregar 50 kits de Global GAP, que incluían análisis de suelo completo, análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda y análisis fisicoquímico y microbiológico de tratada y análisis de residualidad.

5. A través de la gestión de ANALDEX, se logró vincular a 18 productores con acuerdos de proveeduría con la comercializadora Fruty Green y 20 productores vinculados con la empresa Cártama, con lo cual los productores se acogieron a los sistemas de gestión de calidad de cada una de ellas y se garantizó la compra de aguacate Hass. Así mismo se realizaron las respectivas auditorías internas. Así mismo se realizaron las auditorías externas

6. A los predios que no se acogieron a ningún sistema de gestión de calidad, el ejecutor realizó el acompañamiento en la certificación y las auditorías internas a 12 predios.

7. Finalmente se logró certificar en Global GAP opción 2 a 38 productores de una meta de 35.

En cuanto al Objetivo No. 4 relacionado con apoyar organizacional y empresarialmente a los productores, se logró:

1. Se realizó un taller Socioempresarial en 10 zonas de los 5 departamentos involucrados en el proyecto, con la participación de 139 productores.

2. Se realizó el evento denominado Frutas y Hortalizas de la granja a la mesa francesa que contó con la participación de 12 de los productores vinculados al proyecto, que mostraron la potencialidad de sus líneas productivas (aguacate Hass y lima ácida Tahití). Se logró hacer reuniones comerciales, show gastronómico.



3. A la fecha del cierre técnico del proyecto, se mostró evidencia de la venta de aguacate hass para exportación por valor de \$451.033.000 y 82.036 kilos, mediante la participación de 9 productores.

DT-AT-0013 GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO EN DEPARTAMENTOS Y LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO, CONTROL Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO FITOSANITARIO DEL COMPLEJO HLB DE LOS CÍTRICOS/DIAPHORINA CITRI, FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE R4T EN PLÁTANO Y MOSCAS DE LA FRUTA EN MANGO Y DURAZNO.

Fecha de inicio: 01/08/2023

Fecha de Terminación: 31/03/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N.A.

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$6.831.971.573
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$6.831.971.573
- ✓ Vigencia 2023: \$5.191.951.707
- ✓ Vigencia 2024: \$ 1.640.019.866
- ✓ Recursos Contrapartida: \$0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El ejecutor presentó una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondientes al 98,42%. discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$5.177.893.103=Mcte. correspondiente al 75,78%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$1.547.380.620=Mcte. correspondiente al 22,64%.

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos generales: impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, transportes, fletes y acarreos, comunicaciones y transportes, arriendo, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto fue ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presento una ejecución financiera global final por valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondientes al 98,4%.

El área de seguimiento y control, valido una ejecución financiera final de los recursos del FNFH el valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondiente al 98,4%.

Zonas de Intervención: Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.



Líneas Productivas: cítricos, durazno, mango y plátano.

No de beneficiarios: 4400 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto cumplió lo programado técnicamente presentando una ejecución técnica del 100% de un 100% esperado.

Logros relevantes en el proyecto:

Componente Certificaciones.

Se evidenció que, a 447 productores en 15 departamentos, se les realizó socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente HLB, a 1.835 productores inscritos se les realizó 10.507 visitas de acompañamiento y prevención, se entregaron 3.584 dosis de Coadyuvante Nu film y 3.584 de Insecticida Safermix WP, se entregaron 199.402 sobres de predadores, se aplicaron insecticida biológico en 2.260 ha, en un total de 584 plantas y se realizaron 60 talleres sobre manejo de D. Citri y HLB de los cítricos a 1.459 productores.

Componente Mosca.

Se verificó que, a 313 productores en 5 departamentos, se les realizó socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente Mosca, a 1.102 productores inscritos se les realizó 13.364 visitas de monitoreo para el Manejo Integrado mosca de la fruta, se realizaron 22 talleres y la entrega de 1.100 kits.

Componente Fusarium.


Se evidenció que, a 414 productores en 13 departamentos, se les realizó la socialización sobre el proyecto y el origen de los recursos componente Fusarium, igualmente se evidencia que a 1505 productores inscritos se les realizó 8.996 visitas de acompañamiento y prevención, se realizaron 50 talleres sobre contención y prevención de Fusarium oxysporum f.sp. cúbense Raza 4 Tropical FocR4T a 1.187 productores.

DT-AT-0014 APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS CUARENTENARIAS, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Fecha de inicio: 01/11/2023

Fecha de Terminación: 30/11/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFrucOL



Entidades contrapartes: COMFENALCO Antioquia, Aliados (Copiurrao y núcleos productivos).

Inversión:

- ✓ Monto del Proyecto: \$1.018.099.991
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$882.799.991
- ✓ Vigencia 2023: \$199.652.496
- ✓ Vigencia 2024: \$ 683.323.495
- ✓ Recursos Contrapartida: \$135.300.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por valor de \$882.799.991=Mcte. correspondiente al 100% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$199.652.496=Mcte. correspondiente al 23%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$683.147.495=Mcte. correspondiente al 77%.

Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios y gastos generales: materiales y suministros de papelería, impresos y publicaciones, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL El ejecutor presenta una ejecución financiera global FINAL de \$1.003.587.171=Mcte., correspondientes al 99%, distribuidos de la siguiente manera: el ejecutor presenta una ejecución financiera de los recursos del FNFH por valor de \$870.270.681=Mcte., correspondientes al 99% y una ejecución acumulada de los recursos de contrapartida por valor de \$133.316.490=Mcte., correspondientes al 99%.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global FINAL de \$1.003.587.171=Mcte., correspondiente al 99%, distribuidos de la siguiente manera: de los recursos del FNFH la validación financiera es de \$870.270.681=Mcte., correspondiente al 99% y la validación de los recursos de contrapartida por valor de \$133.316.490=Mcte., correspondientes al 99%. El proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: Antioquia: Municipios de Urrao, Betulia, Montebello, Betania y Salgar.

Líneas Productivas: aguacate.

No de beneficiarios: se atenderán aproximadamente 947 predios distribuidos en 44 núcleos productivos. La cantidad final de productores dependerá del resultado de las caracterizaciones realizadas.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%


Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presenta una ejecución técnica de 100.00 % de un 100.00 % esperado, cumpliendo con lo programado.

Se han realizado las siguientes actividades con corte al mes de diciembre:





- Se tienen 8 soportes de listados con capacitaciones al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto uniformando criterios conocimiento del proyecto.
- Se ha realizado 10 socializaciones del proyecto en 5 municipios atendidos con beneficios del proyecto, las fuentes de cofinanciación y los resultados esperados al terminar el proyecto.
- Se realizó 1 capacitación en sistemas de información geográfica enfocado en localización sobre cartografía digital.
- Se impartieron 4 capacitaciones en temas especializados.
- Se recibieron 17 capas catastrales solicitadas a ICA.
- Se tienen 1296 productores inscritos en 9230 ha.
- Se realizaron 4513 visitas de monitoreo en 9 municipios atendidos y 74 núcleos.
- Se realizaron 6 capacitaciones en plagas cuarentenarias a 200 productores.
- Se hicieron 300 visitas de AT.
- Se elaboró 1 plan de comunicaciones.

Logros relevantes:

- En la zona de intervención del proyecto se encuentran inscritos 1296 productores en 9.230 ha con los que se inició la implementación de acciones de monitoreo y control de plagas cuarentenarias que limitan su acceso al mercado de Estados Unidos.
- Al corte del informe se evidencia 4513 visitas de monitoreo en plataforma sigeca, a 1296 predios determinando la presencia o no de plagas cuarentenarias para así poder tener una zona buffer libre, al llegar al predio se comparte con los productores información de identificación de las plagas de interés, afectación en el desarrollo del cultivo y manejo fitosanitario.
- Se utiliza una aplicación que contiene las capas catastrales de los municipios permitiendo verificar las veredas versus la aplicación catastral.

DT-AT-0015 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO FITOSANITARIO EN PLAGAS, LÍNEAS PRODUCTIVAS Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS

Fecha de inicio: 15/04/2024

Fecha de terminación: 15/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: FNFH


Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 4.889.820.520
- Recursos Aporte FNFH: \$ 4.889.820.520
- Recursos contrapartida: \$ 0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal del FNFH por valor de \$4.791.694.191=Mcte.



correspondiente al 98%, correspondiente a la vigencia 2024.

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos generales: impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, transportes, fletes y acarreos, comunicaciones y transportes, arriendo, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de \$4.791.694.191=Mcte., correspondientes al 98%.

El área de seguimiento y control, valida una ejecución financiera global final por valor de \$4.791.694.191=Mcte. correspondiente al 98% de los recursos del FNFH, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Líneas Productivas: cítricos, durazno, mango y plátano.

No de beneficiarios: 2.300 productores.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%


Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presenta una ejecución técnica del 100.00% de un 100.00 % esperado, con el siguiente resultado de cumplimiento por componente y actividad:

COMPONENTE HLB

- 101 contratos de 93 programados
- 2 de 1 capacitación a personal HLB
- 8 de 6 socializaciones a productores
- 978 de 960 inscripciones de productores
- 5.780 visitas de 4.800 visitas de monitoreo
- 960 entregas de 960 de bioinsumos
- 141.650 entregas predadores de 141.600
- 2.413ha de 1.913 ha con aplicación insecticida biológico
- 10 de 10 días de campo
- 960 de 960 actas de entregas de material publicitario
- 1.012 de 980 identificación nuevos productores



COMPONENTE MOSCA

- 2 de 1 capacitación a personal Mosca
- de 4 socializaciones a productores
- 500 de 500 inscripciones de productores
- 500 de 500 de kit entregados
- 6 de 6 días de campo
- 5.998 de 5.000 visitas de monitoreo.
- 500 de 500 actas de entrega de calendarios y guías
- 661 de 625 identificación nuevos productores

COMPONENTE FUSARIUM

- 1 de 1 capacitación a personal Fusarium
- 8 de 6 socializaciones a productores
- 840 de 840 inscripciones de productores
- 10 de 10 días de campo
- 840 de 840 kits entregados
- 5.041 visitas de 4.480 visitas de monitoreo
- 843 de 840 actas de entrega guía y cuadernillo
- 722 de 700 identificación de nuevos productores

Logros relevantes:

Componente HLB

Se evidencia que, a 263 productores en 8 departamentos, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente HLB, a 978 productores inscritos se les ha realizado 5.765 visitas de acompañamiento y prevención, se ha aplicado insecticida biológico en 2.413 ha, en un total de 592.852 árboles y 646 productores han asistido a 10 días de campo.

Componente Mosca

Se evidencia que, a 197 productores en 5 departamentos, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente Mosca, igualmente se han inscritos 500 productores, con un registro de 5.998 visitas de monitoreo, se han entregado 500 kit de monitoreo, se han identificado 6661 nuevos productores y 275 productores han asistido a 6 días de campo.



Componente Fusarium

Se evidencia que 207 productores en 8 departamentos, se les ha realizado socialización sobre el proyecto y el origen de los recursos componente Fusarium, igualmente se evidencia que a 840 productores inscritos se les ha realizado 5.041 visitas de acompañamiento y prevención, se han identificado 702 nuevos productores y 484 productores han asistido a 10 días de campo.

DT-AT-0016 FORTALECIMIENTO FITOSANITARIO Y PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE MANGO Y CÍTRICOS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fecha de inicio: 30/10/2024

Fecha de terminación: 29/04/2025

Entidad ejecutora: ASOHOFrucOL

Entidades contrapartes: FNFH - Secretaría de Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 175 del 14/08/2023:

- Monto del proyecto: \$ 752.413.876
- Recursos Aporte FNFH: \$302.374.767
- Recursos FNFH vigencia 2024: \$137.682.383
- Recursos contrapartida: \$450.039.109

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:


El proyecto se encuentra cumpliendo, con corte a diciembre alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor \$136.336.131=Mcte. correspondiente al 45%.

Dichos recursos están representados en servicios de personal honorarios, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes "correos", capacitación, viáticos y gastos de viaje, gastos de laboratorio.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFrucOL, con corte a diciembre con corte a diciembre, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$581.583.445=Mcte; correspondiente al 77% del valor total del proyecto, distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera por valor de \$136.336.131= Mcte; correspondientes al 45% del valor aprobado del proyecto y presento una ejecución de los recursos de contrapartida por valor de \$445.247.314= Mcte; correspondiente al 99%.

Con corte a diciembre el proyecto alcanza una validación financiera global por parte del área de seguimiento y control de \$494.797.363= Mcte; correspondiente al 65.8%, distribuidos de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el valor de \$135.736.131 =Mcte; correspondiente al 44.9%, y de los recursos de contrapartida el valor de \$359.061.232=Mcte; correspondiente al 80%.

Zonas de Intervención: Departamento de Cundinamarca: Anapoima, Apulo, Tocaima y Viotá en el caso de cítricos y Anapoima, Tocaima y La Mesa para mango.



Líneas Productivas: mango y cítricos.

No de beneficiarios: 350 productores. Mango (150 productores) y cítricos (200 productores).

Porcentaje de ejecución técnica programado: 53.50%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 55.58%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

Componente Mango Mosca

1 de 1 capacitación del equipo técnico

3 de 3 socializaciones con 109 productores en la línea de mango

150 de 150 productores inscritos en la línea de mango en 3 municipio

150 de 150 actas de entrega insumos de monitoreo y control.

449 de 330 de 150 visitas de instalación.

1 documento propuesta de comunicaciones.

Componente Cítricos

4 de 4 socializaciones con 144 productores en la línea de cítricos

200 de 200 productores inscritos en la línea de cítricos en 4 municipios

94 de 100 muestras de laboratorio

300 de 300 visitas de asistencia técnica en la línea de cítricos

4 de 4 talleres manejo del cultivo.

1 documento propuesta de comunicaciones


Logros relevantes.

Componente Mango

Se evidencia que a 263 productores y partes interesadas en 3 municipios, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente HLB, a 150 productores inscritos se les ha realizado 449 visitas de acompañamiento y prevención, se han entregado 150 kit para control y monitoreo mosca de la fruta.

Componente Cítricos

Se evidencia que a 144 productores y partes interesadas en 4 municipios, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos



componente Mosca, igualmente se han inscrito 200 productores, a los cuales se les ha realizado 300 visitas de monitoreo. 111 productores han asistido a talleres en temas relacionados con el manejo técnico del cultivo de cítricos.

PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

MC-CAD-0001 APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE 3 - 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR).

Fecha de inicio: 03/01/2023

Fecha de terminación: 30/06/2024

Fecha de terminación Prorroga: 30/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N/A

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 168 del 09/12/2022:

- Monto del proyecto: \$ 1.178.250.000
- Recursos Aporte FNFH: \$ 1.178.250.000
- Recursos Vigencia 2023: \$ 530.150.000
- Recursos contrapartida: \$ 0


Adición según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2022:

- Monto del proyecto: \$ 1.295.750.000
- Recursos Aporte FNFH: \$ 1.295.750.000
- Recursos Vigencia 2023: \$ 365.150.000
- Recursos vigencia 2024: \$ 933.873.515
- Recursos contrapartida: \$ 0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presenta una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$1.295.030.401=Mcte. correspondiente al 99,94% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$361.186.624=Mcte. correspondiente al 27,8%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE 933.843.777=Mcte. correspondiente al 72,07%.



Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios, gastos generales: viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, capacitaciones y materiales y suministros y del programa de mercadeo y comercialización; canal de acopio y distribución: alianzas productivas a través de contratos de cofinanciación.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de \$1.295.030.401=Mcte., correspondientes al 99,94% del valor ajustado del proyecto.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de \$1.295.030.401=Mcte. correspondiente al 99,94% de los recursos del FNFH, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca y otros a priorizar dependiendo de la demanda de los productores.

Líneas Productivas: potenciales renglones productivos a atender: Aguacate, Aji, Cebolla, Cítricos, Guanábana, Guayaba, Gulupa, Hortalizas, Limón, Lulo, Mango, Maracuyá, Mora, Plátano y Uchuva.

No de beneficiarios: potencialmente se atenderán 1324 beneficiarios.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

Proyecto cumplió técnicamente lo programado. Con corte al mes de diciembre se han desarrollado las siguientes actividades:

- Consolidación de la base de datos de los proyectos de alianzas. Actividad ejecutada al 100% con una base de datos de beneficiarios. 35 alianzas. y 1324 productores beneficiarios.
- Elaborar y socializar documento de Lineamientos que defina la operatividad de los recursos del FNFH con las organizaciones beneficiarias.
- Elaborar documento Lineamientos. Cumplimiento del 100% Se reporta por el ejecutor PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III.
- Realizar reuniones de socialización con las coordinaciones departamentales del PNFH, organizaciones beneficiarias y otras entidades involucradas. Al mes de mayo se programó 100% de ejecución. El avance logrado al mes de abril fue 100%. En total 59 soportes de reunión validados. 5 reuniones de socialización con otras entidades y 54 con organizaciones.
- Recepción, gestión y trámite de la documentación requerida para elaborar los contratos de cofinanciación. El avance logrado es del 100% con 35 gestiones de 35 programadas.
- Elaboración de la ficha PP-FT-017 (o la que se diseñe para este fin) para cada uno de los proyectos derivados. El avance logrado es del 100% con 35 fichas de 35 programadas.
- Elaboración de contratos de cofinanciación. El avance logrado es del 100% de un 100% programado con 35 contratos de 35 programadas, más una adición presupuestal al proyecto de alianza AL177.
- Acompañamiento a la ejecución de los proyectos. para el periodo se reporta una ejecución del 100% con 35 organizaciones a las que se les ha realizado apoyo en la ejecución de 22 programadas.
- Capacitaciones en "Todo sobre las ESAL" y Recaudo de la cuota de fomento parafiscal. Actividad ejecutada. Se reporta una ejecución del 100%. con Veintinueve (29) talleres ESAL ejecutados.
- Capacitaciones de técnicas complementarias que fortalezcan el componente técnico de las Alianzas. Actividad ejecutada. Se reporta cumplimiento del 100% con 29 talleres realizados de 26 programados.



El proyecto presenta los siguientes logros:

- Se consolidó una base de datos de una programada de las alianzas a ejecutar con 35 organizaciones beneficiarias y 1324 productores a nivel nacional de una programada.
- Se generó el Protocolo de operatividad de las alianzas productivas para la fase 2023 donde se propone el plan de ejecución del proyecto para los 35 proyectos de alianzas de acuerdo con la base de datos inicial de uno programado.
- Se realizaron sesenta (60) reuniones de socialización de lineamientos de 34 programadas para definir la operatividad de los recursos del FNFH con las organizaciones beneficiarias, las coordinaciones departamentales del PNFH y otras entidades involucradas (MADR).
- Se ejecutaron treinta y cinco (35) de 35 proyectos de alianzas productivas así: en el municipio de la Belleza Santander (organización Morabel y Organización PASIBELL) productores de mora y gulupa respectivamente; 1 Mora, La Unión Antioquia y 1 plátano, Necoclí, Antioquia. (5) en Bolívar: San Jacinto, El Carmen, San Juan Nepomuceno, Santa rosa de lima y Villanueva Bolívar. 1 combita Boyacá, 1 Filadelfia Caldas, 1 Risaralda Caldas, 1 supia caldas, 1 Girón Santander, 1 en Rionegro Santander, 1 en Villanueva Casanare, 3 en Cundinamarca (pasca y san bernardo, Sylvania y Caparrapí), 2 en Huila (Garzón y Guadalupe). Plátano Villarrica Cauca AL 170, Mora Sotará Cauca AL173, Cebolla Corregimiento de Buesaquillo, Pasto, Nariño AL172 Aguacate Planadas Tolima AL171. Plátano Sevilla Valle AL174, Mora Labateca Norte de Santander AL175, San Gil Hortalizas (tomate) AL176, 29. Aguacate Ancuya Nariño. AL177, 30. Alianza Plátano Santa Rosa de cabal Risaralda. (AL181) 31. Uchuva Sibundoy Putumayo. (AL179) 32. Plátano Génova y Pijao Quindío. (AL180), 33. Alianza Pitahaya Surata Santander (AL178) Caloto Cauca AL182. Patía Cauca AL183.
- Se realizaron actividades de acompañamiento a la ejecución de los proyectos a treinta y cinco (35) organizaciones de 21 programadas mediante visitas presenciales, gestión de cotizaciones de insumos, elaboración de informes técnicos y financieros y la participación en reuniones en CDA.
- Se ejecutaron veintinueve (29) de 26 talleres ESAL para el mismo número de organizaciones.
- Se ejecutaron veintinueve (29) de 26 talleres AT con el mismo número de organizaciones.

MC-AE-0002 PROMOCIÓN DE LA UCHUVA Y LA GULUPA COLOMBIANA EN EL MERCADO ALEMÁN

Fecha de inicio: SIN INICIAR

Fecha de terminación: N.A.

Entidad ejecutora: ProColombia Fideicomiso Sociedad Fiduciaria Fiducoldex.

Entidades contrapartes: FNFH, RECURSO AVANCE PASIFLORAS, PROCOLOMBIA

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 420.000.000
- Recursos Aporte FNFH: \$ 220.000.000
- Recursos contrapartida: \$ 200.000.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

La Junta Directiva del FNFH, en su reunión No.177, del 17 de diciembre de 2024, autorizó realizar un ajuste de reducción en el presupuesto de gastos aprobado para el año 2024, por valor de \$110.000.000 (ciento diez millones de pesos) correspondientes al valor apropiado para el 2024 del proyecto MC-AE-0002, denominado "Promoción de la uchuva y la gulupa en el mercado Alemán." el cual fue aprobado mediante acuerdo presupuestal No. 026-023 del 13 de diciembre de 2023, por valor de \$220.000.000 y que en el acuerdo 012-024 aprobado en la junta 175 del 14 de agosto del 2024, que definió que la entidad ejecutora es ProColombia, debido a que el proyecto no será ejecutado, por tal razón se procederá





con la devolución total de los recursos asignados.

En este sentido, se solicita la desasignación del aporte del Fondo para el proyecto 'Promoción de la uchuva y la gulupa colombiana en el mercado alemán', el cual se pretendía ejecutar con la cooperación de AVANCE PASIFLORAS y PROCOLOMBIA ya que, por directriz de la Junta Directiva del FNFH en la sesión No. 176 del 18 de octubre de 2024, ya que se estableció como fecha límite para la formalización del convenio entre las partes el 31 de octubre del presente año y dicha fecha no fue cumplida; al respecto, la disposición tomada es de carácter vinculante para el ente administrador del FNFH. Cabe resaltar que en la Junta No.175 del 14 de agosto de 2024, se presentó reducción para el año 2024 por valor de \$110.000.000 (ciento diez millones de pesos), quedando disponible los \$220.000.000 para futuras inversiones y gastos.

Zonas de Intervención: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo.

Líneas Productivas: uchuva y gulupa.

No de beneficiarios: 1264.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 0%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 0%


Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

Proyecto aprobado en la Junta No. 173 del FNFH del 13 de diciembre de 2023. El proceso de firma del convenio de cofinanciación entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex), la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) y la Corporación de Exportadores de Pasifloras (Avance Pasifloras) aún no se ha concretado. Esto se debe a que, según la comunicación enviada por Procolombia el 23 de septiembre de 2024, la reciente directriz del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo requiere la aprobación de dicho ministerio antes de que Procolombia pueda proceder con la firma.

Es importante señalar que el 1 de octubre, Asohofrucol se dirigió a Procolombia para enfatizar la necesidad de firmar el convenio en octubre de 2024, argumentando que la ejecución del proyecto no sería viable en un horizonte temporal distinto al proyectado en la pasada Junta del Fondo, donde se estipuló que el proyecto debería iniciar en noviembre. Esto permitiría que la campaña de promoción del consumo de la uchuva y la gulupa coincidiera con los meses de verano en Alemania. Procolombia reiteró su compromiso de firmar el convenio en octubre, tal como se indicó en un correo enviado ese mismo día. Cabe mencionar que, en cumplimiento de la directriz del Ministerio de Agricultura de programar una reunión con el equipo de Procolombia para analizar la posibilidad de acelerar la firma del convenio, efectivamente se llevó a cabo una reunión el 4 de septiembre, con la presencia de la secretaria nacional de la cadena de cítricos, aguacate y mango del MADR. En dicha reunión, se evidenció la necesidad de programar otra entre los equipos jurídicos y técnicos de ambas entidades para abordar y aclarar las dudas pendientes sobre la minuta y la ficha del proyecto. Sin embargo, esta reunión, que estaba programada para el 17 de septiembre, no pudo realizarse, ya que Procolombia argumentó que su equipo jurídico debía atender una visita de la Procuraduría en ese momento.

No obstante, según la información proporcionada por Procolombia a través de Óscar Bolaños el 7 de octubre (por WhatsApp), y siguiendo la directriz del mismo Ministerio de Comercio, el equipo jurídico de Procolombia-Fiducoldex se encuentra en proceso de revisión de la última minuta enviada por Asohofrucol mientras se espera el visto bueno de este ministerio sobre la firma del convenio entre las partes. Cabe señalar, que ésta minuta incluye las respuestas por parte del Administrador del FNFH, a las últimas observaciones realizadas por Procolombia-Fiducoldex.

Teniendo en cuenta el Plan de trabajo presentado para la Junta del mes de agosto, el convenio debía firmarse a más tardar el 15 de octubre del presente año, para dar inicio al proyecto el 1 de noviembre y poder cumplir el cronograma y plan de trabajo planteado para la ejecución del mismo. Las fechas no se cumplieron por lo tanto no se firmó el convenio, no inicio el proyecto y se realizó la devolución del recurso en la junta del FNFH del mes de diciembre de 2024.



Cabe señalar que entre los requerimientos solicitados a Procolombia, en el marco de las reuniones están:

No se acepta la expresión relacionada con el aparte de aplicación para PROCOLOMBIA en relación a que las obligaciones son de medio y no de resultado por factores externos, por lo siguiente:

- El convenio tiene establecido el alcance con objetivos determinados, así como unos entregables, los cuales materializan el cumplimiento del aliado ejecutor.
- En obligaciones conjuntas, se establece que las partes gestionan, analizan y responden requerimientos. Asimismo, las obligaciones específicas del aliado que ejecuta establecen claramente las actividades y entregables.
- Se entraría en un debate doctrinal sobre la distribución del riesgo.
- Se prevé la figura de caso fortuito o fuerza mayor, prevista en la cláusula 17 y 18, donde se podría argumentar situaciones externas.
- Se prevé la cláusula de controversias contractuales, que origina el espacio idóneo para analizar cada situación externa que ponga en riesgo la ejecución del convenio.
- Podría afectar la aplicación de la cláusula de garantías y cláusula compromisoria.

ASOHOFRUCOL se reserva el derecho a solicitar avances de informes técnicos o financieros del proyecto, así como de realizar visitas y/o verificaciones, cuando así se requiera, evento en el que PROCOLOMBIA deberá suministrar la información que le sea solicitada.

“Este punto aplica para todos los proyectos ejecutados con recursos FNFH, no solo se pueden realizar visitas por parte del área de seguimiento y control como supervisor, sino que también por parte del MADR, Auditoría Interna y Contraloría General de la República y cualquier ente de control”. La visita se realiza directamente a PROCOLOMBIA como ejecutor.

Pólizas:


- Amparo de buen manejo del anticipo: El primer desembolso debe ser en calidad de anticipo, para facilitar la ejecución del proyecto. La figura del amparo no desnaturaliza el convenio. También es la figura que permita disponer de los recursos para dar inicio a los costos iniciales que se requieran y poder ejecutar sin contratiempos.

La aplicación del concepto de “pago anticipado” se considera contradictorio, ya que en los convenios se estipulan aportes y no el concepto de pagos.

- Amparo de responsabilidad civil extracontractual es procedente, por el riesgo en actividades de socialización donde participan terceros en escenarios a determinar. Si bien el plan de medios es el mecanismo importante en el convenio, se contemplan otras actividades como la mencionada.

Propiedad intelectual. Los derechos patrimoniales generados en el convenio serán en proporción a los aportes de cada aliado. Se considera que el aliado ejecutor en su autonomía contractual podrá hacer uso de este alcance para delimitar derechos de propiedad intelectual.

5. Cláusula penal compromisoria. La política interna prevé esta cláusula para salvaguardar los recursos públicos ante incumplimientos; asimismo, es un requerimiento de la Auditoría Interna del FNFH (figura de índole legal, arts. 2.10.1.1.1 Decreto 1071 de 2015)). Se solicita aceptar la disposición.



MC-AE-0003 APOYO PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA IN SITU DE LA GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS CHINA (GACC), DENTRO DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD FITOSANITARIA DE FRUTOS FRESCOS DE LIMA ÁCIDA TAHITÍ COLOMBIANA CON DESTINO A LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.

Fecha de inicio: 01/10/2024

Fecha de terminación: 31/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N/A

Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 175 del 14/08/2024:

- Monto del proyecto: \$ 50.773.521
- Recursos Aporte FNFH: \$ 50.773.521
- Recursos contrapartida: \$ 0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

El proyecto se encuentra cumpliendo, con corte a diciembre alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor \$50.533.778 =Mcte., correspondientes al 99,5%. Dichos recursos están representados en servicios de personal honorarios, viáticos y gastos de viaje y otros servicios.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de \$ 50.533.778 =Mcte., correspondientes al 99,5% del valor del proyecto.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de \$50.533.778 =Mcte. correspondiente al 99,5% de los recursos del FNFH, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: Valle del Cauca, municipios de Zarzal y Cartago.

Líneas Productivas: lima acida Tahiti.

No de beneficiarios: N/A

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:

Se pudo evidenciar una agenda la logística para la realización de la visita de campo, esta agenda fue preparada por Asohofrucol y aprobada por el ICA.

En cuanto al desarrollo del evento se reporta la visita de dos expertos de la Administración General de Aduanas de la República Popular de



China, funcionarios del ICA y Asohofrucol quienes realizaron visita a tres centros de empaque: la empacadora Packing Parnaso SAS (Anserma, Caldas, a la empacadora Arcángel Miguel International SAS (La Tebaida, Quindío) y a la empacadora Frutales Las Lajas S.A Valle del Cauca.

También visita a tres predios así: Finca El Limonar, finca Bambusa y finca La Camelia (Quimbaya, Quindío) y finca La camelia (Alcalá, Valle del Cauca).

Como conclusión del evento el ICA entregó un informe que describe el desarrollo del evento y las conclusiones generales.

El proyecto presenta los siguientes logros:

- Una agenda del evento aprobada por el ICA
- Tres actas de visita de campo
- Evidencia fotográfica del evento
- Informe del evento
- Informe de Resultados emitido por el ICA
- Anexos del evento en campo
- Actas de apertura y cierre del evento

PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AE-ADI-0008 CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DIAGNÓSTICO DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - PNFH

Fecha de inicio: SIN INICIAR

Fecha de terminación: N.A.

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL-DANE

Entidades contrapartes: FNFH, DANE


Inversión:

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 212.085.820
- Recursos Aporte FNFH: \$ 177.124.012
- Recursos contrapartida: \$ 34.961.808

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

La Junta Directiva en la sesión N°176 del 18/10/2024 según el acuerdo 015-024, aprobó la reducción y devolución del recurso del FNFH,



de acuerdo al oficio radicado por el DANE N°20242570188111 del 3 de septiembre de 2024, donde informa que como autoridad estadística en Colombia, tiene unos retos importantes asociados al Censo Económico, el desarrollo del Sistema de Información Wayúu, la producción estadística tradicional, entre otras actividades, las cuales requieren disponer de toda la capacidad técnica de la entidad a su servicio, por tal razón, no cuenta con la disponibilidad para atender las actividades de la propuesta técnica del FNFH y notifica que para la vigencia restante del año 2024 y la venidera de 2025 no es posible que el DANE asuma los compromisos derivados del convenio propuesto.

En este contexto, es imposible ejecutar el proyecto “Contribución a la implementación del plan de fortalecimiento del registro administrativo” diagnóstico de productores atendidos en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola -PNFH”, por tal razón se realiza una reducción de \$177.124.012, acreditando la reserva para futuros gastos de funcionamiento e inversión.

Zonas de Intervención: el proyecto tendrá cobertura en los departamentos y municipios priorizados en los proyectos objeto de cofinanciación con los recursos del FNFH de acuerdo con el recaudo de la contribución parafiscal y las perspectivas de fomento y desarrollo de la hortifruticultura a nivel nacional.

Líneas Productivas: frutas y hortalizas.

No de beneficiarios: N/A.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 0%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 0%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

Proyecto aprobado en la Junta No. 173 del FNFH del 13 de diciembre de 2023, se hará solicitud a la junta del FNFH del mes de octubre, para dar devolución del recurso. El DANE en su oficio No. 20242570188111 del 3 de septiembre de 2024 informa que como autoridad estadística en Colombia, tiene unos retos importantes asociados al Censo Económico, el desarrollo del Sistema de Información Wayúu, la producción estadística tradicional, entre otras actividades, las cuales requieren disponer de toda la capacidad técnica de la entidad a su servicio, por tal razón, no cuenta con la disponibilidad para atender las actividades de la propuesta técnica del FNFH y notifica que para la vigencia restante del año 2024 y la venidera de 2025 no es posible que el DANE asuma los compromisos derivados del convenio propuesto.

En este contexto, es imposible ejecutar el proyecto “Contribución a la implementación del plan de fortalecimiento del registro administrativo diagnóstico de productores atendidos en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola -PNFH”, por tal razón se realiza una reducción de \$177.124.012 y se reintegran dichos recursos al FNFH.

AE-ADI-0009. ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2024

Fecha de inicio: 01/01/2024

Fecha de terminación: 31/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL

Entidades contrapartes: N/A





Inversión:

Inversión inicial según Acta Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 1.227.390.207
- Recursos Aporte FNFH: \$ 1.227.390.207
- Recursos contrapartida: \$ 0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 1.228.482.537
- Recursos Aporte FNFH: \$ 1.228.482.537
- Recursos contrapartida: \$ 0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El proyecto presenta una inversión presupuestal final del FNFH por valor \$1.196.368.276=Mcte., correspondientes al 97,4%

Dichos recursos están presentados en servicios personales: sueldos, prestaciones sociales, parafiscales y honorarios y gastos generales; equipo de comunicación y computación, materiales y suministros de papelería, comunicaciones y transporte "correos", viáticos y gastos de viaje, propiedad planta y equipo, software y licencias, otros servicios.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFrucol, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de \$1.196.368.276=Mcte., correspondientes al 97,4% del valor ajustado del proyecto.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de \$1.196.368.276=Mcte. correspondiente al 97,4% de los recursos del FNFH, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: nacional.

Líneas Productivas: todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

No de beneficiarios: productores atendidos con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.


Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%


Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

El Área de seguimiento y control a través de su equipo ha desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento del objetivo de proyecto:

- Seguimiento y validación técnica, financiera y jurídica documental a los 22 proyectos para la vigencia 2024 (2 proyectos no iniciados), con realización de verificaciones documentales mensuales, evaluación trimestral para establecer el porcentaje de cumplimiento basado en las metas de cada uno de los proyectos; realización de informes de gestión, visitas de campo, reuniones iniciales y de más actividades propias del seguimiento.
- Se realizó la distribución técnica y financiera de 12 proyectos de inversión del FNFH aprobados para la vigencia 2024 para intervención en el seguimiento, control y evaluación.
- 1 reunión de socialización del estado de los proyectos con la Auditoría Interna del FNFH.



- Se han realizado las siguientes acciones y gestiones de seguimiento y control a los proyectos de inversión del FNFH:
 - ✓ 12 planes de Seguimiento y Control para 12 proyectos iniciados durante la vigencia 2024.
 - ✓ 12 metodologías o instructivos de seguimiento para 12 proyectos iniciados durante la vigencia 2024.
 - ✓ 12 visitas iniciales técnicas y financieras.
 - ✓ 548 visitas Técnicas (inicial, campo, documentales y de cierre).
 - ✓ 391 revisiones documentales y plataforma técnicas.
 - ✓ 391 reportes a través de las matrices de syc técnico.
 - ✓ 118 informes técnicos (Trimestrales, de campo y Resultados técnico final).
 - ✓ 143 visitas de campo, con 188 verificaciones de actividades propias de los proyectos a 1191 productores.
 - ✓ 12 reuniones de planeación equipo técnico.
 - ✓ 126 comités internos y/o reuniones
 - ✓ 399 verificaciones documentales y plataforma financieras.
 - ✓ 8 visitas de campo financiera a 192 productores.
 - ✓ 399 verificaciones documentales y plataforma financieras.
 - ✓ 125 reportes y/o informes de seguimiento y control financiero.
 - ✓ 76 trámites de desembolso.
 - ✓ 80 legalizaciones de recursos.
 - ✓ 12 reuniones de planeación equipo financiero.
 - ✓ 53 informes de resultados financieros finales.
- Se elaboraron y entregaron los siguientes informes de gestión consolidado de la inversión del FNFH:
 - ✓ 1 informe narrativo consolidado inversión FNFH 2023.
 - ✓ 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH año 2023.
 - ✓ 1 informe narrativo consolidado inversión del FNFH 1er trimestre año 2024 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024.
 - ✓ 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024.
 - ✓ 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre año 2024, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024.
 - ✓ Informe de Estado de los Proyectos técnico y presupuestal según resolución 00532 de 2023 de MADR del 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024 año 2024
 - ✓ 1 informe narrativo consolidado inversión del FNFH 2do trimestre año 2024.
 - ✓ 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024 año 2024.
 - ✓ 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024 año 2024.
 - ✓ Informe de Estado de los Proyectos técnico y presupuestal según resolución 00532 de 2023 de MADR del 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre y 4to trimestre año 2024 año 2024.



- ✓ Diligenciamiento y envío de Matriz de control de ejecución técnica y financiera de proyectos al MADR.
- ✓ Diligenciamiento y envío mensual (12) de Matriz de seguimiento al contrato de Administración año 2024 de proyectos al MADR.

Todas estas acciones como parte del seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión del FNFH, para el acopio y generación de información del subsector en las inversiones de proyectos hortifrutícolas.

Para evidenciar la información detallada del cumplimiento técnico y financiero con corte a 31 de diciembre de 2024, esta se presenta en el Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

AE-ADI-0010 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH

Fecha de inicio: 15/01/2024

Fecha de Terminación: 14/01/2025

Entidad ejecutora: PLANUPSOF y Systems Factory LTDA.

Inversión:


- ✓ Monto del Proyecto: \$1.080.000.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.080.000.000
- ✓ Vigencia 2023: 1.080.000.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$0

A la fecha el proyecto presenta una ejecución presupuestal global 1.079.531.000=Mcte., correspondientes al 99,96%, dichos recursos están representados en otros servicios: sistemas de información para la gestión de programas y proyectos FNFH. El proyecto es ejecutado por un tercero, a la fecha existe un contrato con PLANUPSOF S.A.S. y un contrato con SYSTEMS FACTORY LTDA.

Con corte a diciembre, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$1.079.531.000=Mcte., correspondientes al 99,96% del valor del proyecto, de la ejecución financiera relacionada anteriormente, se tiene de dos contratos realizados para la construcción de dos sistemas de información así:

- Planupsof S.A.S., según contrato AE-ADI-0010-ME1-2024, para el desarrollo de software web por valor de \$800.000.000, de los cuales con corte a diciembre se le han realizado cinco pagos, para un total de \$800.000.000.
- Systems Factory LTDA, según contrato AE-ADI-0010-ME2-2024, para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA, por valor de \$279.531.000, de los cuales con corte a diciembre se le ha realizado un (3) pago por valor de \$279.531.000.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera con corte al mes de diciembre por valor de \$971.577.900=Mcte. correspondiente al 90% del valor del proyecto.



Zonas de Intervención: nacional.

Líneas Productivas: frutas y hortalizas.

No de beneficiarios: N/A

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 98.24%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.


El proyecto se encuentra en su fase de cierre, ajustes y de revisión del informe final.

Como hitos del desarrollo de las actividades del proyecto se tienen las siguientes:

- Se elaboró un 1 documento de plan de trabajo de 1 programado.
- Se tiene un avance del 100% de un 100% programado del documento de calidad de datos.
- Se tiene elaborado el cuadro comparativo de lenguajes de programación con ponderación del 100%.
- Se construyo 1 documento avance del documento de arquitectura de 1 programado con una ponderación del 100.00%.
- Se tiene un avance del 100% de un 100% programado de la definición de los estándares de datos.
- Se tiene un avance de 100.00% de un 100.00% programado en la automatización de generación de informes y reportes.
- Se tiene un avance de 100.00% de un 100.00% programado para la configuración de alertas automáticas para hitos en los proyectos.
- Se tiene un avance de 96.29% de un 100.00% programado para el establecimiento del protocolo de seguridad.
- Se tiene un avance de 100.00% de un 100.00% programado para el documento de marco de gobierno.
- Se tiene un avance del 100.00% de un 100.00% programado para el documento de sistema centralizado de datos.
- Se tiene un avance del 100% de un 100% programado de la definición de los estándares de datos.
- Se tiene un avance del 100.00% de un 100.00% programado de Identificación de fuentes de datos internas y externas
- Se tiene un avance del 100.00% de un 100.00% programado del diseño de dashboards interactivos.

Hasta el momento se tienen parametrizados, instalados, configurados y con plan de pruebas ejecutados los siguientes módulos:

1. Módulo PQR's (radicadas vía web, email, presencial o física).
2. Módulo Comunicaciones Oficiales Recibidas vía presencial.
3. Módulo Comunicaciones Oficiales Recibidas vía mail.
4. Módulo Comunicaciones Oficiales Enviadas.
5. Parametrización del módulo Comunicaciones Internas.



6. Parametrización del módulo Control Archivo Físico y FUID (Formato Único de Inventario Documental)

7. Parametrización del módulo Digitalización Certificada.

8. Parametrización del módulo Documentos de Terceros (Historia Laboral, Contratistas, Ciudadanos, Empresas).

9. Parametrización del módulo Expediente de Documentos Electrónicos / Híbridos basados en TRD.

Logros relevantes en el proyecto.

Se tienen 3279 solicitudes acumuladas atendidas. Se han realizado 210 mesas de trabajo acumuladas de comunicación directa entre los interesados, como usuarios finales, analistas de sistemas, desarrolladores y gerentes de proyecto.

AE-ADI-0011 UNIDAD TÉCNICA DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - AÑO 2024

Fecha de inicio: 01/01/2024

Fecha de terminación: 31/12/2024

Entidad ejecutora: ASOHOFrucOL

Entidades Contrapartes: N/A

Inversión:

Inversión inicial según Acta Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 2.869.299.898
- Recursos Aporte FNFH: \$ 2.869.299.898
- Recursos contrapartida: \$ 0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 2.875.627.778
- Recursos Aporte FNFH: \$ 2.875.627.778
- Recursos contrapartida: \$ 0

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

A la fecha el ejecutor presenta una ejecución presupuestal global de \$2.729.576.430=Mcte., correspondientes al 94,9%.

Dichos recursos están representados en servicios personales: Sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, honorarios y gastos generales: equipos de comunicación y computación, suscripciones y afiliaciones, materiales, suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, seguros impuestos y gastos legales, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, sistematización software y licencias.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFrucOL, con corte diciembre, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$2.729.576.430=Mcte., correspondientes al 94,9% del valor ajustado del proyecto.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor de \$2.727.127.465=Mcte. correspondiente al 94,8% de los recursos del FNFH.



Zonas de Intervención: nacional

Líneas Productivas: todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de Fomento Hortifrutícola.

No de beneficiarios: productores atendidos de acuerdo con las necesidades y/o oportunidades identificadas.

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

Se han realizado las siguientes actividades:

- 36 de 20 proyectos formulados.
- \$ 41.635.270.268 de \$ 15.000.000 en gestión de recursos.
- 6 de 4 reuniones interinstitucionales.
- 1 de 1 alianza publico privada.
- 2 de 2 documento de Gestión de los recursos del FNFH.
- 2 de 2 boletines con el balance y comportamiento de las principales líneas exportables.
- 17 de 4 artículos técnicos en la revista FyH.
- 17 de 4 artículos de proyectos en la revista FyH.
- 681 de 240 publicaciones en redes sociales.
- 3 de 3 informes para el comité técnico del contrato de administración.
- 1 de 1 plan de capacitación a empleados.
- 13 de 10 requerimientos de las auditorías, contralorías y MADR.

Logros relevantes en el proyecto.

El equipo de formulación de la unidad técnica a gestionado 30 proyectos, de los cuales 4 están en estado aprobado y 5 en estado contratados, con gestión de \$2.917.418.898 en recursos.

Se evidencian 6 participaciones interinstitucionales con la agencia de comercialización Gobernación de Cundinamarca, MADR e ICA, se ha elaborado 2 boletines líneas exportables vigencia 2023 vigencia 2024, se ha realizado 1 capacitación a funcionarios de Asohofrucol en temas de asociatividad, exportación, logística y se realizado 489 publicaciones en redes sociales sobre noticias de Asohofrucol.

Se ha evidenciado una ejecución técnica del 76.90% y una ejecución financiera del 77% correspondiente a 21 proyectos en ejecución.


AE-ADI-0012 SEMINARIO: LA AGROECOLOGÍA Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Fecha de inicio: 09/09/2024

Fecha de terminación: 08/11/2024

Entidad ejecutora: ACIA





Entidades Contrapartes: ACIA

Inversión:

Inversión inicial según Acta Junta Directiva del FNFH No 175 del 14/08/2024:

- Monto del proyecto: \$ 88.578.043
- Recursos Aporte FNFH: \$ 67.078.043
- Recursos contrapartida: \$ 21.500.000

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

A la fecha el ejecutor presenta una ejecución presupuestal global de \$ 62.492.594=Mcte., correspondientes al 94,8%, los cuales están representados en honorarios, viáticos y gastos de viaje, entre otros, se aclara que dichos recursos fueron trasladados a la cuenta especial de ACIA.

El ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de \$83.992.594=Mcte=, correspondientes al 94,8% de los cuales el ejecutor presento una ejecución financiera de los recursos de FNFH por valor de \$62.492.594 correspondientes al 93% y el ejecutor presento una ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de \$21.500.000 correspondientes al 100%.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de \$83.992.594=Mcte=, correspondientes al 94,8% de los cuales el ejecutor presento una ejecución financiera de los recursos de FNFH por valor de \$62.492.594 correspondientes al 93% y el ejecutor presento una ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de \$21.500.000 correspondientes al 100%, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Zonas de Intervención: Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Líneas Productivas: Frutas y Hortalizas.

No de beneficiarios: 80

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00%

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 97.77%

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.

La concreción de un espacio adecuado que cumple con las condiciones para la realización del seminario.

La consolidación y elaboración de la agenda del evento para los dos días.

La socialización y difusión del evento en 4 redes sociales:

Enlaces de Perfiles:

- Twitter: https://x.com/acia_1941
- Instagram: <https://www.instagram.com/acia1941/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/acia.ingenierosagronomos>
- Página Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61566537597498>



• LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-ingenieros-agronomos-317aa932b/>

El envío de 20 correos y 20 mensajes de Whastapp con la invitación y la agenda del evento.

Logros relevantes en el proyecto.

La inscripción de 114 participantes:

- 43 ingenieros Agrónomos.
- 71 productores.

La realización de las siguientes conferencias durante el desarrollo del seminario:

- "Impacto de la agroecología en la producción de frutas y hortalizas Transición hacia sistemas hortofrutícolas alimentarios sostenibles Una apuesta de producción de frutas y hortalizas inocuas y saludables"
- "Conservación agroecológica de suelos y agua en la producción de frutas y hortalizas Nuevas tecnologías y prácticas agroecológicas familiares hortofrutícolas".
- "Construcción de la política pública de la agroecología en Colombia".
- "Normatividad vigente para el fomento y la promoción de la agroecología en Colombia". Se abordaron temas del marco legal y planes municipales, además se trataron temáticas como desafíos en la política agroecológica, alianzas sectoriales para el logro de resultados, impacto de la agroecología, beneficios de la política agroecológica.
- "Buenas prácticas agroecológicas: influencia en apertura de mercados".

Aplicación de 82 evaluaciones del seminario.

PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Al cierre a 31 de diciembre del año 2024, se encuentran pendientes de acta de cierre veinticinco (25) proyectos que hacen parte de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007 y cinco (5) que hacen parte de otros programas y son proyectos de vigencias 2013; Para un total pendiente por actas de cierre de treinta (30) proyectos.

De los proyectos ejecutados en la vigencia 2024, con corte a 31 de noviembre de 2024, se encuentran pendientes de acta de terminación catorce (14) proyectos, los cuales el área de seguimiento y Control con su Profesional de Asesoría Jurídica están en proceso de cierre y liquidación.





De los proyectos ejecutados en las vigencias 2023 y 2024 se tienen los siguientes proyectos en fase de cierre y liquidación:

Tabla No. 8 Proyectos de cierre y liquidación corte 31 de diciembre año 2024

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINACIÓN
1	DT-TR-0003	LABATECA- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS DE GRANADILLA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLAS A TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE LABAYECA, NORTE DE SANTANDER.	ASOHOFrucOL	20/05/24
2	DT-TR-0012	MISIÓN INTERNACIONAL BRASIL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTORES DE BRASIL	ASOHOFrucOL	14/08/2024
3	DT-AT014	APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS CUARENTENARIAS, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS.	ASOHOFrucOL	30/11/24
4	AE-ADI0012	SEMINARIO DE LA AGROECOLOGIA Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS	ACIA	8/11/24
5	DT-TR0009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLAS DEL VALLE DEL CAUCA	ASOHOFrucOL	31/12/24
6	DT-TR010	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2024	ASOHOFrucOL	31/12/24
7	DT-TR015	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO FITOSANITARIO EN PLAGAS, LINEAS PRODUCTIVAS Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS	ASOHOFrucOL	15/12/24
8	MC-CAD-0001	APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE 3 - 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR)	ASOHOFrucOL	31/12/24
9	MC-AE-0003	APOYO PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA IN SITU DE LA GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS CHINA (GACC), DENTRO DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD FITOSANITARIA DE FRUTOS SECOS DE LIMA ACIDA TAHITÍ COLOMBIANA CON DESTINO A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.	ASOHOFrucOL	31/12/24
10	AE-ADI0009	ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO	ASOHOFrucOL	31/12/24
11	AE-ADI-0011	UNIDAD TÉCNICA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS-2024	ASOHOFrucOL	31/12/24
12	MC-CAD-0001-CC23-2024-AL178	SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PITAHAYA CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL DE LAS MUJERES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SURATÁ Y EL PLAYÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE FRUTAS DE SOTO NORTE ASOPFRUNORT	18/10/24
13	MC-CAD-0001-CC26-2024-AL182	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE ULO, APLICANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE POSTCOSECHA DEL MUNICIPIO DE CALOTO – CAUCA	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES EMPRENDEADORAS SIGLO 21 ASOAGROME21	26/10/24
14	MC-CAD-0001-CC27-2024-AL183	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN TAHITÍ, PARA EL COMERCIO EN FRESCO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA -CAUCA	ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN DE MUJERES PUREÑAS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL IMPEDS	14/12/24
14	TOTAL, PROYECTOS PENDIENTES ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN			

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

En el IV trimestre del año 2024 se suscribieron cuatro (04) actas de terminación y/o liquidación de proyectos terminados en el cuarto trimestre del año 2024; A 31 de diciembre hay dos (2) proyecto de vigencia 2024 del tercer trimestre pendiente de cierre.

Tabla No 9 - proyectos liquidados y/o con cierre IV trimestre año 2024

No.	CODIGO PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO	FECHA DE LIQUIDACION
1	DT-TR-0013	GIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO TÉCNICO EN EL CULTIVO DEL LIMON TAHITÍ DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DEL CAQUETÁ	ASOHOFrucOL	31/12/2023	16/07/2024
2	DT-AT0011	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICO- PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE AGUACATE HASS Y LIMA ACIA TAHITÍ A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LINEAMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y CUNDINAMARCA	ASOHOFrucOL	31/01/2024	9/08/2024
3	MC-CAD-001-CC20-2024 AL 177	ALIANZA PRODUCTIVA DE LOS MUNICIPIOS CORDILLERANOS DE PIJAO Y GÉNOVA QUINDÍO, PARA EL MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVO "AMANECER EN EL SUR "	21/10/24	17/12/2024





4	MC-CAD-0001-CC23-2024-AL 179	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL VALLE DE SBUNDOY ASOASIVS	19/10/24	5/12/2024
5	MC-CAD-0001-CC24-2024-AL 180	ALIANZA PRODUCTIVA DE LOS MUNICIPIOS CORDILLERANOS DE PIJAO Y GÉNOVA QUINDÍO, PARA EL MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES RURALES DE GÉNOVA QUINDÍO, ASOTRARUGEN	18/10/24	20/12/24
6	MC-CAD-0001-CC25-2024-AL 181	SOSTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLÁTANO DE SANTA ROSA DE CABAL, ASOPLASA	23/10/24	5/12/2024

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Tabla No. 10 Estado jurídico actual de proyectos a cargo del Área de Seguimiento y Control de Proyectos

ESTADO ACTUAL	No DE PROYECTOS	OBSERVACIONES
Proyectos aprobados vigencia 2024	13	Proyectos que se encuentran en ejecución y/o pendientes de iniciar
Proyectos liquidados en el año 2024	42	Proyectos liquidados I trimestre 2024: 2 Proyectos liquidados II trimestre 2024:12 Proyectos liquidados III trimestre 2024: 22 Proyectos liquidados IV trimestre 2024: 6
Proyectos pendientes de liquidar vigencia 2024	14	Se encuentra en proceso de cierre y elaboración de acta de liquidación 14 proyectos; 1 proyecto del segundo trimestre, 1 proyecto del tercer trimestre y 12 del cuarto trimestre.
Actas de cierre elaboradas por parte del IICA	25	Los proyectos en donde el IICA y CORPOICA - AGROSAVIA fueron los Contratantes, se encuentran en elaboración de actas de cierre.
Actas de cierre elaboradas por parte de Asohofrucol	5	Proyectos que se encuentran en revisión jurídica, para realizar el respectivo cierre Administrativo según Decreto 1082/15 Art.2.2.1.1.2.4.3, en revisión y elaboración de actas de cierre.
Proyectos en proceso jurídico	6	Estos procesos se encuentran a cargo del Asesor Jurídico de ASOHOFRUCOL con apoyo de la Profesional de Seguimiento y Control Jurídico.

Fuente: Área de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH

Para evidenciar la información detallada con corte a 31 de diciembre de 2024, esta se presenta en el Anexo No 4. Matriz Situación Jurídica de los Proyectos. (M.S.J.P.).



ANEXOS

Anexo No. 1. Matriz información general de Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. (M.I.G.P)

Anexo No. 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)

Anexo No. 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a diciembre de 2024. (M.E.P.)

Anexo No. 4. Matriz situación jurídica de los proyectos a cargo del área de seguimiento y control (M.S.J.P)

Anexo No. 5 Matrices de Seguimiento y Control Técnico por proyecto (M.S.Y.C.T)

