



**Asohofrucol**

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional  
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE  
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**



**INFORME DE GESTION  
SEGUIMIENTO Y CONTROL II  
TRIMESTRE AÑO 2024  
JUNIO 2024**



**INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024  
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA  
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA-  
ASOHOFRUCOL  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
JUNIO 2024**



## CONTENIDO

<b>CONTENIDO</b> .....	<b>3</b>
<b>1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS</b> .....	<b>5</b>
1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.....	9
1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS AÑO 2024 ...	10
1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS.....	14
1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2024 .....	16
1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ENERO A JUNIO) I SEMESTRE AÑO 2024. ....	20
1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2024.....	21
<b>1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIADOS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2024 POR EL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL .....</b>	<b>23</b>
1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – INVESTIGACIÓN .....	23
DT-IV-0003. APORTE DE LAS PRÁCTICAS CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE AGUACATE EN TOLIMA Y HUILA, PASIFLORAS EN BOYACÁ Y META, TOMATE EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ .....	23
DT-TR-0003. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS DE GRANADILLA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTÍCOLAS A TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE SANTANDER. ....	26
DT-TR-0009. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS EN EL VALLE DEL CAUCA. ....	28
DT-TR0010 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2024 .....	30
DT-TR-0011. FORTALECIMIENTO EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE FRESA PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, PÁEZ Y TOTORÓ- CAUCA .....	32
DT-TR-0012. MISIÓN INTERNACIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN BRASIL.....	33
DT-TR-0013. GIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE LIMÓN TAHITÍ DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE CAQUETÁ.....	35
1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA .....	36
DT-AT-0009 APOYO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO DE LOS MUNICIPIOS DE (JARDÍN, JERICÓ, ANDES, TÁMESIS, PUEBLORRICO) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADMISIBILIDAD PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS .....	36
DT-AT-0011 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICO – PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE AGUACATE HASS Y LIMA ÁCIDA TAHITÍ A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y	



ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y CUNDINAMARCA. ....	39
DT-AT-0013 GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO EN DEPARTAMENTOS Y LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO, CONTROL Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO FITOSANITARIO DEL COMPLEJO HLB DE LOS CÍTRICOS/DIAPHORINA CITRI, FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE R4T EN PLÁTANO Y MOSCAS DE LA FRUTA EN MANGO Y DURAZNO. ....	42
DT-AT-0014 APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS CUARENTENARIAS, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS .....	44
DT-AT-0015 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO FITOSANITARIO EN PLAGAS, LÍNEAS PRODUCTIVAS Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS .....	46
1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN .....	49
MC-CAD-0001 APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE 3 - 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR).....	49
MC-AE-0002 PROMOCIÓN DE LA UCHUVA Y LA GULUPA COLOMBIANA EN EL MERCADO ALEMÁN .....	51
1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	53
AE-ADI-0008 CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO” DIAGNÓSTICO DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA -PNFH .....	53
AE-ADI-0009. ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2024 .....	55
AE-ADI-0010 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH .....	57
AE-ADI-0011 UNIDAD TÉCNICA DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - AÑO 2024 .....	59
<b>1.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN.....</b>	<b>61</b>
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	61
<b>ANEXOS.....</b>	<b>66</b>



## 1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

El presente informe contextualiza las actividades desarrolladas por el área de Seguimiento y Control (SYC) durante el I semestre del año 2024. El área realizó además del proceso de planeación; un acompañamiento integral a Asohofrucol en la puesta en marcha de propuestas cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) en los componentes técnicos, presupuestales, financieros y legales que permitió el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la ejecución de los recursos financieros en los tiempos establecidos.

Durante este periodo, se realizó la planificación de las fases a desarrollar y la estructura de desglose de trabajo para el Seguimiento y Control de (18) proyectos en total, de los cuales (12) proyectos se encuentran en ejecución, (3) proyectos terminados y en etapa de cierre y (3) proyectos sin iniciar. Toda esta información se detalla a continuación.

Con respecto al acompañamiento integral por parte del Área de Seguimiento y Control (SYC) Asohofrucol - FNFH durante el primer semestre del año 2024, se tiene la siguiente relación:

- 1. Proyectos de vigencias anteriores:** Con respecto a los **siete (7) proyectos** de vigencias anteriores, se realizó el seguimiento, control, acompañamiento y cierre: cuatro (4) proyectos en ejecución, y tres proyectos (3) terminados en proceso de cierre en la vigencia 2024, de la siguiente manera:

### 1.1 Programa de Desarrollo Tecnológico - (6) proyectos.

#### 1.1.1 Proyectos de Investigación - Uno (1):

- DT-IV-0003, “Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá” que se encuentra en ejecución.

#### 1.1.2 Transferencia de tecnología - Uno (1):

- DT-TR-0003, “Establecimiento de nuevas áreas de granadilla y mejoramiento de capacidades de productores hortifrutícolas a través del modelo Agroecológico de Agricultura Tropical en el municipio de Labateca, Norte de Santander”, proyecto terminado en el mes de mayo 2024 en fase de cierre.

#### 1.1.3 Asistencia técnica - Cuatro (4):

Son los siguientes proyectos ejecutados por Asohofrucol:



- DT-AT-0009, Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de (Jardín, Jericó, Andes, Támesis, Pueblo rico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos, proyecto terminado en el mes de enero 2024 en fase de cierre.
- DT-AT-0011, denominado “Fortalecimiento de los procesos técnico- productivos de productores priorizados de aguacate Hass y lima ácida Tahití a través de la sensibilización, transferencia de tecnología y asistencia técnica bajo lineamientos de buenas prácticas agrícolas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca”, proyecto en ejecución.
- DT-AT-0013: Aporte al mejoramiento del estatus fitosanitario en departamentos y frutas priorizadas mediante estrategias de monitoreo, control, mitigación y comunicación de moscas de la fruta, HLB y su vector, Fusarium oxysporum f.sp. cubense R4T y Moko, proyecto terminado en el mes de marzo 2024 en fase de cierre.
- DT-AT-0014 denominado “Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de Urrao, Betulia, Montebello, Betania y Salgar en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos”, proyecto en ejecución.

## **1.2 Programa de Mercadeo y Comercialización - (1) proyecto:**

### **1.2.1 Proyecto Mercadeo (1)**

- MC-CAD-0001, denominado “Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Fase 3 - 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)”. Proyecto en ejecución.

**2. Proyectos vigencia 2024:** para esta vigencia, se está llevando a cabo la planificación, seguimiento, control y acompañamiento a **ocho (8)** proyectos aprobados e iniciados, de los cuales tenemos:

### **2.1 Programa de Desarrollo Tecnológico - (5) proyectos.**

**2.1.1 Transferencia de tecnología - cuatro (4):** proyectos ejecutados por Asohofrucol con código interno:

- DT-TR-0010 denominado “Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, año 2024 – PNFH”, proyecto en ejecución.
- DT-TR-0009, denominado “Fortalecimiento de capacidades productivas y organizacionales de productores hortifrutícolas en el Valle del Cauca”, proyecto en ejecución.



- DT-TR-0012, denominado “Misión internacional para el intercambio de experiencias de productores de cítricos en Brasil, proyecto en ejecución”.
- DT-TR-0013, denominado “Gira para el fortalecimiento de las capacidades en el manejo técnico del cultivo de Limón Tahití de productores priorizados de Caquetá”, proyecto en ejecución

2.1.2 **Asistencia Técnica - uno (1):** proyectos ejecutados por Asofrucol con código interno:

- DT-AT-0015, denominado “Implementación de acciones para el mejoramiento fitosanitario en plagas, líneas productivas y departamentos priorizados”, proyecto en ejecución.

**2.1 Programa de Área Económica y Difusión – tres (3) proyectos.** Proyectos en ejecución ejecutados por Asofrucol.

- AE-ADI-0009, denominado “Área de Seguimiento, Control y evaluación de proyectos de inversión del fondo nacional de fomento Hortifrutícola año 2024”, proyecto en ejecución.
- AE-ADI-0010, denominado “Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de los programas y proyectos del FNFH”, proyecto en ejecución.
- AE-ADI-0011, denominado “Unidad Técnica de planes programas y proyectos - año 2024”, proyecto en ejecución.

**3. Proyectos sin iniciar: (3) proyectos.**

Se cuenta con tres (3) proyectos aprobados que no han iniciado su ejecución:

**3.1 Programa de Desarrollo Tecnológico – un (1) proyecto,** que pertenece al componente de Transferencia, y se relaciona a continuación:

- DT-TR-0011, Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y Totoró- Cauca. Proyecto aprobado en la Junta del 14/03/2024 Acta N°174. Se encuentra en proceso de formalización del convenio con Promigas. Se estima iniciar la ejecución del proyecto durante el mes de agosto de 2024.

**3.2 Programa Mercadeo y Comercialización – un (1) proyecto,** que pertenece a Apoyo a Exportaciones y se relaciona a continuación:

- MC-AE-0002, Promoción de la uchuva y la gulupa colombiana en el mercado Alemán. Proyecto aprobado en la Junta del 13/12/2023 Acta N°173. Se ha llevado un proceso de



múltiples reuniones con Procolombia para el ajuste de la minuta del convenio. Procolombia no ha cumplido con los tiempos establecidos para revisión y firma de la minuta y envío de los documentos legales lo cual hace que el proceso se retrase. Se estima o pretende iniciar la ejecución del proyecto en el mes de octubre de 2024.


### 3.3 Programa Área Económica – un (1) proyecto, que pertenece a Acopio y Difusión de Información que se relaciona a continuación:

- AE-ADI-0008, Contribución a la implementación del plan de fortalecimiento del registro administrativo” diagnóstico de productores atendidos en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola -PNFH. Proyecto aprobado por Junta celebrada el 13/12/2023 acta N°173. Se está a la espera de la respuesta para la firma del convenio con el DANE, ya que la entidad ha tenido cambios de personal lo cual ha retrasado el proceso de inicio.

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto DT-TR0010 – Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola Fase 2024, al tener un cubrimiento en 22 departamentos del país, cuenta con (23) oficinas regionales (Antioquia 2 oficinas) y personal por cada zona y metas específicas de cumplimiento; el área de SyC realizó los planes de seguimiento, las matrices de verificación por cada departamento.

Con relación al proyecto MC-CAD0001 - Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas fase 3 - 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, se planteó ejecutar un total de 36 alianzas, de las cuales a la fecha se encuentran en ejecución 32 alianzas con sus respectivas actas de inicio y metodologías de seguimiento y control.

Gráfica 1- Estado proyectos con las verificaciones del Área de Seguimiento y Control corte a junio 2024

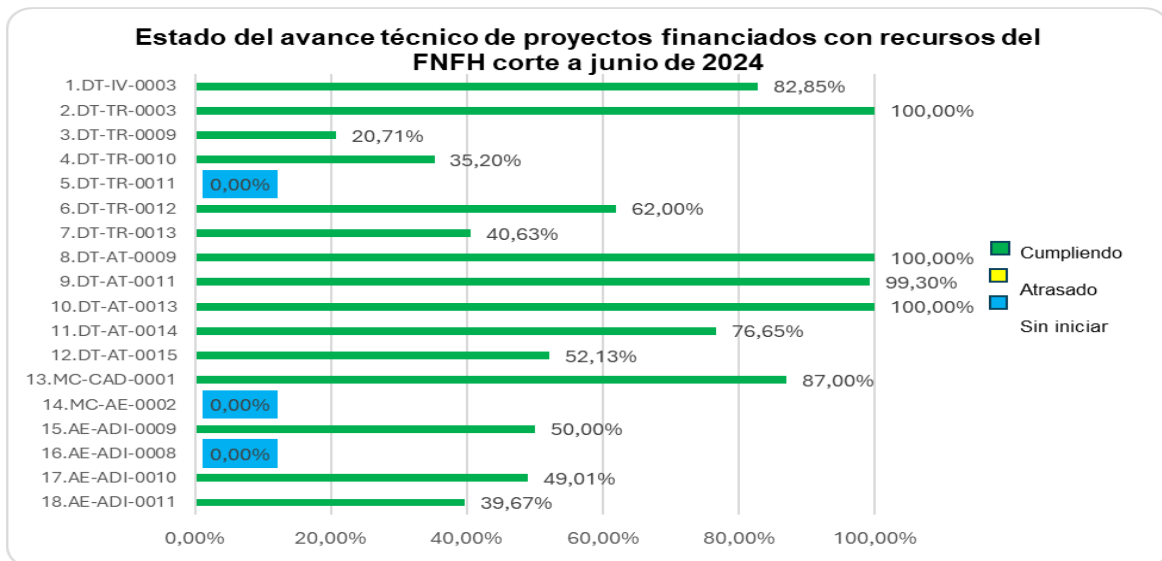






## 1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

El Área de Seguimiento y Control para el año de 2024, presenta el siguiente esquema operativo, que permite dar cubrimiento a los requerimientos de los proyectos cofinanciados con recursos del FNFH en los componentes técnicos, financieros y legales.

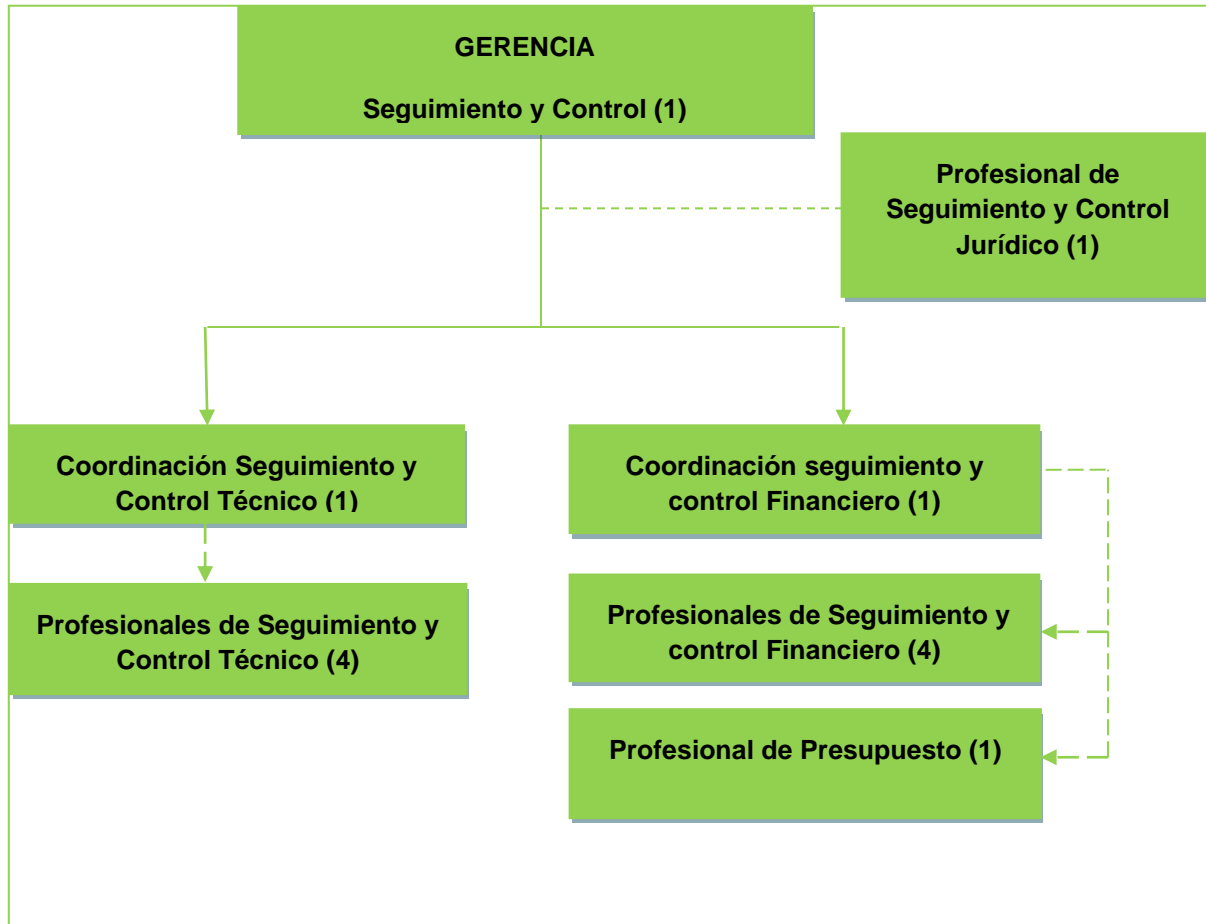

Gráfica 2- Estructura Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

Por otra parte, el equipo del área de S&C está integrado por una (1) Gerencia, un (1) Profesional de Seguimiento y Control Jurídico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Técnico, cuatro (4) profesionales de Seguimiento y Control Técnico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero, cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control financiero y un (1) Profesional de Presupuesto.

Cabe mencionar que el personal asignado realizó las verificaciones técnicas y financieras respectivas de acuerdo con los planes de seguimiento estructurados por el área de seguimiento y control, la programación de visitas documentales y de campo que contribuyeron a la ejecución de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el horizonte de tiempo establecido y con los recursos económicos asignados.



## 1.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS AÑO 2024

Del periodo enero - junio del año 2024, se planificó y ejecutó el plan de seguimiento y control establecido para los proyectos en ejecución para la vigencia; el cual se determinó como meta de gestión, realizar reuniones iniciales a los proyectos aprobados y en fase de inicio, verificaciones documentales mensuales, verificaciones de cierre de proyectos de vigencias anteriores y visitas de campo, según el ejecutor del proyecto. En este periodo se programaron 79 visitas y 86 verificaciones de campo de Seguimiento y Control técnico a los proyectos, considerando 4 Profesionales de Seguimiento y Control técnico, y el Coordinador de SyC Técnico del Área de SyC, ejecutándose 79 visitas de campo a 809 productores y generándose un porcentaje de cumplimiento del 100%. La programación de las visitas de campo se realizó de manera mensual en coordinación con el ejecutor y la programación establecida por el proyecto en los meses de enero a junio de 2024.

Las visitas de campo realizadas para validación de actividades de los proyectos del primer semestre de 2024 fueron las siguientes:

**Tabla No 1. Visitas de campo componente técnico primer semestre año 2024**

PROYECTO	MES	FECHAS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	# DE VISITAS	# DE VERIFICACIONES	ALCANCE DE LA VERIFICACION	# DE PRODUCTORES	LINEAS PRODUCTIVAS
DT-AT-0011	Febrero	26/02/2024	Caldas	Anserma	1	1	Visita de implementación Global GAP	1	Aguacate Hass
DT-AT-0011	Febrero	26/02/2024	Caldas	Risaralda	1	1	Visita de implementación BPA	1	Lima ácida Tahití
DT-AT-0011	Febrero	27/02/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Capacitación Primeros Auxilios, manejo de extintores y BPA	31	Aguacate hass y Lima ácida Tahití
DT-IV-0003	Febrero	23/02/2024	Meta	Granada	1	1	Taller Gira técnica	22	Maracuyá
DT-IV-0003	Febrero	24/02/2024	Meta	Lejanías y Fuente de oro	1	1	Taller Gira técnica	17	Maracuyá
DT AT 0009	Febrero	22 Y 23-02-2024	Antioquia	Urrao	1	1	Visitas de socialización, monitoreo y asistencia técnica	3	Aguacate
DT-AT0013	Febrero	21 al 24-02-2024	Santander	Guadalupe, Suaita	1	5	Visitas de monitoreo HLB	5	Cítricos
DT-TR-0003	Marzo	18 al 19-03-2024	Norte de Santander	Labateca	1	3	Establecimiento de Parcela, biofabricas y AT Visita documental	5	Granadilla



DT-AT0010	Abril	1/02/2024	Boyacá	Tibasosa	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	2/02/2024	Boyacá	Zetaquirá	1	1	Taller ECO	23	Línea Aguacate hass
DT-AT0010	Abril	2/04/2024	Risaralda	Apia	2	1	Asistencia técnica	2	Aguacate, plátano
DT-AT0010	Abril	2/04/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	4/04/2024	Casanare	Yopal	1	1	Monitoreo en parcela	1	Piña
DT-AT0010	Abril	4/04/2024	Casanare	Yopal	1	1	Asistencia técnica	1	patilla
DT-AT0010	Abril	5/04/202	Casanare	Yopal	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	8/04/2024	Nariño	Pasto	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	9/04/2024	Nariño	Leiva	1	1	Taller, ECO y Socioempresaria I	24	Cítricos
DT-AT0010	Abril	9/04/2024	Quindío	Armenia	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	10/04/2024	Quindío	Génova	1	1	Asistencia técnica	6	Cítricos
DT-AT0010	Abril	10/11/2024	Putumayo	Sibundoy	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	11/11/2024	Putumayo	Sibundoy	1	1	Taller, ECO y Socioempresaria I	22	Lulo
DT-AT0010	Abril	11/04/2024	Valle del cauca	Cartago	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	12/04/2024	Valle del cauca	Cartago	1	1	Congreso de fruticultura	262	Cítricos, mora, aguacate, melón
DT-AT0010	Abril	1/04/2024	Tolima	Ibagué	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	2/04/2024	Tolima	Espinal y Guamo	3	3	Asistencia técnica	3	Mango y cítricos
DT-AT0010	Abril	8/04/2024	Meta	Granada	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	9/04/2024	Meta	Guamo	1	1	Asistencia técnica y visita de implementación	3	Mangostino
DT-AT0010	Abril	11/04/2024	Norte de Santander	Silos	1	1	Taller, ECO y Socioempresaria I	22	cebolla Junca
DT-AT0010	Abril	12/04/2024	Norte de Santander	Cúcuta	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	15/04/2024	La Guajira	Riohacha	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	16/04/2024	La Guajira	Riohacha	3	1	Asistencia técnica	3	mango
DT-AT0010	Abril	15/04/2024	Córdoba	Montería	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-	Abril	16/04/2024	Córdoba	Moñitos	1	1	Taller, ECO y	19	Plátano



AT0010							Socioempresaria I		
DT-AT0010	Abril	17/04/2024	Santander	Girón	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	18/04/2024	Santander	Girón	1	1	Evento CENFER		N/A
DT-AT0010	Abril	17/04/2024	Sucre	Tolú viejo	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	18/04/2024	Sucre	Corozal	1	1	Taller, ECO y Socioempresaria I	19	Plátano
DT-AT0010	Abril	15/04/2024	Antioquia	Envigado	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	16/04/2024	Antioquia	Granada	1	1	Taller, ECO y Socioempresaria I	24	Mora
DT-AT0010	Abril	18/04/2024	Urabá	Apartado	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-AT0010	Abril	19/04/2024	Urabá	Necoclí	1	1	Taller ECO y Socioempresaria I	18	Maracuyá
DT-AT0010	Abril	24/04/2024	Cundinamarca	Silvania-Fusagasugá	2	1	Asistencia técnica	2	Aguacate-cítricos
DT-AT0010	Abril	26/04/2024	Cundinamarca	Oficina central	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR0010	Marzo	20-21/03/2024	Quindío	Armenia	1	1	Seminario Internacional de Aguacate	N/A	N/A
DT-AT0011	Abril	1/04/2024	Antioquia	El Retiro	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-AT0011	Abril	1/04/2024	Antioquia	El Peñol	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-AT0011	Abril	2/04/2024	Antioquia	Sonsón	1	1	Implementación Global GAP	1	Aguacate hass
DT-TR0010	Abril	4/04/2024	Bolívar	Cartagena	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR0010	Abril	5/04/2024	Bolívar	Carmen de Bolívar	1	2	Asistencia técnica	2	Aguacate
DT-TR0010	Abril	6/04/2024	Bolívar	Clemencia	1	1	Taller técnico - Socioempresaria I	25	Mango
DT-TR0010	Abril	8/04/2024	Magdalena	Santa Marta	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR0010	Abril	9/04/2024	Magdalena	Ciénaga	1	1	Asistencia técnica	1	Mango
DT-TR0010	Abril	9/04/2024	Magdalena	Ciénaga	1	1	Asistencia técnica	1	Mango
DT-TR0010	Abril	18/04/2024	Caldas	Supía	1	1	Taller técnico - Socioempresaria I	32	Plátano
DT-TR0010	Abril	19/04/2024	Caldas	Manizales	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0004	Abril	22/04/2024	Huila	El Agrado	1	1	Construcción Biofabricas	N/A	N/A
DT-	Abril	22/04/2024	Huila	El Pital	1	2	Asistencia	2	Lima ácida



TR0010							Técnica		Tahití
DT-TR0010	Abril	23/04/2024	Huila	Pitalito	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR0010	Abril	25/04/2024	Cauca	Popayán	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR0010	Abril	26/04/2024	Cauca	Morales	1	1	Asistencia técnica	1	Aguacate hass
DT-TR0010	Abril	26/04/2024	Cauca	Totoró	1	1	Asistencia Técnica	1	Aguacate hass
DT-AT0010	Abril	29/04/2024	Cesar	Patillal - Valledupar	1	1	Asistencia técnica, visita Biofabricas y Planta	1	Mango
DT-AT0010	Abril	30/04/2024	Cesar	Valledupar	1	1	Verificación Documental	N/A	N/A
DT-TR-0013	Mayo	15-16/05/2024	Quindío	Calarcá	1	2	Taller teórico-practico Agricultura tropical	40	Lima Acida TAHITI
DT-AT-0011	Mayo	21/05/2024	Cundinamarca	Silvania-Fusagasugá	1	1	Implementación BPA	1	Aguacate hass
MC-CAD-0001	Mayo	11/5/2024	Boyacá	Combita	1	1	Entrega de insumos AL158	24	Mora
DT-IV-0003	Mayo	29/05/2024	Boyacá	Tinjacá	1	1	Verificación de Biofabricas y parcela AT	1	Tomate
DT-AT-0014	Mayo	18-05-2024	Antioquia	Betulia	1	1	Capacitación Agro biológicos	54	aguacate
DT-TR-0009	Junio	17-06-2024	Valle del Cauca	Versalles	1	1	Socialización de productores	56	Mora
DT-AT-0015	Junio	20/06/2024	Cundinamarca	La Mesa	1	3	Vistas monitoreo Mosca	3	Mango
DT-IV-0003	Junio	25/06/2024	Tolima	Fresno	1	1	Verificación de Biofabricas y parcela AT	1	Aguacate
DT-AT-0011	Junio	18/06/2024	Risaralda	Pereira	1	1	Capacitación Socioempresarial	20	Aguacate Hass y Lima ácida Tahití
DT-AT-0011	Junio	19/06/2024	Caldas	Villa María	1	1	Implementación BPA	1	Aguacate Hass

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohfrucol – FNFH

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.

En el componente técnico se desarrollaron las siguientes actividades de gestión de SYC del periodo enero a junio de 2024 así:

Tabla No 2. Actividades de gestión componente técnico primer semestre año 2024.

Seguimiento y Control Técnico	
Planes De Seguimiento	7
Metodologías De Seguimiento	7



<b>Visitas de Cierre, Inicial, Documentales y de Campo</b>	258
<b>Revisión Documental/Plataforma</b>	169
<b>Reportes Matrices</b>	168
<b>Informes</b>	63
<b>Comités Equipo Técnico</b>	61
<b>Reunión Equipo Central</b>	6
<b>Reuniones Con Todo El Equipo</b>	6
<b>TOTAL</b>	<b>947</b>

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

### 1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS

Del periodo de enero a junio vigencia 2024, se planificó y ejecutó el seguimiento y control financiero a través de las herramientas existentes (Sevenet, Software panda, facere, sigeca y carpeta compartida de OneDrive por contratación y compras), para los 18 proyectos aprobados y en ejecución. Durante la vigencia se programaron verificaciones de Seguimiento y Control Financiero a los proyectos y de revisión documental y/o plataformas, considerando cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control Financiero y un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero; como resultado se llevaron a cabo un total de 191 verificaciones de las cuales 5 fueron de campo a 75 productores con enfoque al seguimiento de actividades socioempresariales, contables y tributarias las cuales se describen a continuación:

Tabla No 3. Visitas de campo componente financiero primer semestre año 2024

Proyecto	# de verificaciones	Alcance de la actividad	# de productores	Departamento	Municipio	# visitas
MC-CAD-0001 AL 152	1	Entregas de elementos de Cosecha y postcosecha	40	Antioquia	La Unión	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	5	Meta	Lejanías	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	4	Caldas	Manzanares	1
MC-CAD-0001 AL168	1	Entregas de elementos de Cosecha y postcosecha	22	Huila	Guadalupe	1
DT-TR-0010	1	fortalecimiento contable, financiero y tributario ESAL	4	La plata	Huila	1

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT-015 Informe de visita de campo.



Las otras 186 visitas y/o verificaciones ejecutadas por el componente, fueron netamente financieras, realizadas de manera virtual y presencial con los ejecutores que para este caso fueron ASOHOFrucOL, ANALDEX y a las 32 alianzas formalizadas del contrato macro MC-CAD-0001. Estas verificaciones tuvieron el siguiente enfoque: avance en la ejecución de gastos FNFH 2024, revisión documental de contratos y soportes de pagos, acreditación de aporte de contrapartida cuando aplica, avance en la ejecución global del proyecto aprobado, validación de la causación de los gastos en la contabilidad, resultados financieros globales y específicos del FNFH por el periodo revisado. Así como alertas tempranas, retroalimentación de las fortalezas y se establecen compromisos para las observaciones o temas pendientes de validar o soportar. Todas las visitas fueron documentadas en el formato PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control, y sus resultados fueron consignados en los formatos PP-FT-051 reporte mensual de seguimiento y control financiero, en el formato PP-FT-053 Informe trimestral de seguimiento y control o en el formato PP-FT-013 Informe de resultados Financiero final, debidamente soportados.

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades de gestión financiera del periodo de enero a junio de 2024:

Tabla No 4. Actividades de gestión componente financiero primer semestre año 2024.

<b>Seguimiento y Control Financiero</b>	
<b>Planes De Seguimiento</b>	7
<b>Metodologías De Seguimiento</b>	7
<b>Visitas (Iniciales. financieras y de campo). Revisión Documental / Plataformas</b>	191
<b>Reportes y/o informes Revisión De Gastos</b>	52
<b>Comités y/o reuniones</b>	52
<b>Trámites de desembolso</b>	41
<b>Legalización De Recursos</b>	41
<b>Comités Equipo Financiero</b>	6
<b>Reunión Equipo Central</b>	6
<b>Reuniones todo el Equipo</b>	6
<b>Informes finales</b>	15
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH



#### 1.4 PROYECTOS VIGENCIA 2024

A 30 de junio del año 2024, se tienen dieciocho (18) proyectos enmarcados en los Programa de Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica, Investigación), Mercado y comercialización (comercialización, Apoyo a exportaciones) y Área Económica (Sistemas de Información), proyectos iniciados en vigencias anteriores y vigencia 2024, cofinanciados con recursos del FNFH a los cuales se les realizó el Seguimiento y Control en los componentes técnicos, financieros y jurídicos. A continuación, se relacionan los proyectos en ejecución y aprobados para la vigencia 2024 con Seguimiento y Control:



**Tabla No 5. Relación de proyectos año 2024–FNFH**

VIGENCIAS	PROGRAMA	CODIGO	PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL PROYECTO APROBADO	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR FNFH	VALOR DE COFINANCIACIÓN FNFH APROBADO POR JD PARA EL AÑO 2024	RECURSOS GESTIONADOS CONTRAPARTIDA
VIGENCIAS ANTERIORES	Programa Desarrollo tecnológico (Investigación)	DT-IV-0003	Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá	AGROSAVIA – ASOHOFrucOL	\$3.091.745.098	\$1.710.076.797	\$585.183.668	\$1.381.668.301
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0009	Apoyo a los productores de aguacate Hass del suroeste antioqueño de los municipios de (Jardín, Jericó, Andes, Támesis, Pueblorrico) en el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de los Estados Unidos	ASOHOFrucOL	\$955.838.091	\$721.390.091	\$33.200.000	\$234.448.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0003	Establecimiento de nuevas áreas de granadilla y mejoramiento de capacidades de productores hortifrutícolas a través del modelo Agroecológico de Agricultura Tropical en el municipio de Labateca, Norte de Santander	ASOHOFrucOL	\$504.576.387	\$157.880.793	\$0	\$346.695.594
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0011	Fortalecimiento de los procesos técnico – productivos de productores priorizados de aguacate Hass y lima acida Tahití a través de la sensibilización, transferencia de tecnología y asistencia técnica bajo lineamientos de Buenas Prácticas Agrícolas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.	ANALDEX	\$1.714.287.000	\$1.200.000.000	\$360.000.000	\$514.287.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0013	Generación de acciones para el mejoramiento del estado fitosanitario en departamentos y líneas productivas priorizadas mediante estrategias de prevención, monitoreo, control	ASOHOFrucOL	\$6.831.971.573	\$6.831.971.573	\$1.640.019.866	\$ -



			y comunicación del riesgo fitosanitario del complejo HLB de los cítricos/Diaphorina citri, Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T en plátano y moscas de la fruta en mango y durazno					
	Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0014	Apoyo a productores de aguacate en la implementación acciones de monitoreo y control de plagas cuarentenarias, en municipios priorizados del suroeste antioqueño, para aportar al cumplimiento de requisitos de acceso al mercado de Estados Unidos	ASOHOFUCOL	\$1.018.099.991	\$882.799.991	\$683.323.495	\$135.300.000
	Programa Mercadeo Y Comercialización - Canal De Acopio Y Distribución	MC-CAD-0001	Apoyo a proyectos hortifrutícolas presentados a la convocatoria del proyecto Alianzas Productivas fase 3-2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR	ASOHOFUCOL	\$1.295.750.000	\$1.295.750.000	\$933.873.515	\$ -
VIGENCIA 2024	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0009	Fortalecimiento de capacidades productivas y organizacionales de productores hortofrutícolas en el Valle del Cauca	ASOHOFUCOL	\$499.178.950	\$216.750.000	\$216.750.000	\$282.428.950
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0010	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, AÑO 2024	ASOHOFUCOL	\$32.628.753.821	\$32.285.557.183	\$32.285.557.183	\$343.196.638
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0011	Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y Totoró- Cauca	ASOHOFUCOL	\$239.107.262	\$63.622.370	\$63.622.370	\$175.484.892
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0012	Misión internacional para el intercambio de experiencias de productores de cítricos en Brasil	ASOHOFUCOL	\$187.261.200	\$167.261.200	\$167.261.200	\$20.000.000
	Programa Desarrollo tecnológico (Transferencia de tecnología)	DT-TR-0013	Gira para el fortalecimiento de las capacidades en el manejo técnico del cultivo de Limón Tahití de productores priorizados de Caquetá	ASOHOFUCOL	\$85.380.000	\$76.780.000	\$76.780.000	\$8.600.000



Programa Desarrollo tecnológico (Asistencia técnica)	DT-AT-0015	Implementación de acciones para el mejoramiento fitosanitario en plagas, líneas productivas y departamentos priorizados	ASOHOFRUCOL	\$4.889.820.520	\$4.889.820.520	\$4.889.820.520	\$0
Programa Mercadeo Y Comercialización - Canal De Acopio Y Distribución	MC-AE-0002	Promoción de la uchuva y la gulupa colombiana en el mercado alemán	ProColombia Fideicomiso Sociedad Fiduciaria Fiducoldex	\$420.000.000	\$220.000.000	\$220.000.000	\$200.000.000
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0009	Área de seguimiento, control y evaluación de proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortifrutícola año 2024	ASOHOFRUCOL	\$1.228.482.537	\$1.228.482.537	\$1.228.482.537	\$0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0008	Contribución a la implementación del plan de fortalecimiento del registro administrativo" diagnóstico de productores atendidos en el marco del proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola -PNFH	Asohofrucol y DANE	\$212.085.820	\$177.124.012	\$177.124.012	\$34.961.808
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0010	Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de los programas y proyectos del FNFH	PLANUPSOFT	\$1.080.000.000	\$1.080.000.000	\$1.080.000.000	\$0
Programa Área Económica (Sistemas de Información)	AE-ADI-0011	Unidad Técnica de Planes Programas y Proyectos - año 2024	ASOHOFRUCOL	\$2.875.627.778	\$2.875.627.778	\$2.875.627.778	\$0
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>				<b>\$59.757.966.028</b>	<b>\$56.080.894.845</b>	<b>\$47.516.626.144</b>	<b>\$3.677.071.183</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECAUDO</b>				<b>\$7.151.380.653</b>	<b>\$7.151.380.653</b>	<b>\$7.151.380.653</b>	<b>\$0</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO</b>				<b>\$4.117.647.383</b>	<b>\$4.117.647.383</b>	<b>\$4.117.647.383</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTALES</b>				<b>\$71.026.994.064</b>	<b>\$67.349.922.881</b>	<b>\$58.785.654.180</b>	<b>\$3.677.071.183</b>

Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH)

**En el Anexo No 1. Matriz Información General de Proyectos de inversión y gastos de funcionamiento (M.I.G.P.) se relaciona la información complementaria a los proyectos en ejecución y los pendientes por iniciar.**



## 1.5 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ENERO A JUNIO) I SEMESTRE AÑO 2024.

La siguiente tabla nos presenta la información del avance presupuestal en el I semestre del año 2024, de los 18 proyectos aprobados y apropiados por programa incluyendo los terminados y los gastos de funcionamiento.

**Tabla No 6 -Ejecución presupuestal por programa por trimestre Año de 2024.**

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2024	Valor FNFH Ejecutado I Trimestre 2024	Valor FNFH Ejecutado II Trimestre 2024	Porcentaje de Cumplimiento Año 2024
<b>12</b>	<b>Desarrollo Tecnológico</b>	<b>\$ 41.001.518.302</b>	<b>\$ 10.534.533.200</b>	<b>\$ 11.344.771.335</b>	<b>53%</b>
1	Investigación	\$ 585.183.668	\$ 168.017.062	\$ 194.515.198	62%
11	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 40.416.334.634	\$ 10.366.516.138	\$ 11.150.256.137	53%
<b>2</b>	<b>Mercadeo y Comercialización</b>	<b>\$ 1.153.873.515</b>	<b>\$ 218.809.184</b>	<b>\$ 359.382.809</b>	<b>50%</b>
2	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 1.153.873.515	\$ 218.809.184	\$ 359.382.809	50%
<b>4</b>	<b>Área Económica</b>	<b>\$ 5.361.234.327</b>	<b>\$ 1.198.396.945</b>	<b>\$ 1.314.959.770</b>	<b>47%</b>
4	Sistemas de Información	\$ 5.361.234.327	\$ 1.198.396.945	\$ 1.314.959.770	47%
<b>18</b>	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN FNFH</b>	<b>\$ 47.516.626.144</b>	<b>\$ 11.951.739.329</b>	<b>\$ 13.019.113.914</b>	<b>53%</b>
<b>N/A</b>	<b>Gastos Administrativos y de Funcionamiento</b>	<b>\$ 7.151.380.653</b>	<b>\$ 1.807.685.583</b>	<b>\$ 1.705.863.359</b>	<b>49%</b>
<b>N/A</b>	<b>Gastos de funcionamiento Recaudo</b>	<b>\$ 4.117.647.383</b>	<b>\$ 861.649.870</b>	<b>\$ 828.170.827</b>	<b>41%</b>
<b>N/A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58.785.654.180</b>	<b>\$ 14.621.074.782</b>	<b>\$ 15.553.148.100</b>	<b>51%</b>


Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Con respecto a los \$58.785.654.180=, financiados con recursos del FNFH para los 18 proyectos y los gastos de funcionamiento (Recaudo y Administrativos) programados para el año 2024; fueron ejecutados presupuestalmente para el primer semestre de 2024 (incluyendo cambios presupuestales el valor de \$14.621.074.782= y para el segundo trimestre de 2024 fueron ejecutados presupuestalmente (incluyendo cambios presupuestados el valor de \$15.553.148.100= alcanzando una ejecución total del primer semestre del 51% del valor aprobado para el año.

De requerir cualquier información detallada y justificada del presupuesto por proyecto, dirigirse al Anexo 8 de la resolución 000532 de 2023 del MADR, elaborado por el proceso de presupuesto de ASOHOFrucol.



Gráfica 3- Relación de Recursos Desembolsados en el I y II Trimestre del año 2024, proyectos de inversión FNFH.

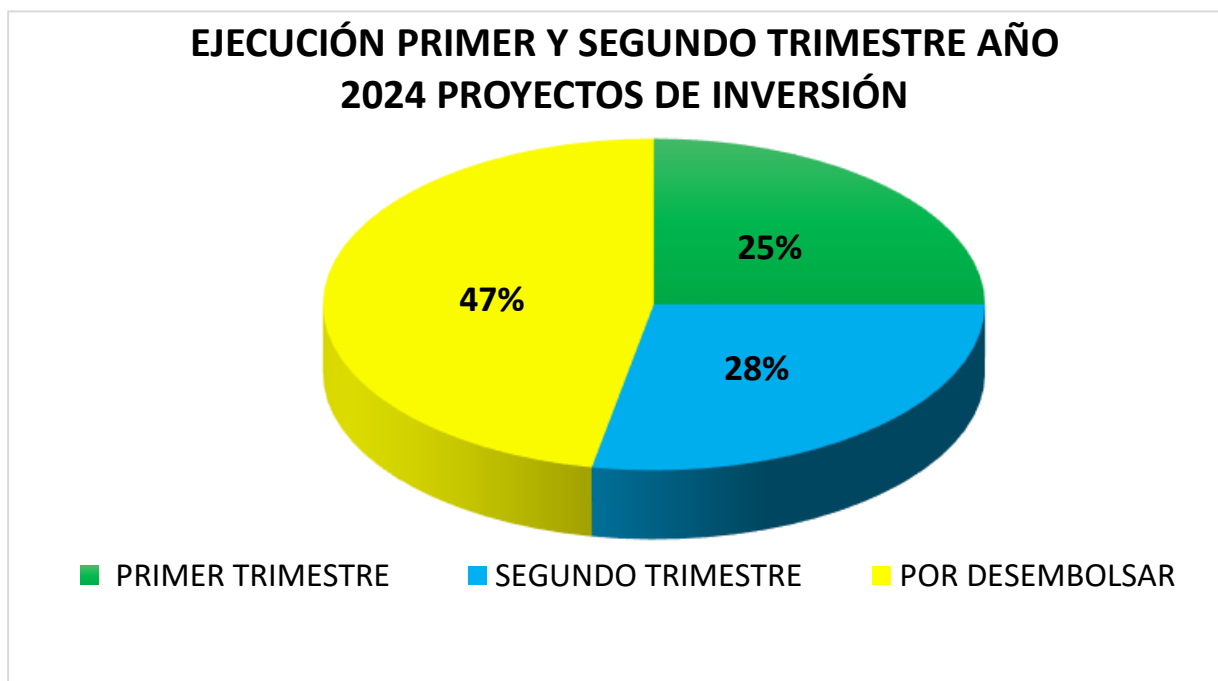

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

**La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024. (M.E.P.).**

#### 1.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AÑO 2024

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada del FNFH durante la vigencia 2024:

**Tabla No 7 -Ejecución presupuestal por programa Año 2024.**

No de Proyectos	Programa	Valor FNFH Año 2024	Valor FNFH Ejecutado a Junio 2024	Porcentaje de Cumplimiento Año 2024
12	<b>Desarrollo Tecnológico</b>	<b>\$ 41.001.518.302</b>	<b>\$ 21.879.304.535</b>	<b>53%</b>
1	Investigación	\$ 585.183.668	\$ 21.879.304.535	62%
11	Transferencia De Tecnología (Incluye Asistencia Técnica)	\$ 40.416.334.634	\$ 21.879.304.535	53%
2	<b>Mercadeo y Comercialización</b>	<b>\$ 1.153.873.515</b>	<b>\$ 21.879.304.535</b>	<b>50%</b>
2	Comercialización (Incluye apoyo a las exportaciones)	\$ 1.153.873.515	\$ 21.879.304.535	50%
4	<b>Área Económica</b>	<b>\$ 5.361.234.327</b>	<b>\$ 21.879.304.535</b>	<b>47%</b>
4	Sistemas de Información	\$ 5.361.234.327	\$ 21.879.304.535	47%




18	<b>SUBTOTAL INVERSIÓN FNFH</b>	\$ 47.516.626.144	\$ 21.879.304.535	53%
N/A	Gastos Administrativos y de Funcionamiento	\$ 7.151.380.653	\$ 21.879.304.535	49%
N/A	Gastos de funcionamiento Recaudo	\$ 4.117.647.383	\$ 21.879.304.535	41%
N/A	<b>TOTAL</b>	\$ 58.785.654.180	\$ 21.879.304.535	51%

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

Con respecto a los \$58.785.654.180= financiados con recursos del FNFH para los (18) proyectos aprobados y los gastos de funcionamiento; se alcanzó una ejecución real a 30 de junio equivalente a \$21.879.304.535=, alcanzando un avance del 51% del 100% que se tiene como meta para la vigencia 2024.

Gráfico 4- Relación de Recursos proyecto de inversión FNFH Ejecutados a 30 de junio de 2024

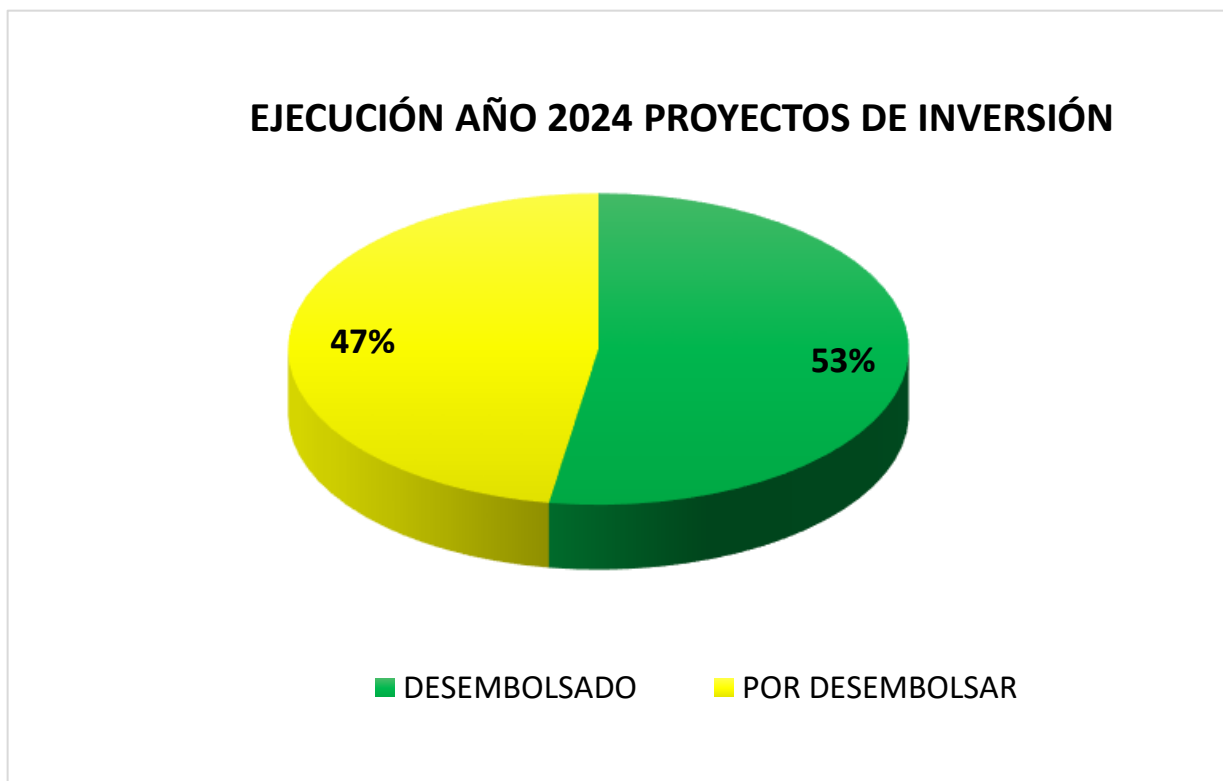

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

**La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024. (M.E.P.).**

## 1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIADOS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FNFH AÑO 2024 POR EL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

A continuación, se muestra la información de cumplimiento técnico y financiero evidenciado por el Área de Seguimiento y control con la realización de las verificaciones documentales y de campo, tanto técnico como financiero con corte al mes de junio de 2024.

Se relacionan los proyectos en ejecución durante el año 2024 con la información general del proyecto, su inversión, los respectivos porcentajes de avance a 30 de junio de 2024, resultados de cumplimiento obtenidos según las metas establecidas de las actividades cofinanciadas con recursos del FNFH.

---

### 1.7.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – INVESTIGACIÓN

---

DT-IV-0003. APOORTE DE LAS PRÁCTICAS CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE AGUACATE EN TOLIMA Y HUILA, PASIFLORAS EN BOYACÁ Y META, TOMATE EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

**Fecha de inicio:** 15 de noviembre 2022

**Fecha de terminación:** 14 de noviembre 2024

**Entidad Ejecutora:** ASOHOFRUCOL - AGROSAVIA

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 168 del 09/12/2022:

- ✓ Monto del Proyecto: \$2.307.968.264
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.428.101.757
- ✓ Recursos Contrapartida: \$879.866.507

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 172 del 27/03/2023:

- ✓ Monto del proyecto: \$3.091.745.098
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.710.076.797
  - Vigencia 2022: \$578.450.703
  - Vigencia 2023: \$546.442.426
  - Vigencia 2024: \$585.183.668
- ✓ Recursos contrapartida: \$1.381.668.301



## **Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por \$1.487.425.389=Mcte., correspondientes al 87%, de acuerdo con la siguiente distribución:

INVERSION PRESUPUESTAL (año 2022) \$578.450.703=Mcte., correspondiente al 33,8%

- INVERSION PRESUPUESTAL (año 2023) \$546.442.426=Mcte. correspondiente al 32%
- INVERSION PRESUPUESTAL (año 2024) \$362.532.260=Mcte. correspondiente al 21,2%

Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios y en gastos generales: materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje y otros servicios.

**Nota:** Se aclara, que dichos recursos fueron trasladados a las cuentas especiales del convenio, tanto a la cuenta de ASOHOFRUCOL destinada para la ejecución de las actividades planteadas según la ficha del proyecto, como a la cuenta de AGROSAVIA, de las actividades que realizan con recursos del FNFH de acuerdo con el convenio.

El ejecutor con corte a junio presenta una ejecución financiera global por valor de \$2.338.779.763=Mcte., correspondientes al 76% distribuidos de la siguiente manera: una ejecución financiera del FNFH por valor de \$1.269.081.919=Mcte., correspondientes al 74% y presenta una ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de \$1.069.697.844=Mcte., correspondientes al 77,4%

Con corte a junio el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH por valor de \$1.244.681.156=Mcte., correspondientes al 72,8% y una validación financiera global por valor de \$2.314.379.000=Mcte., correspondientes 74.9%.

**Zonas de Intervención:** Departamentos: Boyacá, Cundinamarca Huila, Meta y Tolima.

**Líneas Productivas:** aguacate, Gulupa, Maracuyá, Tomate.

**No de beneficiarios:** 489 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 82.93%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 82.85%

## **Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra cumpliendo, presenta una ejecución técnica del 82,85% de un esperado del 82,93%, es decir que se encuentra cumpliendo la meta programada de acuerdo con el resultado de cumplimiento de las metas por actividad.





## Resultados relevantes:

- Se construyeron cuatro (4) matrices de variables seleccionadas colaborativamente y consolidadas. Una matriz por línea productiva.
- Se elaboraron cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 96 entrevistas semiestructuradas (8 entrevistas semiestructuradas a actores de la cadena en dos municipios seleccionados del área de influencia del proyecto por departamento) de cuatro (4) programadas.
- Se obtuvieron cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 360 entrevistas estructuradas (30 por municipio) de cuatro (4) programadas.
- Con la información obtenida se construyeron cuatro (4) documentos de caracterización de productores y medios de vida con y sin AT, uno por línea productiva que incluye la información secundaria, y primaria colectada a través de entrevistas; así como la validación realizada en los grupos focales (12 grupos focales al menos 1 por línea productiva por municipio). de cuatro (4) programadas.
- Se lograron obtener cuatro (4) matrices con indicadores multidimensionales identificados a partir de fuentes secundarias de cuatro (4) programadas.
- Se obtuvo una (1) matriz de selección de alternativas, a partir del trabajo colaborativo con actores focales de una (1) programada.
- Se grabó un (1) video de tres (3) con experiencias en la implementación de Agricultura Tropical - AT.
- Realización de cinco (5) Talleres de actualización para técnicos y productores de las líneas productivas y área de influencia del proyecto (1. Agrosavia Meta. 2, Palocabildo Tolima y 3, Miraflores en Boyacá. 4. Granada Meta, 5. Ejecución del taller “Modernización de la fruticultura para el Ariarí. Cadena de valor del maracuyá: transformación y agregación de valor”).
- Ejecución de los ocho (8) módulos de capacitación con énfasis en los ejes fundamentales de la AT, orientado a Técnicos. 8 subtemas ejecutados.
- Realización de una jornada de doce programadas para la divulgación de resultados del proyecto en la feria de EXPOFRUTAS y publicación de resultados en la Revista Frutas & Hortalizas de Asohofrucol.
- Realización seis (6) giras técnicas de seis (6) programadas así:
  1. 24 de febrero Granada y Lejanías Meta: 16 participantes.
  2. 04-05- de marzo Eje Cafetero 31 participantes.
  3. 23/04/2024 San Agustín Huila. 34 participantes.
  4. 25-26 de abril Boyacá tomate a CI Tibaitatá 24 participantes.
  5. 26-26 de abril Boyacá Gulupa a Granada Cund. 31 participantes
  6. 03/05/2024 Cundinamarca Tomate a Ci Tibaitatá 27 participantes.



---

DT-TR-0003. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS DE GRANADILLA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTÍCOLAS A TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE LABATECA, NORTE DE SANTANDER.

**Fecha de inicio:** 20/02/2023

**Fecha de terminación:** 20/05/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL y FNFH

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$504.576.387
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$157.880.793
  - Vigencia 2023: \$157.880.793
- ✓ Recursos Contrapartida: \$346.695.594

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

El proyecto terminado, cierra con una ejecución presupuestal final de \$157.880.793=Mcte. correspondiente al 100%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Honorarios, materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje, capacitación y otros servicios, se aclara, que la ejecución presupuestal corresponde, a los traslados de recursos a la cuenta especial del proyecto a ASOHOFRUCOL, los cuales se realizaron en la vigencia 2023.

El ejecutor presenta una ejecución financiera total final por valor de \$499.944.793=Mcte., correspondiente al 99.1% (Cumpliendo), distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$153.249.201=Mcte., que corresponden al 97.1% (Atraso leve)., y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$346.695.592=Mcte., correspondientes al 100%.

La validación financiera final por parte del área de seguimiento y control, de los recursos del FNFH es por valor \$153.249.201=Mcte., que corresponden al 97.1%. y una ejecución financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$499.944.793=Mcte., correspondiente al 99,1%.

**Zonas de Intervención:** Departamento de Norte de Santander, Municipios de Labateca

**Líneas Productivas:** Granadilla, otras frutas y hortalizas

**No de beneficiarios:** 50



**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 100.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 100.00%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

El proyecto terminado, cumplió con lo programado ejecutando las siguientes actividades:

- Se realizó 1 capacitación al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos del proyecto uniformando criterios de conocimiento del proyecto.
- Se logró realizar una socialización del proyecto dirigida a productores y actores del proyecto.
- Se tuvieron 50 productores inscritos.
- Se realizaron 7 talleres con la participación de 266 asistentes.
- Se realizaron 613 visitas de asistencia técnica.
- Se eligieron 14 predios para el establecimiento de parcelas.
- Se practicaron 14 análisis de suelos con el resultado de PH y análisis químico de suelos.
- Como resultado de los análisis se elaboraron 14 planes de fertilización.
- Se logró tener 7 biofabricas establecidas.
- 14 parcelas establecidas.
- Ejecutados 6 talleres socio empresariales con 191 asistentes.
- 50 kits de sostenimiento entregados.
- 36 visitas de asistencia técnica socio empresarial.
- Se logró tener 3 acercamientos con aliados comerciales.

**Como resultados relevantes se tiene que:**

En la zona de intervención del proyecto fueron seleccionados 14 grupos de trabajo en donde se establecieron 14 parcelas, la entrega de insumos para el incremento de las áreas de siembra de granadilla, mejorando producción, calidad y rendimientos con el acompañamiento técnico aportado. Así mismo la selección de 7 productores en donde se establecieron biofabricas. Se realizaron 613 visitas de asistencia, 14 tomas de muestras de análisis de suelos y planes de fertilización de estos y 6 talleres socio empresariales se fortalece las capacidades productivas y



técnicas de los productores beneficiados.

---

DT-TR-0009. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS EN EL VALLE DEL CAUCA.

**Fecha de inicio:** 02/05/2024

**Fecha de terminación:** 31/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL, FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA, FNFH

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 499.178.950
- Recursos Aporte FNFH: \$ 216.750.000
- ✓ Vigencia 2024: \$216.750.000
- Recursos contrapartida: \$282.428.950

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

El proyecto se encuentra en ejecución y cumpliendo, presenta un avance de ejecución presupuestal por valor de \$108.288.571=Mcte. correspondiente al 50%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, materiales, suministros y papelería, capacitación y viáticos y gastos de viaje, se aclara, que la ejecución presupuestal corresponde, al traslado de recursos a la cuenta especial del proyecto a ASOHOFRUCOL, los cuales se realizaron en la vigencia 2024.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a Junio el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$173.622.639=Mcte., correspondiente al 35% (Cumpliendo), distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$64.287.975=Mcte., que corresponden al 30% (Cumpliendo), y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$109.334.664=Mcte, correspondientes al 38,7%.

Con corte a junio el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control por \$26.324.729=Mcte., que corresponden al 12%, de los recursos FNFH y una ejecución financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$135.659.393=Mcte, correspondiente al 27%.



**Zonas de Intervención:** Valle del Cauca.

**Líneas Productivas:** Mora, guayaba, aguacate, cítricos, plátano y pimentón.

**No de beneficiarios:** 160 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 19.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 20.71%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

- Una capacitación del equipo técnico realizada el 14-06-2024 en el municipio de Alcalá socializando actividades, entregables y dinámica del proyecto.
- Se seleccionaron los lugares para el establecimiento de las biofabricas:

Municipio de Alcalá (3 biofabricas)

Municipio de Argelia

Municipio del Dovio

Municipio de Roldanillo

Municipio de Versalles (2 biofabricas)

Municipio de Sevilla (2 biofabricas)

**Como resultados relevantes se tiene que:**

- Se realizó una (1) capacitación del equipo técnico.
- Se han desarrollado 6 socializaciones del proyecto con 176 participantes entre representantes de los productores de las organizaciones, productores y representantes de las entidades territoriales del Valle del Cauca.
- Se alcanzaron 131 productores inscritos.
- Se tienen 10 lugares seleccionados para el establecimiento de las biofabricas.
- Se han efectuado 132 visitas de monitoreo.



**Fecha de inicio:** 01/01/2024

**Fecha de terminación:** 31/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL y FNFH

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 32.624.006.701
- Recursos Aporte FNFH: \$32.280.810.063
- Recursos contrapartida: \$343.196.638

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- ✓ Monto del proyecto: \$ 32.628.753.821
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 32.285.557.183
- ✓ Recursos contrapartida: \$343.196.638

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra cumpliendo, con corte a junio alcanza una ejecución presupuestal de los recursos del FNFH por valor de \$17.016.330.114=Mcte. correspondiente al 52,71%. del presupuesto ajustado y apropiado para la vigencia 2024. Dichos recursos están representados en servicios de personal "Personal de planta y honorarios", equipos de cómputo y computación, muebles y equipos de oficinas, impresos y publicaciones, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, arriendos, elementos de aseo y cafetería e investigación, entre otros.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a junio el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$17.185.560.215=Mcte., correspondiente al 52,7% (Cumpliendo)., distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$17.016.330.114=Mcte., que corresponden al 52,71% (Cumpliendo) y una ejecución financiera global de los recursos de contrapartida por valor de \$169.230.101=Mcte., correspondientes al 49,31%.

Con corte a junio el proyecto alcanza una validación financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$16.598.513.518=Mcte., correspondiente al 50,87% distribuida de la siguiente manera: por valor de \$16.429.283.417=Mcte., que corresponden al 50,9%., de los



recursos FNFN y una ejecución financiera global validada de los recursos de contrapartida por valor de \$169.230.101=Mcte., correspondientes al 49,31%.

### **Zonas de Intervención**

- ✓ Departamentos: 22
- ✓ Municipios: 449

**Líneas Productivas:** alrededor de 63 entre frutas y hortalizas.

**No de beneficiarios:** 16.580

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 40,45%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 35.20%

### **Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Para el mes de junio de 2024, se presentan los siguientes logros hasta la fecha:

En el componente técnico del proyecto, el ejecutor inicio el acompañamiento a productores en 23 departamentos y 373 municipios de Colombia, desarrollando una propuesta metodológica, dirigida a productores de 51 líneas productivas que manejan áreas promedio de 3.5 hectáreas.

Todo el aspecto técnico se viene enfocando en capacitación a productores, profesional técnico y socioempresarial, en conceptos de Agricultura tropical. Así, se ha verificado que la asistencia técnica tiene en su componente de recomendaciones aspectos relacionados con manejo y conservación de suelo, fauna y flora y la disminución del uso de moléculas químicas para controlar plagas y enfermedades, lo que redundará en disminución de costos al productor.

El ejecutor planteó la entrega y construcción de 46 biofábricas, que serán instaladas en 23 departamentos, con el ánimo de estimular la producción de insumos orgánicos, que a la postre disminuirán costos en las actividades propias de la producción y generarán una producción limpia y de conservación de suelo y agua en las regiones atendidas.

Es indispensable referenciar que se instalaron 12 parcelas de investigación, en donde se ha realizado desde hace dos años, evaluación de variables que, con la utilización de prácticas de agricultura tropical, están generando en las diferentes zonas del país, información práctica, que permitirá tomar decisiones sobre los sistemas de producción que deben adoptar los productores intervenidos.

Se ha podido verificar que dentro del acompañamiento socioempresarial, los enfoques dados a las 384 asociaciones identificadas han sido para mejorar su estatus organizacional, administrativo, financiero, contable y tributario. Así mismo se está haciendo acompañamiento para fomentar la comercialización en forma conjunta, de modo que se logre la disminución de



intermediarios en las zonas del país y se incrementen las utilidades a los productores.

De la misma manera, se han presentado avances considerables al segundo trimestre del año 2024, relacionados con la implementación de normas de calidad, que pretenden generar herramientas a los productores, para mejorar la comercialización nacional y de exportación, en las diferentes líneas productivas.

Con las actividades propuestas por ASOHOFRUCOL, relacionadas con la articulación interinstitucional, se está fomentando la generación de propuestas productivas y capacitación en la gestión de recursos por parte de los grupos ECO's y asociaciones vinculados al proyecto.

Se ha verificado el inicio de actividades de difusión del sector a través de la generación de seminarios y talleres en diferentes líneas productivas, lo cual está mejorando el aspecto de conocimientos no solamente de productores sino de profesionales del país vinculados al sector Hortifrutícola.

**Como resultados relevantes se tiene:**

- Talleres Técnicos: 1.604 realizados.
- Visitas de Asistencia Técnica: 16.780 efectuadas.
- Productores A. T.: 8.081 inscritos.
- Predios certificados: 68 certificaciones.
- Organizaciones Fortalecidas: 384 en proceso.
- Recursos gestionados: \$ 385.272.262 conducidos.
- Parcelas de investigación: 12 parcelas establecidas.
- Eventos de difusión generados: 3 eventos desarrollados.

---

DT-TR-0011. FORTALECIMIENTO EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE FRESA PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, PÁEZ Y TOTORÓ- CAUCA

**Fecha de inicio:** SIN INICIAR

**Fecha de terminación:** N.A.

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL, FUNDACIÓN PROMIGAS, FNFH

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 239.107.262





- Recursos Aporte FNFH: \$ 63.622.370
- Recursos contrapartida: \$175.484.892

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Proyecto sin iniciar, aprobado en la Junta No. 174 del FNFH del 14 de marzo de 2024, dará inicio en el tercer trimestre del año.

**Zonas de Intervención:** Cauca.

**Líneas Productivas:** fresa.

**No de beneficiarios:** 117 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 0%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 0%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Proyecto sin iniciar debido a que se han realizado ajustes y observaciones a la minuta del convenio por parte de Promigas, dados los requerimientos de la fundación tanto legales como de forma y de las revisiones entre los jurídicos de cada organización. Se proyecta dar inicio en el mes de agosto de 2024 en esta fecha estaría formalizado y suscrito el convenio y el plan operativo del mismo.

---

DT-TR-0012. MISIÓN INTERNACIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN BRASIL.

**Fecha de inicio:** 15/03/2024

**Fecha de terminación:** 15/08/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL y FNFH

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$ 187.261.200
- Recursos Aporte FNFH: \$167.261.200
- Recursos contrapartida: \$20.000.000

### **Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra en ejecución y cumpliendo, presenta un avance de ejecución presupuestal por valor de \$148.138.800=Mcte. correspondiente al 89%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a Junio el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$148.138.800=Mcte., correspondiente al 79% (Atraso leve), distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$148.138.800=Mcte., que corresponden al 89% (cumpliendo), el ejecutor no presenta informe de ejecución financiera de los recursos de contrapartida.

Con corte a junio el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control por \$148.138.800=Mcte, que corresponden al 89%, de los recursos FNFH y una ejecución financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$148.138.800=Mcte, correspondiente al 79%.

### **Zonas de Intervención: Nacional**

**Líneas Productivas:** cítricos.

**No de beneficiarios:** 9 productores (directos) y 170 productores (indirectos).

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 62,00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 62.00%

### **Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

- Se realizaron 9 visitas a organizaciones, entidades y empresas vinculadas al sector productivo y comercial de cítricos en Brasil.
- Participación en la feria Fruit Attraction Brasil 2024 con realización de mesas de trabajo para concertación de conocimientos y recolección de propuestas por parte de los participantes, con acercamientos comerciales, apropiación de conocimientos de alta relevancia para el control de HLB en el cultivo de cítricos bajo la experiencia de ARCOS implementada en Brasil.



---

DT-TR-0013. GIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE LIMÓN TAHITÍ DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE CAQUETÁ.

**Fecha de inicio:** 15/04/2024

**Fecha de terminación:** 15/08/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** ASOHOFRUCOL, FNFH

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- Monto del proyecto: \$85.380.000
- Recursos Aporte FNFH: \$ 76.780.000
- Recursos contrapartida: \$8.600.000

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra en ejecución y cumpliendo, presenta un avance de ejecución presupuestal por valor de \$68.971.945=Mcte. correspondiente al 90%, del valor total aprobado con recursos FNFH, dichos recursos están representados en Servicios personales, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a Junio el ejecutor presenta una ejecución financiera total del proyecto por valor de \$68.971.945=Mcte., correspondiente al 81% (Cumpliendo), distribuidos de la siguiente manera: ejecución financiera de los recursos del (FNFH) por valor de \$68.971.945=Mcte, que corresponden al 90% (cumpliendo), el ejecutor no presenta informe de ejecución financiera de los recursos de contrapartida.

Con corte a junio el proyecto alcanza una validación financiera por parte del área de seguimiento y control por \$68.971.945=Mcte, que corresponden al 90%, de los recursos FNFH y una ejecución financiera global validada por el área de seguimiento y control de \$68.971.945=Mcte, correspondiente al 81%.

**Zonas de Intervención:** Caquetá y Quindío.

**Líneas Productivas:** limón.

**No de beneficiarios:** 42 productores.



**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 31.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 40.63%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

- Realización de gira técnica al departamento del Quindío, municipio de Calarcá, vereda el Cairo, predio el Limonar donde participaron 42 productores del departamento del Caquetá.
- Apropiación de conocimientos para los 42 productores asistentes en temas de certificación orgánica, global gap y predio exportador, Identificación y control de plagas y enfermedades de interés económico en limón Tahití, elaboración de biopreparados, Toma de muestra e interpretación de análisis de suelos, Elaboración de biofertilizantes.

---

### 1.7.3 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO – ASISTENCIA TECNICA

---

DT-AT-0009 APOYO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO DE LOS MUNICIPIOS DE (JARDÍN, JERICÓ, ANDES, TÁMESIS, PUEBLORRICO) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADMISIBILIDAD PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

**Fecha de inicio:** 19/09/2022

**Fecha de Terminación:** 18/09/2023

**Prorroga, adición en tiempo y recursos:** nueva fecha de terminación **31/01/2024** aprobada en la Junta extraordinaria N°171 del 14/09/2023

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** aliados, Comfenalco

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 796.082.220
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 565.154.220
- ✓ Vigencia 2022: \$ 191.422.220
- ✓ Vigencia 2023: \$ 373.732.000
- ✓ Vigencia 2024: \$33.200.000



- ✓ Recursos Contrapartida: \$230.928.000

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 171 del 14/09/2023:

- ✓ Monto del Proyecto: \$955.838.091
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$ 721.390.091
- ✓ Vigencia 2022: \$ 191.422.220
- ✓ Vigencia 2023: \$496.767.871
- ✓ Vigencia 2024: \$33.200.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$234.448.000

### **Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El ejecutor presenta una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$721.390.091=Mcte. correspondiente al 100%, discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2022 DE \$191.422.220=Mcte. correspondiente al 26,5%
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$496.767.871=Mcte. correspondiente al 68,9%
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$33.200.000=Mcte. correspondiente al 4,6%

Dichos recursos, están representados en servicios de personal: honorarios y en gastos generales: materiales, suministros y papelería y capacitación.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el Ejecutor presenta una ejecución financiera global final del proyecto por valor de \$939.243.997=Mcte., correspondiente al 98,3%, distribuidos de la siguiente manera: ejecución de los recursos en efectivo de cofinanciación (FNFH) de \$719.664.993=Mcte., que corresponden al 99,8% y una ejecución global de los recursos de contrapartida por valor de \$219.579.004=Mcte., correspondientes al 93,7%.

La validación financiera final del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH fue de \$719.664.99=Mcte., correspondiente al 99,8%, y una validación financiera global de \$939.243.997=Mcte., correspondientes al 98,3%.

**Zonas de Intervención:** departamento de Antioquia, municipios de Jardín, Jericó, Andes, Támesis y Pueblorrico.

**Líneas Productivas:** aguacate Hass y cualquier tipo de Aguacate.

**No de beneficiarios:** 1412 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 100.00%



**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 100.00%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto presento una ejecución técnica de un 100% de un 100% esperado, según las metas iniciales del proyecto. El estado de cumplimiento por actividad al mes de marzo de 2024 es el siguiente:

- Se realizaron 4 capacitaciones al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto uniformando criterios conocimiento del proyecto.
- Se logro realizar 15 socializaciones del proyecto en 5 municipios atendidos con beneficios del proyecto, las fuentes de cofinanciación y los resultados esperados al terminar el proyecto.
- Se impartió 1 capacitación en sistemas de información geográfica enfocado en localización sobre cartografía digital.
- 5 capacitaciones al equipo técnico, 1 en alturas, 1 herramientas ofimáticas, un diplomado de seguridad en el trabajo, BPA y primeros auxilios.
- Se consolidaron 16 capas catastrales caracterizadas (2 entregadas y caracterizadas por Corpohass).
- Se obtuvieron 834 registros en plataforma sisfito.
- Se elaboraron 834 encuestas en proceso de certificación de predios en lugares de producción libres de plagas cuarentenarias en el cultivo de aguacate.
- Se realizaron 7998 visitas de monitoreo.
- Se construyeron 52 planes de manejo a productores atendidos con el fin de mejorar el estatus fitosanitario en los predios priorizados.
- Se realizaron 370 visitas de asistencia técnica a 51 predios en 176 ha.
- Se imprimieron 4000 volantes impresos con información del FNFH Y ASHOFRUCOL y 2000 stickers entregados a 965 beneficiarios.

**Logros relevantes.**

En la zona de intervención del proyecto ya se encuentran caracterizados 14 núcleos productivos que mantienen el estatus fitosanitario para para plagas de control en aguacate.

16 capas caracterizadas La Alejandría, San José Monte Hass, La Magdalena, Pirineos, Rancho Alegre, la Sofia y campo Alegre y monitoreadas con 834 caracterizaciones en 4 municipios identificando predios con aguacate con la implementación del sistema de vigilancia para el



reconocimiento de zonas libres de plagas cuarentenarias.

Al corte del informe final se evidencian 7998 visitas de monitoreo en plataforma sigeca, a 1286 productores ubicados en 36 núcleos determinando la presencia o no de plagas cuarentenarias para así poder tener una zona buffer libre, Al llegar al predio se comparte con los productores información de identificación de las plagas de interés, afectación en el desarrollo del cultivo y manejo fitosanitario.

---

DT-AT-0011 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICO – PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES PRIORIZADOS DE AGUACATE HASS Y LIMA ÁCIDA TAHITÍ A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO Y CUNDINAMARCA.

**Fecha de inicio:** 15/05/2023

**Fecha de Terminación:** 14/08/2024

**Entidad ejecutora:** Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX

**Entidades contrapartes:** otras fuentes, ANALDEX

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$ 1.714.287.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.200.000.000
- ✓ Vigencia 2023: \$840.000.000
- ✓ Vigencia 2024: \$360.000.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$514.287.000

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por valor de \$1.080.000.000=Mcte. correspondiente al 90% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$840.000.000=Mcte. correspondiente al 70%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$240.000.000=Mcte.



correspondiente al 20%.

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos generales: kit de transferencia conocimientos BPA y GLOBAL GAP; viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ANALDEX, Con corte a junio, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$1.577.182.826=Mcte., correspondiente al 92% (cumpliendo), distribuida de la siguiente manera: de los recursos del FNFH presenta una ejecución acumulada por valor de \$1.077.568.701 =Mcte., correspondientes al 89,8% (Cumpliendo) y de los recursos de contrapartida presenta un valor de ejecución acumulada de \$599.614.125 =Mcte., correspondientes al 97,15%.

El área de seguimiento y control, valida una ejecución financiera global por valor de \$1.563.982.826=Mcte., correspondiente al 91% distribuida de la siguiente manera: de los recursos del FNFH presenta una validación acumulada por valor de \$1.064.368.701 =Mcte., correspondientes al 88,7% y de los recursos de contrapartida presenta un valor de ejecución validada por valor de \$499.614.125 =Mcte., correspondientes al 97,15%.

**Zonas de Intervención:** Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Risaralda.

**Líneas Productivas:** aguacate - Lima ácida Tahití.

**No de beneficiarios:** 200 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 83.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 99.30%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El Proyecto se encuentra cumpliendo y presenta una ejecución técnica al 31 de junio de 2024, superior al esperado, toda vez que se validó el avance que el ejecutor mostró en la firma de contratos de proveeduría entre 18 productores y dos exportadoras, lo que generará apropiación de los Sistemas de Gestión de Calidad de estas comercializadoras a los productores, lo que permitirá dar inicio a la implementación de dichos sistemas de gestión y de acuerdo a la programación del ejecutor completar a 18 productores la auditoría interna entre febrero y marzo de 2024. El ejecutor mostró un avance superior al esperado en cuanto a la realización de visitas de implementación, tanto en productores BPA, como en productores Global GAP.

1. Dentro del objetivo No. 2, se realizaron mayor cantidad de visitas, respecto a lo programado en BPA, por el proceso de acompañamiento a las visitas de certificación del ICA, pese a que no estaba contemplado en la metodología.

2. Se radicaron documentos de 134 predios en la plataforma SIMPLIFICA del ICA, para acceder a la certificación BPA, pese a que a la fecha se esperaba radicar documentación de 90





predios.

3. El ejecutor al mes de junio de 2024, realizó visitas de auditoría interna a 9 productores que no quisieron entrar al grupo de Cartama y Fruty Green, con lo que se completaron 48 auditorías internas. Es necesario acotar que la metodología establecía la generación de 35 auditorías internas.

4. Para el mes de junio se mostró evidencia de la certificación en Global GAP de 38 predios, a través de los sistemas de gestión de calidad de Cartama (20 predios) y Fruty Green (18) predios, de una meta de 35 predios certificados. Al mes de mayo el ejecutor había planteado la certificación de 21 predios en la opción 2.

#### **Logros relevantes en el proyecto:**

- Pese a los procesos de deserción presentados durante toda la ejecución del proyecto, el ejecutor logró mantener a 200 productores activos al mes de junio de 2024, de los cuales 150 corresponden a productores de BPA de una meta de 150 y 50 productores de Global GAP, de una meta de 50.
- El proyecto permitió socializar la propuesta metodológica de implementación de BPA y Global GAP a 479 productores en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.
- El proyecto logró recopilar información general de 311 productores de 200 esperados, a través de documentos de caracterización técnica, productiva y comercial, que servirán de apoyo en futuros procesos de implementación en las zonas de ejecución del proyecto.
- El ejecutor logró interiorizar en los 200 productores activos, información requerida con las normas BPA y Global GAP, a través de 32 talleres de 24 programados en los 11 grupos de trabajo conformados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.
- Al mes de mayo de 2024, el ejecutor demostró la realización de 1.260 visitas de implementación en BPA de 1.200 programadas y la realización de 451 visitas de implementación de Global GAP de una meta de 450. Adicional programó para el mes de julio la realización de una visita a cada uno de los 200 productores activos, para fortalecer el acompañamiento en el manejo de registros.
- Todos los 200 productores activos al mes de junio de 2024, recibieron a satisfacción Kits de BPA y Global GAP, que incluye análisis de suelo y fisicoquímico y microbiológicos de agua.
- El ejecutor al mes de junio logró radicar documentos ante el ICA de 134 predios de 150 propuestos para lograr certificación en BPA.



- Al mes de junio de 2024, el ejecutor logró demostrar la certificación en Global GAP opción 2 de 38 predios, a través de los SGC de las comercializadoras Cartama y Fruty Green.
- Realización de capacitación en todos los grupos de trabajo, sobre el tema Socioempresarial.

---

DT-AT-0013 GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO EN DEPARTAMENTOS Y LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MONITOREO, CONTROL Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO FITOSANITARIO DEL COMPLEJO HLB DE LOS CÍTRICOS/DIAPHORINA CITRI, FUSARIUM OXYSPOURUM F. SP. CUBENSE R4T EN PLÁTANO Y MOSCAS DE LA FRUTA EN MANGO Y DURAZNO.

**Fecha de inicio:** 01/08/2023

**Fecha de Terminación:** 31/03/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** N.A.

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$6.831.971.573
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$6.831.971.573
- ✓ Vigencia 2023: \$5.191.951.707
- ✓ Vigencia 2024: \$ 1.640.019.866
- ✓ Recursos Contrapartida: \$0

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El ejecutor presenta una inversión presupuestal final de todas las vigencias del FNFH por valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondientes al 98,42%. discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$5.177.893.103=Mcte. correspondiente al 75,78%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$1.547.380.620=Mcte. correspondiente al 22,64%.

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos



generales: impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, transportes, fletes y acarreos, comunicaciones y transportes, arriendo, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto fue ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presento una ejecución financiera global final por valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondientes al 98,4%.

El área de seguimiento y control, valido una ejecución financiera final de los recursos del FNFH el valor de \$6.725.273.723=Mcte., correspondiente al 98.4%.

**Zonas de Intervención:** Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

**Líneas Productivas:** cítricos, durazno, mango y plátano.

**No de beneficiarios:** 4400 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 100.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 100.00%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto cumplió lo programado técnicamente presentando una ejecución técnica del 100% de un 100% esperado.

**Logros relevantes en el proyecto:**

**Componente Certificaciones.**

Se evidenció que a 447 productores en 15 departamentos, se les realizo socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente HLB, a 1.835 productores inscritos se les realizo 10.507 visitas de acompañamiento y prevención, se entregaron 3.584 dosis de Coadyuvante Nu film y 3.584 de Insecticida Safermix WP, se entregaron 199.402 sobres de predadores, se aplicaron insecticida biológico en 2.260 ha, en un total de 584 plantas y se realizaron 60 talleres sobre manejo de D. Citri y HLB de los cítricos a 1.459 productores.

**Componente Mosca.**

Se verifico que, a 313 productores en 5 departamentos, se les realizó socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente Mosca, a 1.102 productores inscritos se les realizo 13.364 visitas de monitoreo para el Manejo Integrado mosca de la fruta, se realizaron 22 talleres y la entrega de 1.100 kits.

**Componente Fusarium.**

Se evidencio que, a 414 productores en 13 departamentos, se les realizo la socialización sobre el proyecto y el origen de los recursos componente Fusarium, igualmente se evidencia que a



1505 productores inscritos se les realizó 8.996 visitas de acompañamiento y prevención, se realizaron 50 talleres sobre contención y prevención de *Fusarium oxysporum* f.sp. *cúbense* Raza 4 Tropical FocR4T a 1.187 productores.

---

DT-AT-0014 APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS CUARENTENARIAS, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

**Fecha de inicio:** 01/11/2023

**Fecha de Terminación:** 30/11/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFrucol

**Entidades contrapartes:** COMFENALCO Antioquia, Aliados (Copiurrao y núcleos productivos).

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$1.018.099.991
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$882.799.991
- ✓ Vigencia 2023: \$199.652.496
- ✓ Vigencia 2024: \$ 683.323.495
- ✓ Recursos Contrapartida: \$135.300.000

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por valor de \$632.373.492=Mcte. correspondiente al 72% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$199.652.496=Mcte. correspondiente al 23%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$432.720.996=Mcte. correspondiente al 49%.

Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios y gastos generales: materiales y suministros de papelería, impresos y publicaciones, capacitación y viáticos y gastos de viaje.



El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL. Con corte a junio, el ejecutor presenta una ejecución financiera global de \$671.581.678=Mcte., correspondientes al 66% (Cumpliendo), distribuidos de la siguiente manera: el ejecutor presenta una ejecución financiera de los recursos del FNFH por valor de \$607.832.188=Mcte., correspondientes al 69% (Cumpliendo) y una ejecución acumulada de los recursos de contrapartida por valor de \$63.749.490=Mcte., correspondientes al 47%.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global de \$648.894.064=Mcte., correspondiente al 64%, distribuidos de la siguiente manera: de los recursos del FNFH la validación financiera es de \$590.192.188=Mcte. correspondiente al 67% y la validación de los recursos de contrapartida por valor de \$58.701.876=Mcte., correspondientes al 43%.

**Zonas de Intervención:** Antioquia: Municipios de Urrao, Betulia, Montebello, Betania y Salgar.

**Líneas Productivas:** aguacate.

**No de beneficiarios:** se atenderán aproximadamente 947 predios distribuidos en 44 núcleos productivos. La cantidad final de productores dependerá del resultado de las caracterizaciones realizadas.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 76.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 76.65%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto presenta una ejecución técnica de 76.65 % de un 76 % esperado, cumpliendo con lo programado. Se han realizado las siguientes actividades con corte al mes de junio:

- Se tienen 8 soportes de listados con capacitaciones al personal con aspectos técnicos y procesos administrativos proyecto uniformando criterios conocimiento del proyecto.
- Se ha realizado 6 socializaciones del proyecto en 5 municipios atendidos con beneficios del proyecto, las fuentes de cofinanciación y los resultados esperados al terminar el proyecto.
- Se dictó 1 capacitación en sistemas de información geográfica enfocado en localización sobre cartografía digital.
- Se impartieron 2 capacitaciones en temas especializados.
- Se recibieron 16 capas catastrales solicitadas a ICA.
- Se tienen 981 productores inscritos en 5180 ha.
- Se realizaron 2389 visitas de monitoreo en 5 municipios atendidos y 60 núcleos.



- Se realizaron 5 capacitaciones en plagas cuarentenarias a 153 productores.
- Se hicieron 150 visitas de AT.
- Se elaboró 1 plan de comunicaciones.

### **Logros relevantes.**

En la zona de intervención del proyecto se encuentran inscritos 981 productores en 5481 ha con los que se inició la implementación de acciones de monitoreo y control de plagas cuarentenarias que limitan su acceso al mercado de Estados Unidos.

Al corte del informe se evidencia 2389 visitas de monitoreo en plataforma sigeca, a 981 productores determinando la presencia o no de plagas cuarentenarias para así poder tener una zona buffer libre, Al llegar al predio se comparte con los productores información de identificación de las plagas de interés, afectación en el desarrollo del cultivo y manejo fitosanitario.

Se utiliza una aplicación que contiene las capas catastrales de los municipios permitiendo verificar las veredas versus la aplicación catastral.

---

## **DT-AT-0015 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO FITOSANITARIO EN PLAGAS, LÍNEAS PRODUCTIVAS Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS**

**Fecha de inicio:** 15/04/2024

**Fecha de terminación:** 15/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** FNFH

### **Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$4.889.820.520
- Recursos Aporte FNFH: \$4.889.820.520
- Recursos contrapartida: \$0

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**



El ejecutor se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por valor de \$1.921.741.229=Mcte., correspondientes al 39%. discriminado de la siguiente manera:

- **INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$1.921.741.229=Mcte. correspondiente al 39%.**

Dichos recursos están representados en servicios personales: honorarios y en gastos generales: impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, transportes, fletes y acarreos, comunicaciones y transportes, arriendo, capacitación y viáticos y gastos de viaje.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL con corte a junio, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$1.921.741.229=Mcte., correspondientes al 39%.

El área de seguimiento y control, valida de los recursos del FNFH el valor de \$1.904.793.538=Mcte., correspondiente al 38,95%.

**Zonas de Intervención:** Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

**Líneas Productivas:** cítricos, durazno, mango y plátano.

**No de beneficiarios:** 2300 productores.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 43.22%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 52.13%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto presenta una ejecución técnica del 52.13% de un 43.22 % esperado por encima de la meta, con el siguiente resultado de cumplimiento x componente y actividad:

#### COMPONENTE HLB

- 2 de 1 capacitación a personal HLB.
- 8 de 6 socializaciones a productores.
- 872 de 720 inscripciones de productores.
- 877 de 7200 visitas de monitoreo.



- 469 ha de 192 ha con aplicación de insecticida biológico.

#### COMPONENTE MOSCA

- 2 de 1 capacitación a personal del componente de Mosca.
- 4 de 4 socializaciones a productores.
- 500 de 500 inscripciones de productores.
- 489 de 500 de kit entregados.
- 1000 de 600 visitas de monitoreo.

#### COMPONENTE FUSARIUM

- 1 de 1 capacitación a personal del componente de Fusarium.
- 8 de 6 socializaciones a productores.
- 837 de 630 inscripciones de productores.
- 838 de 630 visitas de monitoreo.

### **Logros relevantes.**

#### Componente HLB

Se evidencia que, a 263 productores en 8 departamentos, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente HLB, a 872 productores inscritos se les ha realizado 877 visitas de acompañamiento y prevención, se ha aplicado insecticida biológico en 469ha, en un total de 120.257 árboles.

#### Componente Mosca

Se evidencia que, a 197 productores en 5 departamentos, se les ha realizado socialización sobre proyecto y origen de los recursos componente Mosca, igualmente se han inscrito 500 productores, con un registro de 1000 visitas de monitoreo, se han entregado 489 kit de monitoreo y se han identificado 42 nuevos productores.

#### Componente Comercialización

Se evidencia que, 207 productores en 8 departamentos, se les ha realizado socialización sobre el proyecto y el origen de los recursos componente Fusarium, igualmente se evidencia que a 837 productores inscritos se les ha realizado 838 visitas de acompañamiento y prevención, igualmente se han identificado 50 nuevos productores.





---

#### 1.7.4 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

---

MC-CAD-0001 APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE 3 - 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR).

**Fecha de inicio:** 03/01/2023

**Fecha de terminación:** 30/06/2024

**Fecha de terminación Prorroga:** 30/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes:** N/A

#### **Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 168 del 09/12/2022:

- Monto del proyecto: \$1.178.250.000
- Recursos Aporte FNFH: \$1.178.250.000
- Recursos Vigencia 2023: \$ 530.150.000
- Recursos contrapartida: \$0
- Adición según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2022:
- Monto del proyecto: \$1.295.750.000
- Recursos Aporte FNFH: \$1.295.750.000
- Recursos Vigencia 2023: \$ 365.150.000
- Recursos vigencia 2024: \$ 933.873.515
- Recursos contrapartida: \$0

#### **Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto presenta a junio una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por valor de \$939.378.617 =Mcte. Correspondiente al 72,5% discriminado de la siguiente manera:

- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2023 DE \$361.186.624=Mcte. correspondiente al 27,8%.
- INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE \$578.191.993=Mcte. correspondiente al 44,7%.



Dichos recursos están representados en servicios de personal: honorarios, gastos generales: viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, capacitaciones y materiales y suministros y del programa de mercadeo y comercialización; canal de acopio y distribución: alianzas productivas a través de contratos de cofinanciación.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a junio, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$939.378.617 =Mcte., correspondiente al 72,5% del valor ajustado del proyecto.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor de \$737.892.844=Mcte., correspondiente al 57% de los recursos del FNFH, la diferencia entre la ejecución presentada y la validada se debe a que se encuentran pendientes por legalizar los recursos entregados en calidad de anticipo de los contratos de cofinanciación.

**Zonas de Intervención:** Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca y otros a priorizar dependiendo de la demanda de los productores.

**Líneas Productivas:** potenciales renglones productivos a atender: Aguacate, Ají, Cebolla, Cítricos, Guanábana, Guayaba, Gulupa, Hortalizas, Limón, Lulo, Mango, Maracuyá, Mora, Plátano y Uchuva.

**No de beneficiarios:** potencialmente se atenderán 1324 beneficiarios.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 77.94%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 87.00%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

Proyecto cumpliendo técnicamente lo programado. Con corte al mes de junio se han desarrollado las siguientes actividades:

- Consolidación de la base de datos de los proyectos de alianzas. Actividad ejecutada al 100% con una base de datos de beneficiarios. 36 alianzas. (de la base de datos de proyectos tres organizaciones fueron retiradas con beneficiarios, ya se cuenta con dos oficios de desistimiento de dos proyectos (Sotará Cauca y Aquitania Boyacá) y acta de liquidación para la alianza de Aguada Santander línea Hortalizas. Acta de CDA liquidación.
- Elaboración y socialización de documento de Lineamientos que defina la operatividad de los recursos del FNFH con las organizaciones beneficiarias. Cumplimiento del 100% Se reporta por el ejecutor PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA FASE III.
- Realización de reuniones de socialización con las coordinaciones departamentales del PNFH, organizaciones beneficiarias y otras entidades involucradas. Al mes de mayo se



programó 100% de ejecución. El avance logrado es del 100%. En total 43 soportes de reunión validados. 5 reuniones de socialización con otras entidades y 38 con organizaciones.

- Recepción, gestión y trámite de la documentación requerida para elaborar los contratos de cofinanciación. El avance logrado fue del 92.5% de un esperado del 100,00%.
- Elaboración de la ficha PP-FT-017 (o la que se diseñe para este fin) para cada uno de los proyectos derivados. Se logró el 92,5% de ejecución. programada del 100,0%.
- Elaboración de contratos de cofinanciación. Al mes de junio el avance logrado fue de 92.5 de un esperado de 100%. con cumplimiento de treinta y dos (32) contratos de cofinanciación elaborados.
- Acompañamiento a la ejecución de los proyectos, para el periodo se reporta una ejecución del 100% de avance con 26 organizaciones a las que se les ha realizado apoyo en la ejecución.
- Capacitaciones en “Todo sobre las ESAL” y Recaudo de la cuota de fomento parafiscal. Diecisiete (17) talleres ESAL ejecutados.

#### **El proyecto presenta los siguientes logros:**

- Se consolidó una base de datos de una programada de las alianzas a ejecutar con 36 organizaciones beneficiarias y 1363 productores a nivel nacional de una programada.
- Se generó el Protocolo de operatividad de las alianzas productivas para la fase 2023-2024 donde se propone el plan de ejecución del proyecto para los 36 proyectos de alianzas de acuerdo con la base de datos inicial de uno programado.
- Se han realizado cincuenta y ocho (58) reuniones de socialización de lineamientos para definir la operatividad de los recursos del FNFH con las organizaciones beneficiarias, las coordinaciones departamentales del PNFH y otras entidades involucradas (MADR) de 36 programadas.
- Se han realizado el inicio de 32 de 36 proyectos de alianzas productivas.
- Se han realizado 17 de 26 talleres ESAL para el mismo número de organizaciones.
- Se han realizado 17 de 26 talleres de AT con el mismo número de organizaciones.

---

MC-AE-0002 PROMOCIÓN DE LA UCHUVA Y LA GULUPA COLOMBIANA EN EL MERCADO ALEMÁN

**Fecha de inicio:** SIN INICIAR

**Fecha de terminación:** N.A.

**Entidad ejecutora:** ProColombia Fideicomiso Sociedad Fiduciaria Fiducolnex.

**Entidades contrapartes:** FNFH, RECURSO AVANCE PASIFLORAS, PROCOLOMBIA

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$ 420.000.000
- Recursos Aporte FNFH: \$ 220.000.000
- Recursos contrapartida: \$200.000.000

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:**

Proyecto sin iniciar. Aprobado por Junta celebrada el 13/12/2023 acta N°173. el área de seguimiento y control está a la espera de la radicación de los documentos legales para iniciar la supervisión.

**Zonas de Intervención:** Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo.

**Líneas Productivas:** uchuva y gulupa.

**No de beneficiarios:** 1264.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 0%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 0%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Proyecto aprobado en la Junta No. 173 del FNFH del 13 de diciembre de 2023. Se hará solicitud a la junta para dar inicio en el cuarto trimestre del año y realizar el traslado del 50% del recurso para el año 2025. Desde el inicio del año 2024, se comenzó el proceso de formalización del convenio o contrato entre las partes involucradas. Sin embargo, este proceso avanzó lentamente debido a las discusiones entre las entidades participantes para definir aspectos como la figura contractual (contrato o convenio), la pertinencia del pago de una póliza para amparar dicha figura, la distribución de la propiedad intelectual de los resultados del proyecto, la inclusión de las actividades específicas a desarrollar, la definición de las instancias para el seguimiento y control, y la especificidad en los desembolsos, entre otros temas. Una vez superadas las inquietudes de cada entidad, se reajustó la minuta del convenio en acuerdo



con las partes, y actualmente está en proceso de revisión por parte de ProColombia y Avance Passifloras. Dado que han transcurrido casi seis meses y considerando que varias de las actividades propuestas en el proyecto deben ejecutarse en meses específicos del año, como la campaña de promoción al consumo que debería realizarse durante el verano en Alemania, Asohofrucol consultó a ProColombia el 11 de julio, a través de correo electrónico, sobre la fecha más adecuada de inicio del proyecto para definir el valor de los recursos a ejecutar en la vigencia 2024. ProColombia respondió el 16 de julio, informando: “Por medio del presente ratificamos el interés de ProColombia y, en conversación con Avance Pasifloras, en desarrollar el proyecto de Promoción de la uchuva y la gulupa colombiana en el mercado alemán. Proponemos desarrollar las actividades previas a la suscripción del convenio, como la actualización del proyecto en la nueva ficha, la revisión y aprobación de la nueva minuta, y la suscripción del convenio, que esperamos se dé en la segunda quincena de octubre. De acuerdo con lo anterior, la fecha de inicio del proyecto sería en la primera semana de noviembre. De esta manera, estimamos que el plan de medios estará al aire en julio de 2025, coincidiendo con la época de vacaciones y verano en Alemania, lo que responde a las recomendaciones del estudio de uchuva y gulupa realizado en este país, ya que el consumo de estas frutas y la campaña digital están enfocadas en la sensación de frescura que proporcionan en el verano. Según este cronograma, el proyecto requerirá el primer desembolso en 2024 y el segundo en 2025.”

---

#### 1.7.5 PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

---

AE-ADI-0008 CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO” DIAGNÓSTICO DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA -PNFH

**Fecha de inicio:** SIN INICIAR

**Fecha de terminación:** N.A.

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL-DANE

**Entidades contrapartes:** FNFH, DANE

**Inversión:**

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:



- Monto del proyecto: \$ 212.085.820
- Recursos Aporte FNFH: \$177.124.012
- Recursos contrapartida: \$34.961.808

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Proyecto sin iniciar. Aprobado por Junta celebrada el 13/12/2023 acta N°173. el área de seguimiento y control está a la espera de la radicación de los documentos legales para iniciar la supervisión.

**Zonas de Intervención:** el proyecto tendrá cobertura en los departamentos y municipios priorizados en los proyectos objeto de cofinanciación con los recursos del FNFH de acuerdo con el recaudo de la contribución parafiscal y las perspectivas de fomento y desarrollo de la hortifruticultura a nivel nacional.

**Líneas Productivas:** frutas y hortalizas.

**No de beneficiarios:** N/A.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 0%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 0%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Proyecto aprobado en la Junta No. 173 del FNFH del 13 de diciembre de 2023, se hará solicitud a la junta para dar inicio en el tercer trimestre del año y realizar el traslado del 50% del recurso para el año 2025. El convenio aún no ha sido formalizado con el DANE debido a diversas razones que argumenta esta entidad tales como: el cambio de personal de planta por el concurso de méritos de la CNSC, el Censo Económico, el desarrollo del Sistema de Información Wayúu, la producción estadística tradicional, entre otras actividades (comunicación enviada por la entidad el pasado 16 de julio de 2024).



---

AE-ADI-0009. ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2024

**Fecha de inicio:** 01/01/2024

**Fecha de terminación:** 31/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades contrapartes** N/A

**Inversión:**

Inversión inicial según Acta Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$1.227.390.207
- Recursos Aporte FNFH: \$1.227.390.207
- Recursos contrapartida: \$0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- ✓ Monto del proyecto: \$1.228.482.537
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.228.482.537
- ✓ Recursos contrapartida: \$0

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El proyecto se encuentra cumpliendo, a la fecha presenta una inversión presupuestal del FNFH por valor de \$607.559.823=Mcte., correspondientes al 49,5%.

Dichos recursos están presentados en servicios personales: sueldos, prestaciones sociales, parafiscales y honorarios y gastos generales: equipo de comunicación y computación, materiales y suministros de papelería, comunicaciones y transporte “correos”, viáticos y gastos de viaje, propiedad planta y equipo, software y licencias, otros servicios.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte a marzo, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$607.559.823=Mcte., correspondientes al 49,5% del valor ajustado del proyecto (Cumpliendo).

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor de \$603.125.823=Mcte. correspondiente al 49,1% de los recursos del FNFH.

**Zonas de Intervención:** nacional.

**Líneas Productivas:** todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

**No de beneficiarios:** productores atendidos con los recursos provenientes de la cuota de fomento Hortifrutícola.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 50.00%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 50.00%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

El Área de seguimiento y control a través de su equipo ha desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento del objetivo de proyecto:

- Validación técnica, financiera y jurídica documental y de campo a 12 proyectos en ejecución de 18 aprobados con corte al mes de junio, con realización de verificaciones documentales mensuales, evaluación trimestral para establecer el porcentaje de cumplimiento basado en las metas de cada uno de los proyectos; realización de informes de gestión, visitas de campo, reuniones iniciales y demás actividades propias del seguimiento.
- Se realizó la distribución técnica y financiera de los 12 proyectos de inversión del FNFH aprobados que se encuentran en ejecución para intervención en el seguimiento, control y evaluación con corte a 30 de junio de 2024.
- 1 reunión de socialización del estado de los proyectos con la Auditoría Interna del FNFH.
- Se han realizado las siguientes acciones de seguimiento y control a los proyectos de inversión del FNFH:
  - 7 planes de Seguimiento y Control para 7 proyectos iniciados en el segundo trimestre de 2024.
  - 7 metodologías o instructivos de seguimiento para 7 proyectos iniciados durante el primer y el segundo trimestre de 2024.
  - 7 visitas iniciales técnicas y financieras.
  - 258 visitas Técnicas (inicial, campo, documentales y de cierre).
  - 169 revisiones documentales y plataforma técnicas.
  - 168 reportes a través de las matrices de syc técnico.
  - 63 informes técnicos (Trimestrales, de campo y Resultados técnico final).
  - 79 visitas de campo, con 86 verificaciones de actividades propias de los proyectos a 809 productores.
  - 6 reuniones de planeación equipo técnico.
  - 186 verificaciones documentales y plataforma financieras.
  - 5 visitas de campo financiera.
  - 52 reportes y/o informes de seguimiento y control financiero.





- 41 trámites de desembolso.
  - 41 legalizaciones de recursos.
  - 6 reuniones de planeación equipo financiero.
  - 15 informes de resultados financieros finales.
- Se elaboró y entrego informe de gestión consolidado de la inversión del FNFH año 2023
  - 1 informe narrativo consolidado inversión FNFH 2023.
  - 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH año 2023.
  - 1 informe requerido del contrato de administración con corte a diciembre 2023.
  - 1 informe narrativo consolidado inversión del FNFH 1er trimestre año 2024.
  - 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre año 2024.
  - 4 anexos con las matrices de consolidación de información técnica, presupuestal, financiera y jurídica proyectos de inversión del FNFH, 1er trimestre año 2024
  - Informe de Estado de los Proyectos técnico y presupuestal según resolución 00532 de 2023 de MADR.

Todas estas acciones como parte del seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión del FNFH, para el acopio y generación de información del subsector en las inversiones de proyectos hortifrutícolas.

***Para evidenciar la información detallada del cumplimiento técnico y financiero con corte a 30 de junio de 2024, esta se presenta en el Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)***

---

AE-ADI-0010 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH

**Fecha de inicio: 15/01/2024**

**Fecha de Terminación: 14/01/2025**

**Entidad ejecutora: PLANUPSOFT y Systems Factory LTDA.**

**Inversión:**

- ✓ Monto del Proyecto: \$1.080.000.000
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$1.080.000.000
- ✓ Vigencia 2023: 1.080.000.000
- ✓ Recursos Contrapartida: \$0



A la fecha el proyecto presenta una ejecución presupuestal global de \$539.765.500=Mcte., correspondientes al 50%, dichos recursos están representados en otros servicios: sistemas de información para la gestión de programas y proyectos FNFH. El proyecto es ejecutado por un tercero, a la fecha existe un contrato con PLANUPSOFT S.A.S. y un contrato con SYSTEMS FACTORY LTDA.

Con corte a marzo, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$539.765.5500=Mcte., correspondientes al 50% del valor del proyecto (cumpliendo), los cuales corresponden a dos (2) desembolsos realizados al contrato de PLANUPSOFT S.A.S. por valor de \$400.000.000=Mcte., y un (1) desembolso realizado a SYSTEMS FACTORY LTDA. Por valor de \$139.765.500=Mcte.

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera con corte al mes de junio por valor de \$539.765.500=Mcte., correspondientes al 50% del valor del proyecto.

**Zonas de Intervención:** nacional.

**Líneas Productivas:** frutas y hortalizas.

**No de beneficiarios:** N/A

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 49.01%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 49.01%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Se elaboro un 1 documento de plan de trabajo de 1 programado.

Se tiene un avance del 100% de un 100% programado del documento de calidad de datos.

Se tiene avance parcial del 49.81% de 1 documento de informe de requerimientos por proceso de 1 programado.

Se tiene elaborado el cuadro comparativo de lenguajes de programación para el corte a marzo con ponderación del 100%.

Se construyo 1 documento avance del documento de arquitectura de 1 programado con una ponderación del 100.00%.

Se tiene un avance del 100% de un 100% programado de la definición de los estándares de datos.

**Logros relevantes en el proyecto.**

- En la ejecución del proyecto se han dado respuesta a 1724 solicitudes de las diferentes áreas y procesos.



- Se han realizado 151 mesas de trabajo de comunicación directa entre los interesados, como usuarios finales, analistas de sistemas, desarrolladores y gerentes de proyecto.
- Hasta el momento se tienen 60 historias de usuario levantadas para la recopilación, análisis y documentación detallada de las necesidades y expectativas de los usuarios.
- Modulo Formulación: Creación de proyectos con Identificación, hoja de entrada, listado de proyectos formulados (41 registros con las opciones de editar- verificar- eliminar).
- Modulo Ejecución: Inscripción de beneficiarios con registro de datos personales, información predio.
- Modulo Talento humano: Hoja de vida con formulario, cargue de documentos hojas de vida, lista información personal, manual de funciones.
- Modulo Compras: Gestión de compras con bienes y servicios, rubros y subrubros.
- Instalación del software Digifile workflow Versión SGDEA para el componente del Sistema de Gestión y de Archivo.

---

AE-ADI-0011 UNIDAD TÉCNICA DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS - AÑO 2024

**Fecha de inicio:** 01/01/2024

**Fecha de terminación:** 31/12/2024

**Entidad ejecutora:** ASOHOFRUCOL

**Entidades Contrapartes:** N/A

**Inversión:**

Inversión inicial según Acta Junta Directiva del FNFH No 173 del 13/12/2023:

- Monto del proyecto: \$2.869.299.898
- Recursos Aporte FNFH: \$2.869.299.898
- Recursos contrapartida: \$0

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024:

- ✓ Monto del proyecto: \$2.875.627.778
- ✓ Recursos Aporte FNFH: \$2.875.627.778
- ✓ Recursos contrapartida: \$0

**Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**



A la fecha el ejecutor presenta una ejecución presupuestal global de \$1.366.031.392=Mcte., correspondientes al 48%

Dichos recursos están representados en servicios personales: Sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, honorarios y gastos generales: equipos de comunicación y computación, suscripciones y afiliaciones, materiales, suministros y papelería, comunicaciones y transportes, capacitación, seguros impuestos y gastos legales, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, sistematización software y licencias.

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, con corte junio, el ejecutor presenta una ejecución financiera global por valor de \$1.366.031.392=Mcte., correspondientes al 48% del valor ajustado del proyecto (Atraso leve).

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor de \$1.361.266.121=Mcte. correspondiente al 47% de los recursos del FNFH.

**Zonas de Intervención:** nacional

**Líneas Productivas:** todas las líneas productivas intervenidas con los recursos provenientes de la cuota de Fomento Hortifrutícola.

**No de beneficiarios:** productores atendidos de acuerdo con las necesidades y/o oportunidades identificadas.

**Porcentaje de ejecución técnica programado:** 38.96%

**Porcentaje de ejecución técnica alcanzado:** 39.67%

**Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.**

Se han realizado las siguientes actividades:

- Se tienen 21 de 20 proyectos formulados.
- Se han tramitado \$794.177.412 de \$15.000.000.000 en gestión de recursos.
- Se han realizado 5 de 5 reuniones interinstitucionales.
- Se construyó 1 de 1 documento de Gestión de los recursos del FNFH.
- Se elaboró 1 de 1 boletín con el balance y comportamiento de las principales líneas exportables.
- Se tienen 213 de 100 publicaciones en redes sociales.
- Se elaboró 2 de 1 informes para el comité técnico del contrato de administración.
- Se han atendido 3 de 10 requerimientos de las auditorías, contralorías y MADR.

**Logros relevantes en el proyecto.**

- El equipo de formulación de la unidad técnica a gestionado 21 proyectos, en estado



formulado, donde se han aprobado \$794.177.412 en recursos.

- Se evidencian 5 participaciones interinstitucionales con la agencia de comercialización Gobernación de Cundinamarca, MADR e ICA, se ha elaborado 1 boletín de líneas exportables vigencia 2023,
- Se ha realizado 1 capacitación a funcionarios de asohofrucol en temas de asociatividad, exportación, logística y se han realizado 274 publicaciones en redes sociales sobre noticias de Asohofrucol.

## 1.8 PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN

### SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Al cierre a 30 de junio del año 2024, se encuentran pendientes de acta de cierre veinticinco (25) proyectos que hacen parte de los proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007 y cinco (5) que hacen parte de otros programas y son proyectos de vigencias 2013; Para un total pendiente por actas de cierre de treinta (30) proyectos.

De los proyectos ejecutados en la vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 de junio de 2024, se encuentran pendientes de acta de terminación diecisiete (17) proyectos, los cuales el área de seguimiento y Control con su Profesional de Asesoría Jurídica están en proceso de cierre y liquidación.

**Tabla No. 8 Proyectos en fase de liquidación corte 30 de junio año 2024**

No	CÓDIGO	PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINACIÓN
1	DT-TR 0004	PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2023	ASOHOFRUCOL	31/12/2024
2	DT-AT 0007	MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE MANGO Y DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS PARA EL MERCADO INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ASOHOFRUCOL	18/12/2023
3	DT-AT-0009	APOYO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO DE LOS MUNICIPIOS DE (JARDÍN, JERICÓ, ANDES, TÁMESIS, PUEBLORRICO) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ADMISIBILIDAD PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS	ASOHOFRUCOL	31/01/2024
4	DT-TR-0003	LABATECA- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS DE GRANADILLA Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLAS A TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE LABAYECA, NORTE DE SANTANDER.	ASOHOFRUCOL	20/05/2024



5	MC-CAD-0001-CC01-2024-AL157	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 40 HASS DE LIMA ACIDA TAHITÍ DEL MUNICIPIO DE GIRON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	ASOCIACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS PARA EL DESARROLLO RURAL - ASOMUTRADER	16/05/2024
6	MC-CAD-0001-CC02-2024-AL158	IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DEMORA UVA DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CÓMBITA-COAGROCOMBITA-BOYACÁ	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CÓMBITA-COAGROCOMBITA	16/05/2024
7	MC-CAD-0001-CC03-2024-AL159	FORTALECIMIENTODE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA -CALDA, CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL SUBSECTOR	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE RISARALDA CALDAS – ASOPROAR	16/05/2024
8	MC-CAD-0001-CC04-2024-AL160	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA-CALDAS, CON EQUIDAD DE GENERO Y HACIA UNA AGRICULTURA MAS LIMPIA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENODE MORRITOS MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS- AGROMORRITOS	16/05/2024
9	MC-CAD-0001-CC05-2024-AL161	ALIANZA PARA EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE AGUACATE VARIEDAD LORENA MEDIANTE LA ASOCIACIÓN DE AGUACATEROS DE CAPARRAPÍ- ASAGUACAPI MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA	ASOCIACIÓN DE AGUACATEROS DE CAPARRAPI-ASAGUACAPI	26/05/2024
10	MC-CAD-0001-CC06-2024-AL163	MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS ENFOCADO HACIA UNA AGRICULTURA LIMPIA Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS	ASOCIACIÓN SUPIEÑA DE PRODUCTORES AGRICOLAS-SUPIAGRO	7/06/2024
11	MC-CAD-0001-CC07-2024-AL164	ALIANZA PARA EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE HASS (PERSEA AMERICAN HASS) A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ASOAGROBIG DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA-ASOAGROBIG	13/06/2024
12	MC-CAD-0001-CC08-2024-AL166	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BERENJENA, PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES PTODUCTIVAS DE 36 FAMILIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DE BOLIVAR	ASOCIACIÓN SANTA ROSA 7 MAS	13/06/2024
13	MC-CAD-0001-CC09-2024-AL169	ALIANZA PARA ESTABLECER 35 HECTÁREAS DE MARACUYÁ PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN VILLANUEVA, CASANARE	ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE-ASOMUJERRURAL	13/06/2024
14	MC-CAD-0001-CC010-2024-AL168	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA BAJO EL MODELO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 30 HECTÁREAS DE MARACUYÁ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MARACUYÁ DE GUADALUPE HUILA-APROMAGH	13/06/2024



15	MC-CAD-0001-CC011-2024-AL165	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CAMPESINAS VICTIMAS Y VULNERABLES PRODUCTORAS, PROCESADORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PLATANO VILLA FLORIDA GARZÓN - GGIANTE ASPROPAT VIFG	13/06/2024
16	MC-CAD-0001-CC012-2024-AL167	ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARANDANOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO Y PASCA CUNDINAMARCA	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN BERNARDO Y PASCA CUNDINAMARCA-SANBERPAS	14/06/2024
17	MC-CAD-0001-CC013-2024-AL162	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS (TOMATE) DE CLIMA MEDIO CON ENFOQUE EN AGRICULTURA TROPICAL DE LAS MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	ASOCIACION DE MUJERES RURALES EMPRENDEDORAS DE RIONEGRO SANTANDER-ASOMURER	18/06/2024
17	<b>TOTAL, PROYECTOS PENDIENTES ACTAS DE LIQUIDACIÓN/O TEMRINACIÓN</b>			

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

En el II trimestre del año 2024 se suscribieron doce (12) actas de terminación y/o liquidación de proyectos terminados en el cuarto trimestre del año 2023 y en el primer trimestre del 2024. A 30 de junio hay un (1) proyecto de vigencia 2023, 2 proyectos del primer trimestre 2024 y catorce (14) proyectos del segundo trimestre del año 2024 terminados que están en proceso elaboración de actas de liquidación.

**Tabla No 9 - proyectos liquidados y/o con cierre II trimestre año 2024**

No.	CODIGO PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO	FECHA DE LIQUIDACION
1	DT-AT 0007	MEJORAMIENTO DEL ESTADO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE MANGO Y DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS PARA EL MERCADO INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ASOHOFRUCOL	18/12/2023	27/05/2024

2	AE-ADI-0005	IDENTIFICAR, FORMULAR, COORDINAR, ADMINISTRAR, EVALUAR, EJECUTAR, PROYECTOS, EN EL MARCO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EXISTENTES Y DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA.	ASOHOFrucOL	31/12/2023	27/05/2024
3	AE-ADI-0006	PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2023.	ASOHOFrucOL	31/12/2023	27/05/2024
4	AE-ADI-0007	MISIÓN INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ASOCIATIVAS, PRODUCTIVAS, COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE, LIMÓN, TAHITÍ Y MANGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ASOHOFrucOL	31/12/2023	28/05/2024
5	MC-CAD-0001-CC01-2023-AL149	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIANZA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MORA EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER".	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA -LA BELLEZA SANTANDER. MORABELL	20/12/2023	18/05/2024
6	MC-CAD-0001-CC02-2023-AL150	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GULUPA EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER.	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PASSIFLORAS DE LA BELLEZA SANTANDER-PASSIBEL	20/12/2023	2/05/2024
7	MC-CAD-0001-CC05-2023-AL153	EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE JÓVENES CONSTRUCTORES DE PAZ A TRAVÉS DE LA SIEMBRA Y OSTENIMIENTO DE 15 HECTÁREAS DE AJÍ DULCE (CAPSIUM ANNUM) QUE PERMITA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, CORREGIMIENTO EL SALADO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	FUNDACIÓN CONSTRUCTORES DE PAZ DE EL SALADO BOLIVAR "CDPS"	24/12/2023	19/04/2024
8	MC-CAD-0001-CC06-2023 - AL154	EMPRENDIMIENTO DE LA CADENA VALOR DE PLÁTANO HARTÓN PARA SOSTENIMIENTO Y MEJORA APLICANDO BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN 40 PREDIOS QUE PERMITA BENEFICIAR A 40 JÓVENES RURAL DE LAS VEREDAS DE BONGAL Y ARENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	ASOCIACIÓN DE PLATANEROS DE SAN JACINTO, BOLIVAR-ASOPLÁTANO	24/12/2023	19/04/2024
9	MC-CAD-0001-CC07-2023 - AL155	EMPRENDIMIENTO AGROECOLÓGICO DE LA CADENA DE AGRONEGOCIOS DE PÁTANO HARTÓN PARA SOSTENIMIENTO Y MEJORA PRODUCTIVA APLICANDO BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS EN 40 PREDIOS QUE PERMITA BENEFICIAR A 40 PEQUEÑOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLABUENA BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	ASOCIACIÓN DE PLATANEROS DE VILLANUEVA, BOLIVAR, ASOPLÁTANO VILLANUEVA	24/12/2023	8/05/2024





10	MC-CAD-0001-CC08-2023 - AL 156	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 20 HECTAREAS SEMBRADAS DEEN AUYAMA PARA FENEFICIAR A 40 FAMILIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO.	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SAN CAYETANO-ASOPROTRACOSAN	29/12/2023	12/06/2024
11	MC-CAD-0001-CC04-2023-AL 151	"FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS AGROEMPRESARIOS PRODUCTORES DE PLÁTANO AGREMIADOS EN LA ASOCIACIÓN ASOPLUN-UNIDOS DEL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA".	ASOCIACIÓN DE PLATANEROS DE PUEBLO NUEVO UNIDOS, CON SIGLA ASOPLUN-UNIDOS	15/02/2024	12/06/2024
12	MC-CAD-0001-CC03-2023-AL 152	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MORA DE 40 FAMILIAS DE LA ASOCIACIÓN ASPROVALLEJUELO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS VALLEJUELO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. "ASPROVALLEJUELO"	15/02/2024	28/05/2024

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH

**Tabla No. 10 Estado jurídico actual de proyectos a cargo del Área de Seguimiento y Control de Proyectos**

ESTADO ACTUAL	No DE PROYECTOS	OBSERVACIONES
Proyectos aprobados vigencia 2024	11	Proyectos que se encuentran en ejecución y/o pendientes de iniciar
Proyectos liquidados en el año 2024	12	Proyectos liquidados de abril- junio 2024
Proyectos pendientes de liquidar vigencia 2023	10	Se encuentra en proceso de cierre y elaboración de acta de liquidación 10 proyectos terminados cuarto trimestre del año 2023.
Proyectos pendientes de liquidar vigencia 2024	2	Se encuentra en proceso de cierre y elaboración de acta de liquidación 2 proyectos terminados en el segundo trimestre 2024.
Actas de cierre elaboradas por parte del IICA	25	Los proyectos en donde el IICA y CORPOICA - AGROSAVIA fueron los Contratantes, se encuentran en elaboración de actas de cierre.
Actas de cierre elaboradas por parte de Asohofrucol	5	Proyectos que se encuentran en revisión jurídica, para realizar el respectivo cierre Administrativo según Decreto 1082/15 Art.2.2.1.1.2.4.3, en revisión y elaboración de actas de cierre.



Proyectos en proceso jurídico	6	Estos procesos se encuentran a cargo del Asesor Jurídico de ASOHOFrucol con apoyo de la Profesional de Seguimiento y Control Jurídico.
-------------------------------	---	--

Fuente: Área de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH

**Para evidenciar la información detallada con corte a 30 de junio de 2024, esta se presenta en el Anexo No 4. Matriz Situación Jurídica de los Proyectos. (M.S.J.P.).**

## ANEXOS

**Anexo No 1. Matriz información general de Proyectos de Inversión y gastos de funcionamiento. (M.I.G.P)**

**Anexo No 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.)**

**Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a junio de 2024. (M.E.P.)**

**Anexo No 4. Matriz situación jurídica de los proyectos a cargo del área de seguimiento y control (M.S.J.P)**

