



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS



SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A PROYECTOS FNFH EN EJECUCIÓN A JUNIO 2018



Con respecto al avance técnico de los proyectos en ejecución con recursos del FNFH podemos considerar:

- Trece (13) proyectos cofinanciados con recursos del FNFH de los cuales , siete (7) son de vigencias anteriores (año 2017) y seis (6) de vigencia 2018
- El avance técnico se validó de acuerdo con las fuentes de verificación de las actividades planteadas en el marco lógico y alineadas con la respectiva planificación (cronograma)
- Realización de matriz de seguimiento por proyecto, teniendo en cuenta los % de avance programados Vs los % de avance real de ejecución de los objetivos planteados de acuerdo con plan de seguimiento (alertas por proyecto)
- Visitas de campo para verificación de la intervención con los beneficiarios atendidos

SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO A PROYECTOS FNFH EN EJECUCIÓN A JUNIO 2018



El análisis de la información financiera de los proyectos se hace confrontando la información suministrada por el ejecutor del proyecto (En el caso de ASOHOFRUCOL información Conciliada entre el área de Presupuesto y Contabilidad), con la revisión financiera realizada por el área de Seguimiento y Control, que está basada en los documentos administrativos y contables de los gastos reportados y soportados en los informes trimestrales y con las visitas financieras realizadas directamente por la Unidad de Seguimiento y Control en las oficinas de los ejecutores.

EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO 2018 (PROYECTOS COFINANCIADOS FNFH)



Tabla No 1. Ejecución financiera por programa Año 2018

No DE PROYECTOS	PROGRAMA	VALOR FNFH AÑO 2018	VALOR FNFH EJECUTADO A 15 DE JUNIO/ 2018
10	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$ 14.615.386.002	\$5.207.362.847
2	INVESTIGACIÓN	\$198.292.000	\$33.849.309
8	Transferencia de Tecnología	\$ 14.417.094.002	\$ 5.173.513.538
2	MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 653.394.900	\$298.175.450
2	Comercialización	\$ 653.394.900	\$ 298.175.450
1	ÁREA ECONÓMICA	\$ 36.000.000	\$10.300.000
1	Sistemas de Información	\$ 36.000.000	\$10.300.000
13	TOTAL	\$ 15.304.780.902	\$ 5.969.744.648




ESTADO DE AVANCE PROYECTOS FNFH AÑO 2018

A continuación se relacionan los proyectos del FNFH con corte a 15 de junio de 2018 con los respectivos % de avance a la fecha:

ESTADO DE AVANCE TÉCNICO PROYECTOS EN EJECUCIÓN A JUNIO DE 2018



CUMPLIMIENTO TÉCNICO A 15 JUNIO DE 2018

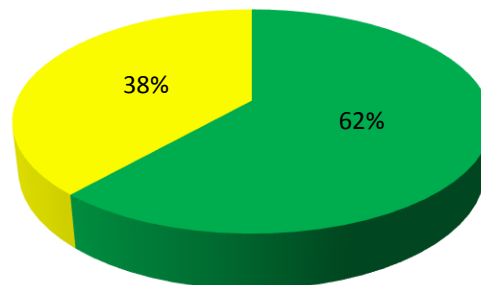

■ CUMPLIENDO


■ ATRASO

De los 13 proyectos en ejecución, 8 proyectos están cumpliendo con lo programado, que equivale al 62% y 5 proyectos se encuentran en atraso siendo el 38%.

CUMPLIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 15 DE JUNIO DE 2018



CUMPLIMIENTO FINANCIERO A 15 JUNIO DE 2018

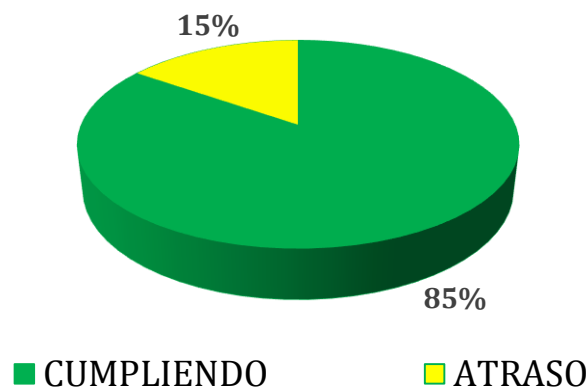

Con relación al cumplimiento financiero, este se determina de acuerdo a la ejecución de los recursos desembolsados y la entrega oportuna de informes. Con fecha 15 de Junio de 2017, el 85% de los proyectos vienen cumpliendo de acuerdo con lo establecido financieramente , el 15% presenta una atraso leve.





GRACIAS.



Asohofrucol

Asociación Hortifrutícola de Colombia

Administradora del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola



**FONDO NACIONAL DE
FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA**



SC-CER107286

